

GOPI JHA
Advocate

RESIDENCE-CUM-CHAMBER
"Anand Bhawan"
Sheopuri, Patna-23
Mobile No. :- 9939724013
E-mail :- gopijha.advocate@gmail.com

← Ref No.02..... →

Date .. 13-06-2020

Before the National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi.

Execution Application No. 46/2018

In

O.A. No. 234/2015

Veterans Forum for Transparency in Public
Life.

..... Applicant(s)

Versus

Chapra Nagar Nigam, Chapra & Ors.

.... Respondent(s)

**COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF THE SECRETARY,
URBAN DEVELOPMENT & HOUSING DEPARTMENT, GOVT.
OF BIHAR.**

1. That the instant Work Progress Report relating to Khanua Nala, Chapra is being submitted in compliance of the order

Doc

dated 03.09.2019 passed in the present matter.

2. That by the order under reference the Secretary, Urban Development has been directed to furnish further report in respect of Khanua Nala as the work has already begun regarding cleaning, waste management, removal of encroachment and development work of Khanua Nala.
3. That the latest factual status in this regard is being submitted as hereunder:-
 - (A) Chief Engineer, Planning, Formulation and Monitoring, BUIDCO, Patna vide his Letter No. 6345 dated 05.12.2019 has made available the updated status of work to the Urban Development Department regarding the project under implementation namely Storm Water Drainage with PCC Road Scheme for Chhapra Town, and as per the same, presently, the rehabilitation work in 900 mtrs, desilting work of Sluice-Gate, work for drain in Prabhunath Nagar and demarcation work of Khanua Nala are in progress.

Xerox copy of Letter
No. 6345 dated

05.12.2019 alongwith enclosures are attached herewith as **Annexure-A Series** to this Compliance Report.

(B) D.M., Saran, Chapra vide his Letter No. 452 dated 22.02.2020 has made available Updated Progress Report to the department which has been furnished to him by the Municipal Commissioner, Chapra Municipal Corporation vide his Letter No. 72 dated 16.01.2020.

As per the aforesaid progress report, cleaning scheme for Khanua Nala is being executed by an Agency selected by BUIDCo. Khanua Nala has been made encroachment free through Anti-encroachment Drive. Action Plan prepared by Urban Development and Housing Department for development of Khanua Nala is under implementation and the main elements of the work in question is as follows:-

- i. Construction of STP with the capacity of 32 MLD.

guy

- ii. Construction of 06 Sewerage Pumping Station.
- iii. Renovation and interlinking of SI Khanuwa Nala.

Xerox copy of Letter No. 452 dated 22.02.2020 alongwith enclosures are annexed herewith and marked as **Annexure-B Series** to this Compliance Report.

(C) Municipal Commissioner, Chapra Municipal Corporation vide his Letter No. 664 dated 09.05.2020 has brought to the notice of the Department about certain problems, regarding water-logging and obstruction of flow of Khanua Nala due to ongoing constructions of over-bridge at two sites, namely, "Gandhi-Chowk" and "Nagar Palika Chowk" by the Bihar State Bridge Construction Corporation (BSBCC), and also stoppage of drain cleaning-work presently by the BUIDCo and therefore, request has been made to

issue instructions to the
aforementioned two agencies.

Xerox copy of Letter
No. 664 dated
09.05.20 is annexed
herewith and marked
as **Annexure-C** to
this Compliance
Report.

- (D) In pursuance to the aforementioned request made by the Municipal Commissioner, Chapra Municipal Corporation, the Special Secretary, Urban Development and Housing Department, vide his Letter No. 1138 dated 12.06.2020 has requested the M.D., BSBCC, Patna and the M.D., BUIDCo, Patna to take immediate steps for solving the problems in question as mentioned in Letter of Municipal Commissioner, Chapra Municipal Corporation.

Xerox copy of Letter
No. 1138 dated
12.06.2020 is
annexed herewith and
marked as **Annexure-D**

gky

to this Compliance Report.

(E) Recently, the M.D., BUIDCo vide his Letter No. 4031 dated 12.06.2020 has furnished latest Progress-Report to the Urban Development and Housing Department regarding the ongoing works of Khanua Nala, which is as follows:-

Status of work as on date :- the work of Khanua Nala is divided in two section.

A. Khanua Nala (A) :-

- i.* Total length of Khanua A is 1450 mtr.
 - ii.* It starts from Tinkonia to Jatahi Pokhra via Mauna Chowk.
 - iii.* A variable section in this stretch is 3.0 m width to 4.0 m width.
 - iv.* In this stretch Rehabilitation work and Desilting work is in progress.
- 

- v. Photographs are attached for reference.


B. Khanua Nala (B) :-

- vi. Total Length of Khanua Nala B is 1750 mtr.
- vii. Starts from Roopganj and ends at Jagdam College.
- viii. Variable sections at this stretch is 3.0 m to 6.0 m width.
- ix. Desilting work of Karim Chowk, Court Campus, Tinkonias under progress.
- x. Photographs are attached for reference.


C. Khanua Nala Over All Details:-

- xi. Total Length 3204 mtr.
- xii. Contribution of Various Sizes: 3.0m width-1084 mtr.
4.0m width-1458 mtr, 6.0m width-662 mtr.

SM



Physical Progress as on date 12.06.2020				
Sl. No	Location	Items	Present Status	Remarks
KHANUA NALA (A)				
1	Sada Dhala to Mauna Chowk Total Length – 1450 mtr (desilting work)	Desilting work	200m cleaning already done	Remaining work under progress
		Brick work	Repair work of Brick masonry.	
KHANUA NALA (B)				
2	B Seminary School Total Length- 1750 mtr.	Excavation	180 mtr. Excavations already completed.	For Khanua Nala total length of RCC drain to construct is 2.8 km out of which 80 mtr. completed (2.85%) The remaining 1.0 km is under shop in which only rehabilitation work is to be done.
		Raft Casting	180 mtr. completed	
		Wall	180 mtr. completed upto 1.2 mtr.	
3	Sluice Gate	Excavation	60 mtr. already completed.	Remaining work under progress.
		Raft Casting	50 mtr. completed	
		Wall	35 mtr. done up to 2.4 mtr.	



Xerox copy of Letter
No. 4031 dated
12.06.2020 is
annexed herewith and
marked as **Annexure-E**
Series to this
Compliance Report.

4. That in view of the above facts and
circumstances, instant, up-to-date
'Compliance-Report' may kindly be
accepted.

①
15/4/2020

325

App-E

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०

Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

RajaPur Dul West Boring Canal Road, Patna- 800001

Contact : +0612-2506213,2506109,2506208, Fax: +91 0612-2506132

Email : mbuidco@buidco.in Website : <http://buidco.in>



ISO9001:2008,14001:2004

पत्रांक सं०:- बुडको/या- 1189/2019- 4301

Date- 12.06.2020

प्रेषक,

प्रबंध निदेशक,
बुडको पटना।

सेवा में

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- Executive Application. 46/2018 (A.A No 234/2015) Veterans forum for Transparency in Public
V/s Chapra Nagar Nigam & Ors. वद में माननीय NGT द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-
26.04.2019 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग- 1) विभागीय पत्रांक- 680, दिनांक- 18.03.2020, पत्रांक- 1141, दिनांक- 12.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक- 03.09.2019 को पारित न्यायादेश की अनुपालन के आलोक में अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रोत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

12.6.20

प्रबंध निदेशक,
बुडको, पटना।

324

Name of the project:- Storm Water Drainage with PCC Road Scheme for Chhapra Town, Bihar Under State scheme.

1. **Description of work:** - To construct RCC BOX drain of 4.5 mtr Average width, Re-habilitation work, Road crossing work in 3.5 km for Khanuanala in Chhapra town along with PCC road of width 4.5mtr and construction of Drains in Prabhunath Nagar

- Administrative approval:- 29.95 crore
- Amount of Project:- 27.38 crore
- Date of Sanction:- February 2019
- Date of Re-Tender:- 06.06.2019
- Date of agreement:- 22.08.2019
- Name of Contractor:- M/S Jay Mata Di Road Construction Pvt. Ltd.

2. **Status of Work as on date:-** The work of Khanua Nala is divided in two section-


A. Khanua Nala(A):

- I. Total length of Khanua A is 1450 mtr.
- II. It starts from Tinkonia to Jatahi Pokhra via Mauna Chowk.
- III. A variable section in this stretch is 3.0m width to 4.0m width.
- IV. In this stretch Rehabilitation work and Desilting work is in progress.
- V. Photographs are attached for reference



B. KhanuaNala(B):

- VI. Total Length of KhanuaNala B is 1750 mtr
- VII. Starts from Roopganj and ends at Jagdam College.
- VIII. Variable sections at this stretch is 3.0m to 6.0m width.
- IX. Desilting work at KarimChowk, Court Campus, Tinkoniais under progress.
- X. Photographs are attached for reference

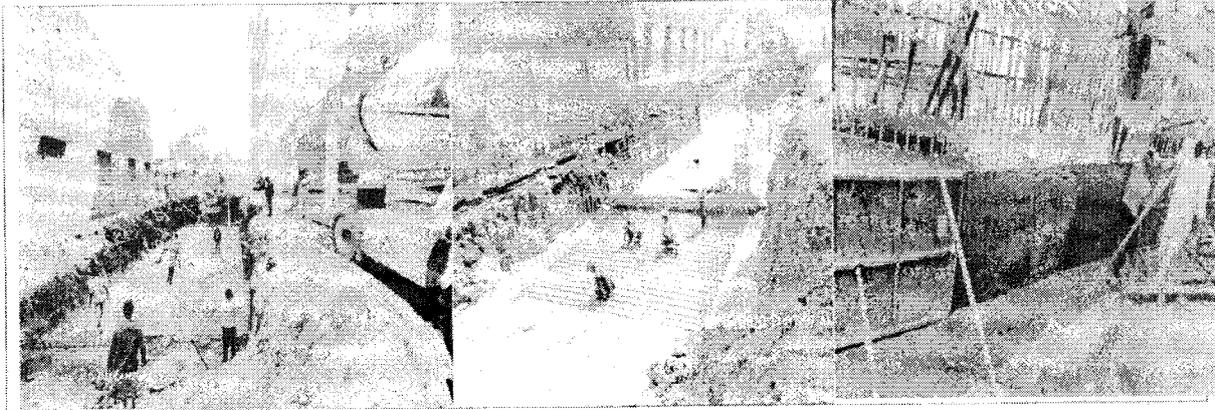

C. KhanuaNalaOver All Details:

- XI. Total Length: 3204 mtr
- XII. Contribution of Various Sizes: 3.0m width- 1084mtr, 4.0m width- 1458 mtr, 6.0m width- 662mtr

Physical Progress as on date 12.06.2020				
SI No	Location	Items	Present Status	Remarks
KHANUA NALA (B)				
1.	B.Seminary School Total length-1750mtr	Excavation	180 mtrexcauations already completed.	For KhanuaNala total length of Rcc drain to construct is 2.8 km out of which 80mtr completed (2.85 %). The remaining 1.0 km is under shop in which only rehabilitation work is to be done.
		Raft Casting	180 mtr completed.	
		Wall	180 mtr completed upto 1.2 mtr.	

2.	Sluice Gate	Excavation	60 mtr already completed	Remaining work under progress.
		Raft Casting	50mtr completed.	
		Wall	35 mtr done upto 2.4m	
KHANUA NALA (A)				
3.	Sada Dhala To Mauna Chowk Total length-1450mtr (desilting work)	Desilting work	200m cleaning already done.	Remaining work under progress.
		Brickwork	Repair work of Brick masonry.	

Handwritten signature or mark

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम,
पश्चिमी बोरिंग कैनल रोड, पटना-800001

पटना, दिनांक- 12/06/2020

विषय :- Executive Application. 46/2018 (O.A No. 234/2015) Veterans forum for Transparency in Public life V/s Chapra Nagar Nigam & Ors. वाद में माननीय NGT द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-03.09.2019 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- (i) विभागीय पत्रांक-2739 दिनांक-10.10.2019, पत्रांक-2985 दिनांक-15.11.2019, पत्रांक-680 दिनांक-18.03.2020
(ii) बुडको का पत्रांक-6345 दिनांक-05.12.2019.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक दिनांक-03.09.2019 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए न्यायादेश के आलोक में निर्धारित समय सीमा में सभी आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन सभी आवश्यक कागजातों के साथ उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जो आपके पत्रांक-6345 दिनांक-05.12.2019 द्वारा प्राप्त हुआ था, किन्तु इस संबंध में अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्रांक-680 दिनांक-18.03.2020 द्वारा अनुरोध किया गया था, जो अप्राप्त है।

इस बीच Consultant (Judicial) NGT (PB) New Delhi से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि सुनवाई हेतु दिनांक-16.06.2020 को तिथि निर्धारित है।

अतः आज ही विस्तृत अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए ताकि ससमय SOF तैयार कर अधिवक्ता, NGT को भेजा जा सकें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

[Signature]
12/6/2020

विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

Ary-D

प्रेषक,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना।
प्रबंध निदेशक,
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0,
पश्चिमी बोरिंग कैनल रोड, पटना।

पटना, दिनांक- 12/06/2020

विषय:- आसन्न बरसात के मद्देनजर खनुआ नाला निर्माण एवं डबल डेकर ओवरब्रिज निर्माण के कारण जल-जमाव होने के संबंध में।

प्रसंग:- नगर निगम छपरा का पत्रांक-664 दिनांक-09.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि नगर आयुक्त, नगर निगम छपरा द्वारा छपरा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत खनुआ नाला निर्माण एवं डबल डेकर ओवरब्रिज निर्माण के कारण आसन्न बरसात के मद्देनजर जलजमाव की समस्या होने से संबंधित पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) खनुआ नाला का निर्माण कार्य वर्तमान में बंद है, की सूचना दी गई है। कार्य करने हेतु नाला के बहाव को बाधित किया गया था, जिसे पूरी तरह से खुलवाया नहीं गया है जिसके कारण आंशिक बरसात में भी विभिन्न स्थानों पर जल जमाव की स्थिति बन जाती है।

अन्य जगहों पर जल-निस्तारण हेतु वोटर पम्प से कार्य लिया जाता है, जिसकी क्षमता भी कम है एवं बिजली चले जाने से कई प्रमुख मुहल्ले यथा जजेज कॉलोनी, समाहरणालय परिसर इत्यादि में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है।


(2) बिहार राज्य पुल निर्माण के द्वारा छपरा नगर निगम क्षेत्र के दो स्थलों पर (i) गाँधी चौक (ii) नगरपालिका चौक के निकट पाईलिंग के क्रम में मिट्टी काटकर खनुआ नाले को पूरी तरह भर दिया जा रहा है। गाँधी चौक से भिखारी चौक के बीच तीन स्थलों पर नाले में ही पाईलिंग कर दिया गया है। जिससे नाला का बहाव पूरी तरह से बाधित है।

विदित हो कि उक्त खनुआ नाला का जिर्णोद्धार से संबंधित साफ-सफाई का कार्य माननीय NGT द्वारा E.A. No.-46/2018 in O.A. No-234/2015 veterans forum for transparency in public life Vs Chapra Nagar Nigam में दिये गये आदेश के आलोक में किया जा रहा है।

अतः पत्र में वर्णित बिन्दुओं का अविलम्ब निराकरण करने की कृपा की जाय ताकि आसन्न बरसात में जल-जमाव की समस्या उत्पन्न न हो।

कृपया इस सर्वोच्च प्राथिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,


26/05/2020


विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/न्या0-14-31/2018 1138

दिनांक- 12/06/2020

प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त, नगर निगम छपरा को उनके पत्रांक-664 दिनांक-09.05.2020 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।


26/05/2020

विशेष सचिव।

कार्यालय छपरा नगर निगम


पत्रांक :- 664 / छ0न0नि0

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
छपरा नगर निगम।

सेवा में,

सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार पटना।



छपरा/दिनांक 09/05/2020

विषय :- आसन्न बरसात के मद्देनजर खनुआ नाला निर्माण एवं डबल डेकर ओवर ब्रिज निर्माण के कारण जल-जमाव होने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सादर निवेदित करना है कि आसन्न बरसात के मद्देनजर छपरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत खनुआ नाला निर्माण एवं डबल डेकर ओवर ब्रिज निर्माण के कारण उत्पन्न जल जमाव के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार किया जाना समीचीन होगा :-

1. खनुआ नाला का निर्माण कार्य तीन स्थलों पर प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में दो स्थल (a) करीम चक के निकट (b) बी. सेमिनरी स्कूल पर कार्य कराया जा रहा है। करीमचक के निकट जल-निस्तारण हेतु लगाये गये मोटर पम्प की क्षमता कम है, साथ ही साथ बिजली चले जाने से पम्प मोटर बंद रहता है, जिसके कारण करीम चक मुहल्ले में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इस आशय का पत्र कार्यपालक अभियंता, बुडको को कई बार दिया जा चुका है। बी. सेमिनरी स्कूल में भी कार्य प्रारंभ किया गया है एवं मोटर पम्प लगा कर जल निस्तारण किया जा रहा है। मोटर बंद होने पर जजेज कॉलोनी एवं समाहरणालय परिसर में जल जमाव हो जाता है, मौना साढा रोड में कार्य प्रारंभ किया गया था। परन्तु वर्तमान में कार्य बंद है, कार्य करने हेतु नाला के बहाव को बाधित किया गया था, जिससे अभी तक पूरी तरह से खुलवाया नहीं गया है, जिसके कारण वार्ड नं 26,33,34 आदि में आंशिक बरसात में भी जल जमाव की स्थिति बन जाती है। नाला कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है, अगर यही स्थिति आगे भी बनी रही तो बरसात के समय छपरा नगर में भयानक जल जमाव की स्थिति बन सकती है। विदित हो कि खनुआ नाला उडाही का कार्य बुडको द्वारा कराया जा रहा है।


2. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा छपरा नगर क्षेत्र के दो स्थलों पर कार्य कराया जा रहा है :- (i) गौधी चौक (ii) नगरपालिका चौक के निकट। दोनों स्थलों पर पाईलिंग के क्रम में मिट्टी काट कर नाले को पूरी तरह से भर दिया जाता है, जिसकी नियमित सफाई नगर निगम द्वारा कराई जा

50-324
15/5

318

रही है। नगरपालिका चौक के निकट नाले में लगभग चार फीट मिट्टी भर दिया गया है, जिसकी सफाई नगर निगम द्वारा कराई जा रही है। गाँधी चौक से भिखारी चौक के बीच तीन स्थलों पर नाला में ही पाईलिंग कर दिया गया है, जिससे नाला का बहाव पूरी तरह से बाधित है। वार्ड नं० 36,37,38,39,41,42 आदि का पानी इसी रूट से होकर भिखारी चौक की ओर जाता है, जिस कारण बरसात के समय में इस क्षेत्र को पूर्णतः जलमग्न हो जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि भवदीय स्तर से उक्त दोनों एजेंसी को यथानिर्देशित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

नगर आयुक्त,
छपरा नगर निगम।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम,
पश्चिमी बोरिंग कैनल रोड, पटना-800001

पटना, दिनांक-18/03/2020

विषय :- Executive Application. 46/2018 (O.A No. 234/2015) Veterans forum for Transparency in Public life V/s Chapra Nagar Nigam & Ors. वाद में माननीय NGT द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-03.09.2019 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-2739 दिनांक-10.10.2019, पत्रांक-2985 दिनांक-15.11.2019, तथा आपका पत्रांक-6345 दिनांक-05.12.2019.

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक दिनांक-03.09.2019 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए न्यायादेश के आलोक में निर्धारित समय सीमा में सभी आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन सभी आवश्यक कागजातों के साथ उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जो आपके पत्रांक-6345 दिनांक-05.12.2019 द्वारा प्राप्त हुआ था। इस संबंध में अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन वांछित है।

अतः पुनः अनुरोध किया जाता है कि उक्त मामले के संबंध में कृत कार्रवाई से संबंधित विस्तृत अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-31.03.2020 तक माननीय NGT को अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना है।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,



विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।



सारण समाहरणालय, छपरा।
(जिला विधि शाखा)

316

पत्रांक...4.5.2.../विधि

Aug-13

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

सेवा में,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

3033
73-03-2020

50.3
1313/202

छपरा, दिनांक 22 वीं फरवरी, 2020

विषय:-

Execution Application No. 46/2018 (O.A. No. 234/2015) Veterans Forum for Transparency in Public Life-बनाम-छपरा नगर निगम, छपरा एवं अन्य में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 03.09.2019 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय पत्रांक पत्रांक 3335, दिनांक 23.12.2019।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली के द्वारा Execution Application No. 46/2018 (O.A. No. 234/2015) Veterans Forum for Transparency in Public Life-बनाम-छपरा नगर निगम, छपरा एवं अन्य में दिनांक 03.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में नगर आयुक्त, छपरा नगर निगम द्वारा खनुआ नाला के विकास हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार की गई योजना का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन जो नगर आयुक्त, छपरा नगर निगम के पत्रांक 72 दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्राप्त हुआ है, को मूल में संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

1513

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।
22/02/2020

315 (23/6)

कार्यालय छपरा नगर निगम

पत्रांक :- 72/ छ0न0नि0

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
छपरा नगर निगम।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

छपरा, दिनांक 16/01/2020

विषय :-

Executive Application 46/2018 (O.A No-234/15) Veterans forum for Transparency in Public life V/s Chapra Nagar Nigam & Ors. वाद में माननीय NGT द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-03.09.2019 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग :-

जिला विधि शाखा का पत्रांक-65 दिनांक-08.01.2020

सहायक,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है कि Executive Application 46/2018 (O.A No-234/15) Veterans forum for Transparency in Public life V/s Chapra Nagar Nigam & Ors. वाद में माननीय NGT द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-03.09.2019 के अनुपालन की अद्यतन स्थिति से संबंधित एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

नगर आयुक्त
छपरा नगर निगम।



कार्यालय छपरा नगर निगम

खनुआ नाला के संदर्भ में प्रगति प्रतिवेदन

1. सफाई व्यवस्था	खनुआ नाला की सफाई बुडको द्वारा चयनित एजेंसी से कराई जा रही है।
2. अतिक्रमण	अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर खनुआ नाला को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है।
3. विकास कार्य योजना	<p>खनुआ नाला के विकास हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है, तदनुसार इसका क्रयान्वयन किया जा रहा है। इस कार्य योजना के मुख्य अवयव निम्नानुसार हैं :-</p> <ul style="list-style-type: none">➤ STP का निर्माण 32 MLD की क्षमता -➤ Sewerage Pumping Station का निर्माण-06 अदद➤ नालों का उन्नयन तथा खनुआ नाला से जुड़ाव-31 अदद <p>उपरोक्त कार्य हेतु विभाग द्वारा 242.6337 (करोड़) की राशि कर्णांकित की गयी है।</p> <p>जिसे बुडको को आवंटित कर दिया गया है। इस कार्य हेतु बुडको कार्यकारी एजेन्सी है।</p>


नगर आयुक्त,
छपरा नगर निगम।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सारण (छपरा)।
नगर आयुक्त,
नगर निगम छपरा।

पटना, दिनांक-23/12/19

विषय :- Executive Application. 46/2018 (O.A No. 234/2015) Veterans forum for Transparency in Public life V/s Chapra Nagar Nigam & Ors. वाद में माननीय NGT द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-03.09.2019 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-2739 दिनांक-10.10.2019 तथा पत्रांक-2985 दिनांक-15.11.2019.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वाद में दिनांक-03.09.2019 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी थी तथा न्यायादेश के आलोक में निर्धारित समय सीमा में सभी आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन सभी आवश्यक कागजातों के साथ उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जो अप्राप्त है।

अतः पुनः अनुरोध किया जाता है कि उक्त मामले के संबंध में कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

23/12/19

विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।



बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना
Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

Near Rajapur Pul, West Boring Canal Road, Patna-800001

Ph. No.:-0612-2506213, 2506109, 2506208, Email id- mdbuidco@gmail.com, Website : http://buidco.in

312

App-A

सं०/No.: Buidco/10-11 89/19-6345

Date- 5/12/19

प्रेषक,

ओम प्रकाश सिंह,
मुख्य अभियंता,
आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण,
बुडको, पटना।

AD (Si. Jha)
[Signature]

SO-3
[Signature]
6.12.19

सेवा में,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बुडको, पटना।

विषय: Executive Application 46/2018 (O.A. No. 234/2015) Veterans Forum for Transparency in Public Life V/s Chapra Nagar Nigam & Ors वाद में माननीय NGT द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-03.09.2019 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग: नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक-2985, दिनांक-15.11.2019

सेवा में,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-03.09.2019 को पारित न्यायादेश की अनुपालन के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु० - 2 यौक्त

विश्वासभाजन,

[Signature]

मुख्य अभियंता,

आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण,
बुडको, पटना।

11,720
06-12-19


1081/55
06/12/19

Name of the project:- Storm Water Drainage with PCC Road Scheme for Chhapra Town,Bihar Under State scheme.

Description of work: - To construct RCC BOX drain of 4.5 mtr Average width, Re-habilitation work, Road crossing work in 4km for Khanua nala in Chhapra town along with PCC road of width 4.5mtr and construction of Drains in Prabhunath Nagar

- Administrative approval:- 29.95 crore
- Amount of Project:- 27.38 crore
- Date of Sanction:- February 2019
- Date of RE-Tender:- 06.06.2019
- Dare of agreement:- 22.08.2019
- Name of Contractor:- M/S Jay Mata Di Road Construction Pvt. Ltd.

Status of Work:- Presently rehabilitation work in 900 mtrs of khanua nala is in progress. Desilting work at sluice gate and work for drain in Prabhunath nagar is also under progress. Demarcation of Khanua nala is in Progress. Photographs are attached for reference.

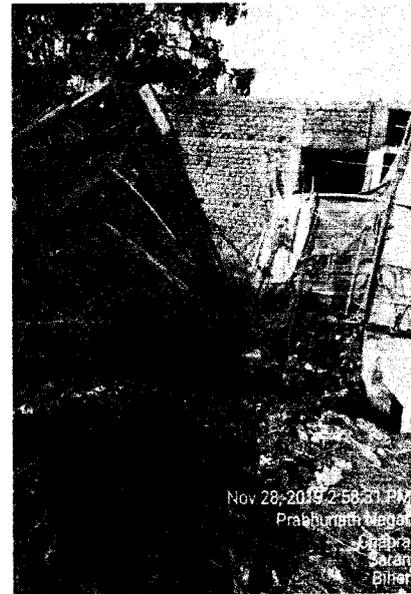

[Handwritten signature]

~~03/नमो 14-31/2018~~ 14-31/2018

03/नमो 14-31/2018
