

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**Principal Bench, New Delhi****Executive Application No. 46/2018****IN****(O.A. No. 234/2015)**

Veterans Forum for Transparency in Public Life

----- **Applicant**

Versus

Chhapra Nagar Nigam, Chhapra & Ors

----- **Respondents**

Compliance Report on behalf of the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department, Bihar.

1. That the instant "Compliance Report" is being furnished before this Hon'ble Tribunal on behalf of the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department, Bihar in compliance to and in the light of the order dated 26.04.2019 passed in the present matter.

2. That by the order under compliance, this Hon'ble Tribunal has directed the Secretary, Urban Development and Housing Department, State of Bihar to furnish further report relating to Khanua Nala, Chhapra before the Hon'ble Tribunal within three months through Email.
3. That the Compliance Report is being submitted, as here under:-
 - (A) Administrative approval was given vide Urban Development and Housing Department's Letter No. 2B/U.D-02-10/2018-132 Dated.27.02.2019, for amount of Rs. 2995.00 lacs for the purpose of Khanua Nala Storm Water Drainage Scheme which includes RCC drain and PCC road. Notice Inviting Tender (NIT) was firstly issued on 01.03.2019 for execution of the said work in which only one bidder participated. Thereafter, in the light of the Finance Department's Letter No. M-4-12/2015-7806 dated 30.09.2016 first tender

was cancelled due to receipt of single tender and re-tender was issued on 31.05.2019 in which date of Submission of Tender was fixed on 26.06.2019 and in this tender three bidders participated.

Xerox copy of Letter No. 3234 dated 15.07.2019 is annexed herewith and marked as **Annexure- A** to this 2nd Compliance Report.

- (B)** The M.D., BUIDCO vide letter no. 3708 dated 05.08.2019 has informed that financial bid of the proposed Khanua Nala Construction Scheme was opened on 03.08.2019 and further action for rate justification from lowest bidder will be taken on 06.08.2019 and after obtaining recommendation from the BUIDCO Executive Committee, work in question shall be allotted to the lowest bidder. Thereafter, the Letter of Acceptance (LOA) has been issued by Buidco to

Buidco to the successful bidder vide letter No. 3795 dated 08.08.2019. The agreement will be signed by Buidco with the tenderer within 15 days and thereafter work will start.

Xerox copy of Letter No. 3706 dated 05.08.2019 and Letter No. 3795 dated 08.08.2019 is annexed herewith and marked as **Annexure- B & C** to this 2nd Compliance Report.

- (C) The D.M., Saran, Chhapra vide Letter No. 1834 dated 07.08.2019 has informed that meeting has taken place for cleaning, removing encroachment and restoration of Khanua Nala. As per the report of the Municipal Corporation, Chhapra Municipal Corporation, continuous and regular cleaning operation is going-on of Khanua Nala by a Special Squad of 40 labours with the help of one JCB Machine and Two Tractors and the silt generated during cleaning

is disposed off at disposal site through tractor and tipper. The Municipal Commissioner, Chhapra Municipal Corporation has further reported that on the northern end of Khanua Nala near Sanda Nala Bridge under the Railway Track is congested which has caused obstruction in the flow of the drain and in this regard partial cleaning is being done by the Municipal Corporation with the help of tractor and JCB, but due to construction of Boundary Wall by the Railway, there is obstruction in cleaning work and therefore the Railway Administration has been requested to remove the same.

In this letter the D.M, Saran, Chhapra has further reported that two separate plastic dustbins have been made available for collection of Dry and Wet waste to 4000 houses under Solid Waste Management Scheme and Door-to-Door collection of waste work is being

operated through agency. Further, dustbins have been setup beside the main road of the Chhapra Town and the same is being disposed off through Compactor Machine. Further, registration of Rag Pickers have been started and procedure for obtaining land for the purpose of Land Fill Site is under way. Further, temporary encroachment over the entire length of Khanua Nala has been removed.

It has further been informed that after inviting tender, Agency has been selected by by the BUIDCO for restoration, upgradation and reestablishment of Khanua Nala and after completion of the this works, problems of Khanua Nala will be resolved.

Xerox copy of Letter No. 1834 dated 07.08.2019 is annexed herewith and marked as **Annexure- D** to this 2nd Compliance Report.

(D) The Municipal Commissioner, Chhapra Municipal Corporation vide Letter No. 1228 dated 07.08.2019 has also submitted up to date, "Detailed Action Taken Report" under four separate headings on Khanua Nala to the Urban Development and Housing Department, Biha:-

I. **Cleaning Scheme of Khanua Nala**

Presently Cleaning of Khanua Nala is being done by Chhapra Municipal Corporation and for the cleaning work entire length of the Nala has been divided into several parts and the cleaning arrangement is being implemented part-wise, Khanua Nala is open, from Sluice Gate situated at Sahebganj to Azad Road of North Kareemchak and for cleaning of this Open Part, since last month, on daily basis one JCB Machine, Two Tractor and 40 Labours are engaged and the silt generated during cleaning is being disposed off at

disposal site through tractor and tipper. In the section of open part of Khanua Nala there is a problem of approach road in the some part due to which JCB and Tractor cannot reach causing obstruction in cleaning work. For the problem area, small size Poclain Machine and Super Suckar Machines are required and for this Expression of Interest was published but no contractor turned-up.

II. **Waste Management of Khanua Nala**

Under this head following actions are being taken:-

- (i) Two different dustbins have been provided to 4000 House-Hold for collection of Dry and Wet waste under SWM.
- (ii) Door-to-Door collection of waste is being done by Private Agency namely CBS Facilities and Management Private Limited from each House Hold.

- (iii) Dustbins have been placed beside the main road of Chhapra Town and waste disposal is being done through Compactor Machine.
- (iv) Compost Pit is ready and very soon compost shall be made through waste.
- (v) Registration of Rack Picker is going on.
- (vi) Expression of Interest has been published for obtaining land for Land-Fill-Site..
- (vii) Cooperation of Help-Group is being ensured for Door-to-Door collection and segregation work.

III. Encroachment

Encroachment has been removed over Khanua Nala by Anty-Encroachment Drive.

IV. Development Work of Khanua Nala

Urban Development and Housing Department, Bihar has prepared action plan for Development of Khanua Nala which is under

implementation and the main features are as follows:-

- (i) Construction of STP with the capacity of 32 MLD.
- (ii) Construction of 6 Sewerage Pumping Station.
- (iii) Renovation and Interlinking of 31 Drain with Khanua Nala.

For the aforesaid work the Urban Development and Housing Department, Bihar has made provision for an amount of Rs. 242.6337/- Crore and the same has been allotted to the Executing Agency BUIDCO.

Xerox copy of Letter No. 1228 dated 07.08.2019 is annexed herewith and marked as **Annexure- E** to this 2nd Compliance Report.

4. That in view of aforesaid facts and circumstances, instant, up-to-date "Compliance Report" may kindly be accepted.

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०

Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

2nd Floor, Khadya Bhawan, Road No. 2, Daroga Prasad Rai Path, R. Block, Patna- 800 001

Contact : + 0612-2506213, 2506109, 2506208, Fax : +91-612-2506132

E-mail : mdbuidco@gmail.com, website : http://buidco.in

CIN - U45200BR2009SGC014600

246



Building Better Tomorrow
ISO 9001:2008, 14001:2004

Annexure - 'A'

सं/No.: पत्रांक सं०- बुडको/यो- 1189/2019- 3234

दिनांक/Date : 15/7/19

प्रेषक

प्रबंध निदेशक,
बुडको पटना।

सेवा में

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- Executive Application. 46/2018 (A.A No 234/2015) Veterans forum for Transparency in Public
V/s Chapra Nagar Nigam & Ors. वद में माननीय NGT द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक- 26.
04.2019 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग- आपका पत्रांक- 03/न्या०- 14-31/2018- 1299, दिनांक- 22.05.2019

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक संबंध में कहना है कि संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ
संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

[Signature]
12.7.19
प्रबंध निदेशक,
बुडको, पटना।

580/SS
15-07-19
RA सं. प्र. म. के
15/7/19

[Signature]
ofc




बिहार सरकार का उपक्रम
Govt. of Bihar Undertaking

360


बुडको: बेहतर कल के लिये

प्रतिवेदन

खनुआ नाला स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-2ब./ना.वि.-02-10/2018-90, दिनांक-27.02.2019 द्वारा रू०-2995.00 लाख राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस कार्य को कराने हेतु प्रथम बार निविदा दिनांक-01.03.2019 को आमंत्रित की गयी थी, जिसमें एक ही निविदाकार द्वारा भाग लिया गया। वित्त विभाग के पत्रांक-एम-4-12/2015-7806 दिनांक-30.09.2016 के आलोक में प्रथम बार में प्राप्त एकल निविदा के कारण निविदा को निरस्त कर पुनः निविदा दिनांक-31.05.2019 को आमंत्रित की गयी। उक्त निविदा में निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 26.06.2019 तक थी, जिसमें तीन निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया। निविदा निष्पादन की अग्रोत्तर कारवाई की जा रही है।









बिहार शहरी आधारभूत संरचना

स निगम लि

Annexure - B (बिहार सरकार का उपक्र

बेरिंग कैनल रोड राजपुर पुल पटन

फोन नं०-91-612-2506109/208, 2506132 (फैक्स), email - mu@buddco@gmail.com

250


Buddco/80-598/14-3708

S.S (SK)

05/8/19

सेवा में

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
पटना।



SD-3
06.8.19

विषय:- Executive Application 46/2018 (O.A no. 234/2015) Veterans forum for Transparency in Public life V/S Chapra Nagar Nigam & Ors. वाद में माननीय NGT द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक- 26.04.2019 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय पत्रांक 2112, दिनांक:- 02.08.19

महाशय,


उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है, कि छपरा में प्रस्तावित खनुआ नाला निर्माण परियोजना का वित्तीय निविदा दि० 3.08.19 को खोलकर न्यूनतम दर निविदाकार से Rate Justification दिनांक- 6.08.19 को कार्यवाई की जा रही है। बुडको Executive Committee से अनुशांसा के उपरान्त न्यूनतम निविदा कार को कार्य आवंटित कर दी जाएगी। ज्ञातव्य है, कि इस परियोजना का प्राक्कलित राशि रू० 28.32 करोड़ है। कार्य समाप्ति की अवधि 18 महीना है।

परियोजना को अतिक्रमण मुक्त कार्य स्थल एवं आवंटन उपलब्धता के अनुसार ससमय पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

विश्वाभाजन

प्रबंध निदेशक
बुडको पटना

5.8.19



910
3/8/19

7311
05.08.19

SA रोय
3/8/19

चैतन्य प्रसाद
CHAITANYA PRASAD
(I.A.S.)

प्रधान सचिव
Principal Secretary



सत्यमेव जयते

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कमरा सं० 101, प्रथम तल,
विकास भवन, बेली रोड, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Urban Development & Housing Deptt.
Vikas Bhawan, Patna - 800 015
Tel.: 0612-2215550 / 2215580, Fax: 0612-22170
Email: urbansec-bih@nic.in

अर्द्ध सरकारी पत्र सं०-03/न्या०-14-31/2018-

2142

दिनांक-06/8/19

प्रिय श्री. सिंह,

विषय:-Executive Application 46/2018 (O.A. No.-234/2015) Veterans Forum for Transparency in Public Life V/s Chapra Nagar Nigam & Ors वाद में माननीय NGT द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-26.04.2019 के अनुपालन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय छपरा नगर निगम क्षेत्र में खनवा नाला के जीर्णोद्धार एवं अतिक्रमण मुक्त करने संबंधित है। इस संबंध में माननीय NGT के आदेश के अनुपालन हेतु तीन माह का समय दिया गया था, उ व्यतीत हो चुका है। विभागीय पत्रांक-1299 दिनांक-22.05.2019, पत्रांक-1844 दिनांक-15.07.2019 ए पत्रांक-2112 दिनांक-02.08.2019 द्वारा माननीय NGT के आदेश दिनांक-26.04.2019 की प्रति भेजते हु आपसे अद्यतन प्रतिवेदन माँगा गया था जो अप्राप्त है। इसके कारण विभाग द्वारा माननीय NGT को प्रतिवेद समर्पित नहीं किया जा सका है। यह स्थिति खेदजनक है।

आप अवगत है कि खनवा नाला के जीर्णोद्धार योजना की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सं०-13 दिनांक-27.02.2019 द्वारा प्रदान की गई थी तथा इसके महत्व एवं माननीय NGT के आदेश से बुडको संबंधित पदाधिकारी/अभियंता भी अवगत हैं। परन्तु बुडको द्वारा अबतक इस संबंध में यह भी प्रतिवेदित नह किया गया है कि इस योजना की निविदा प्रक्रिया एवं कार्यारम्भ में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। कृपया 2 धंटे के अन्दर इस संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय, जिसमें खनवा नाला योजना व कार्यान्वयन की दिशा में योजना स्वीकृति के पश्चात प्रतिदिन की प्रगति का उल्लेख हो। विलम्ब का कार प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो एवं कार्यारम्भ तथा कार्य पूर्णता का स्पष्ट Timeline दर्शाया गया हो उक्त प्रतिवेदन को माननीय NGT को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाना है, अतए प्रतिवेदन उसी प्रकार तैयार कराया जाय। साथ ही विलम्ब के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों/अभियंताओं क भी चिन्हित कर प्रतिवेदित किया जाय।

शुभ कामनाओं के साथ।

भवदीय

6/8/2019

(चैतन्य प्रसाद)

सेवा में,

श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह,
प्रबंध निदेशक, बुडको।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सारण (छपरा)।
प्रबंध निदेशक,
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना।
नगर आयुक्त,
नगर निगम छपरा।

पटना, दिनांक-02/8/19

विषय :- Executive Application. 46/2018 (O.A No. 234/2015) Veterans forum for Transparency in Public life V/s Chapra Nagar Nigam & Ors. वाद में माननीय NGT द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-26.04.2019 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-1299 दिनांक-22.05.2019 एवं पत्रांक-1844 दिनांक-15.07.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वाद में प्रसंगाधीन पत्र द्वारा दिनांक-26.04.2019 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी थी तथा न्यायादेश के आलोक में निर्धारित समय सीमा में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करते हुए विभाग को ससमय सूचित करने का अनुरोध किया गया था। अबतक इस संबंध में प्रतिवेदन अप्राप्त है जबकि माननीय NGT द्वारा दी गई तीन माह की समय सीमा दिनांक-25.07.2019 को समाप्त हो गई है। विदित हो कि मामले में अधोहस्ताक्षरी को तीन माह के अंदर ही माननीय NGT के समक्ष अद्यतन प्रतिवेदन दायर करने का निदेश है।

अतः प्रसंगाधीन पत्र की प्रति संलग्न करते हुए पुनः अनुरोध है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अबतक कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभजन,

31/7/2019

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना

Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

Near Rajapur Pul, West Boring Canal Road, Patna-800001

PH No. 0512-2406213, 2505134, 2505204, Email id: mibuidco@gmail.com, Website: http://uidco.in

Ref. No. BU/IDC/A-598/4-3795

दिनांक 08/08/2019

LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

M/s Jai Mata Di Road Construction Private Limited

H.O. 3/97, LIG, Hanuman Nagar,

Kankarbagh,

Patna-800020, Bihar

Sub: Issue of LOA for Storm Water Drainage System (Khanua Nala) with PCC road in Chhapra Town, Bihar

Ref: NIT No-BU/IDC/A-598/4-31, Dated 31-05-2019

Sir

With reference to your bid, we are pleased to inform that your financial proposal has been accepted at the price INR 27,38,63,232.00/- (Rupees Twenty Seven Crore Thirty Eight Lakh Sixty Three Thousand Two Hundred and Thirty Two Only).

Further, you are requested to submit performance security equivalent to Rs. 54,77,265,00/- (Rupees Fifty Four Lakh Seventy Seven Thousand Two Hundred and Sixty Five Only) and additional performance security of Rs. 27,38,632.00 (Rupees Twenty Seven Lakh Thirty Eight Thousand Six Hundred and Thirty Two Only) in form of Bank Guarantee/Demand Draft from any nationalized bank or scheduled bank as per clause 31 of section-3, instruction to Bidders of the Bid Document which must be valid up to 32 months from the date of LOA and the contractor shall have to provide the extended Bank Guarantee, before the expiry of 60 days, if required, which shall be valid for the period of six months beyond the date of completion of Assignment & this LOA will be guided by Bid document. Failure to submit performance security & additional performance security within above time period will lead to forfeiture of EMD apart from other actions as per provisions of the Bid Document.

You are also requested to bring non-judicial stamp paper of Rs. 1000/- (Rupees One Thousand Only, issued from Patna, Bihar) and company seal for signing the agreement. The agreement will be signed by you or your authorized representative. You are also directed to get your firm registered in BU/IDC.

One copy of the signed agreement will be returned to you for your records, while the original copy of agreement will remain with this office.

Yours Sincerely,


Chief Engineer,
Design, Planning & Monitoring,
BU/IDC, Patna

Received Copy
Viewed on
8/8/2019.

सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला विधि शाखा)

पत्रांक	1834/	विधि	फोन नं०-06152-240001, 240002
दिनांक	7	अगस्त, 2019	फैक्स नं०-06152-240006
			ई-मेल- dm-saran.bih@nic.in

प्रेषक,

सुब्रत कुमार सेन,
जिलाधिकारी,
सारण, छपरा।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-

Execution application 46/2018 (Q.A.No. 234/2015) Veterans forum for Transparency in Public life V/s Chapra Nagar Nigam & Ors. वाद में माननीय NGT द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 26.4.2019 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय पत्रांक 1299 दिनांक 22.5.15 और 1844 दिनांक 15.7.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय प्रारंभिक पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा की जाय जिसके द्वारा माननीय NGT द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 26.4.2019 के आलोक में कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है। इस संबंध में सूचित करना है कि खनुआ नाला की सफाई, अतिक्रमण और पुनर्स्थापन के लिये पूर्व में बैठक की गई थी।

नगर आयुक्त, छपरा नगर निगम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार खनुआ नाला की सफाई हेतु दैनिक रूप से एक जे.सी.बी. मशीन, दो ट्रैक्टर तथा 40 (वालीस) मजदूरों का विशेष दस्ता बना कर लगातार सफाई करवाई जा रही है। सफाई के दौरान निकलने वाले सिल्ट को ट्रैक्टर अथवा टिपर से निस्तारण स्थल पर निस्तारित किया जाता है। खनुआ नाला के जिस भाग में पक्की दूकानें निर्मित हैं उसकी सफाई हेतु Super sucker machine की आवश्यकता नगर निगम द्वारा पूर्व में भी बताई गई थी लेकिन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होने के कारण

म. रं. प्र. क्र. 2/19

मुजफ्फरपुर नगर निगम से इसे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है तथा नगर विकास विभाग, बिहार से भी पत्राचार किया गया है।

नगर आयुक्त, छपरा नगर निगम ने आगे प्रतिवेदित किया है कि खनुआ नाला के उत्तरी छोर पर सांद्र ढाला के पास रेलवे लाईन के नीचे पुलिया संकीर्ण है जिसके कारण जल प्रवाह अवरुद्ध है। इसकी आंशिक सफाई ट्रेक्टर एवं जे. सी. बी. के माध्यम से नगर निगम द्वारा करवाई जा रही है किन्तु रेलवे द्वारा चहारदीवारी का निर्माण करा दिये जाने से सफाई कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसे हटाने के लिये नगर निगम द्वारा रेलवे प्रशासन से अनुरोध किया गया है।

दोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 4000 घरों को गीला तथा सूखा कचड़ा संग्रह हेतु दो अलग प्लास्टिक की डस्टबिन उपलब्ध कराई गई है। डोर टू डोर कचरा संग्रह का कार्य भी एजेन्सी के माध्यम से कराया जा रहा है। नगर के मुख्य पथ के किनारे कूड़ा पात्रों को लगा कर काम्पैक्टर मशीन से निस्तारण किया जा रहा है। Rag pickers को चिन्हित कर पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है तथा Landfill site हेतु भूमि प्राप्ति हेतु प्रक्रिया प्रारंभ है।

खनुआ नाला की संपूर्ण लंबाई में अस्थायी अतिक्रमण को पूर्णतः हटा दिया गया है। यदा-कदा सब्जी तथा अन्य सामग्री बेचने वालों द्वारा नाला का अतिक्रमण किया जाता है जिसे नियमित रूप से अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है।

भवदीय अवगत है कि खनुआ नाला के जीर्णोद्धार, उन्नयन एवं पुनर्स्थापन हेतु बुडको द्वारा निविदा आमंत्रित कर एजेन्सी का चयन कर लिया गया है। इन कार्यों के पूर्ण होने से जहां एक ओर खनुआ नाला के जीर्णोद्धार से संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण हो पायेगा वहीं दूसरी ओर छपरा शहर को जल-जमाव से भी मुक्ति मिल सकेगी।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वरामभाजन

जिलाधिकारी
सारण, छपरा

कार्यालय छपरा नगर निगम

पत्रांक :- 1228/ छ0न0नि0

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
छपरा नगर निगम।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

छपरा, दिनांक 07/08/2019

विषय :- खनुआ नाला से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषय के क्रम में सूचित करना है खनुआ नाला से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

[Signature]


नगर आयुक्त,

छपरा नगर निगम।

[Signature]



S(SK)/AD

50.3
[Signature]
8.8.19[Signature]
[Signature]
8/8/19

(1) खनुआ नाला की सफाई योजना :-

खनुआ नाला की सफाई वर्तमान में छपरा नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य के लिए खनुआ नाला के संपूर्ण लम्बाई को कई हिस्से में विच्छेदित कर सफाई कार्य कराया जा रहा है। सफाई व्यवस्था की क्रियान्वयन निम्न रूप से अंशवार किया जा रहा है :-

- (i) साहेबगंज में अवस्थित स्लुईस गेट से उत्तर करीमचक के आजाद रोड तक खनुआ नाला खुला हुआ है, इस भाग की सफाई हेतु पिछले एक माह से दैनिक रूप से एक जे०सी०बी० मशीन, दो ट्रैक्टर तथा 40 (चालीस) मजदूरों को लगाकर सफाई किया जा रहा है। सफाई के दौरान निकलने वाले सिल्ट को ट्रैक्टर अथवा टीपर से निस्तारण स्थल पर निस्तारित किया जाता है। इस भाग के कतिपय हिस्सों में पहुँच पथ का अभाव होने के कारण जे.सी.बी. एवं ट्रैक्टर नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण सफाई कार्य में बाधा उत्पन्न होता है।
- (ii) सुझाव - इस हिस्से की सफाई के लिए छोटे आकार का पोकलेन मशीन से इस हिस्से की सफाई की जा सकती है। करीमचक रोड से उत्तर तीनकोनिया, मौना चौक होते हुए साढ़ाँ ढ़ाला तक नाले के उपर पक्के दुकान का निर्माण बना हुआ है। दुकानों के नीचे अवस्थित नाले का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा भर गया है। इस भाग के नाले के सफाई हेतु Super Sucker मशीन की आवश्यकता है। इस हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति का प्रकाशन किया गया था, परन्तु कोई भी संवेदक ने भाग नहीं लिया है।

m

(2) खनुआ नाला का कचड़ा प्रबंधन :-

छपरा नगर निगम के अन्तर्गत शहर की सफाई तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निम्नांकित कारवाई किया जा रहा है :-

- SWM के अन्तर्गत 4000 (चार हजार) Household को गिला तथा सूखा कचरा संग्रह हेतु दो अलग प्लास्टिक की Dustbin की आपूर्ति।
- CBS Facilities & Managment Pvt. Ltd. के द्वारा प्रत्येक घर से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है।
- नगर के मुख्य पथ के किनारे कुड़ा पात्रों का लगाकर कॉम्पेक्टर मशीन से निस्तारण किया जा रहा है।
- Composting Pit बन कर तैयार है। शीघ्र ही कचड़ा से Composting किया जायेगा।
- Rack Pickers को विन्हित करके पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ।
- Land Fill Site हेतु भूमि प्राप्ति हेतु EOI का पुनः प्रकाशन किया गया है।
- डोर-टू-डोर Collection तथा Segregation कार्य के लिए स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।

(3) अतिक्रमण :-

अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है।

287


(4) खनुआ नाला के विकास की कार्य योजना :-


खनुआ नाला के विकास हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है, और उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्य योजना के मुख्य अवयव निम्नानुसार है :-

- STP का निर्माण 32 MLD की क्षमता -
- Sewerage Pumping Station का निर्माण-06
- नालों का उन्नयन तथा खनुआ नाला से जुड़ाव-31


उपरोक्त कार्य हेतु विभाग द्वारा 242.6337 (करोड़) की राशि का प्रावधान किया गया है।


उपरोक्त राशि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा बुडको को आवंटित किया गया है। तथा उपरोक्त कार्य हेतु बुडको को ही कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है।


नगर आयुक्त,
छपरा नगर निगम।

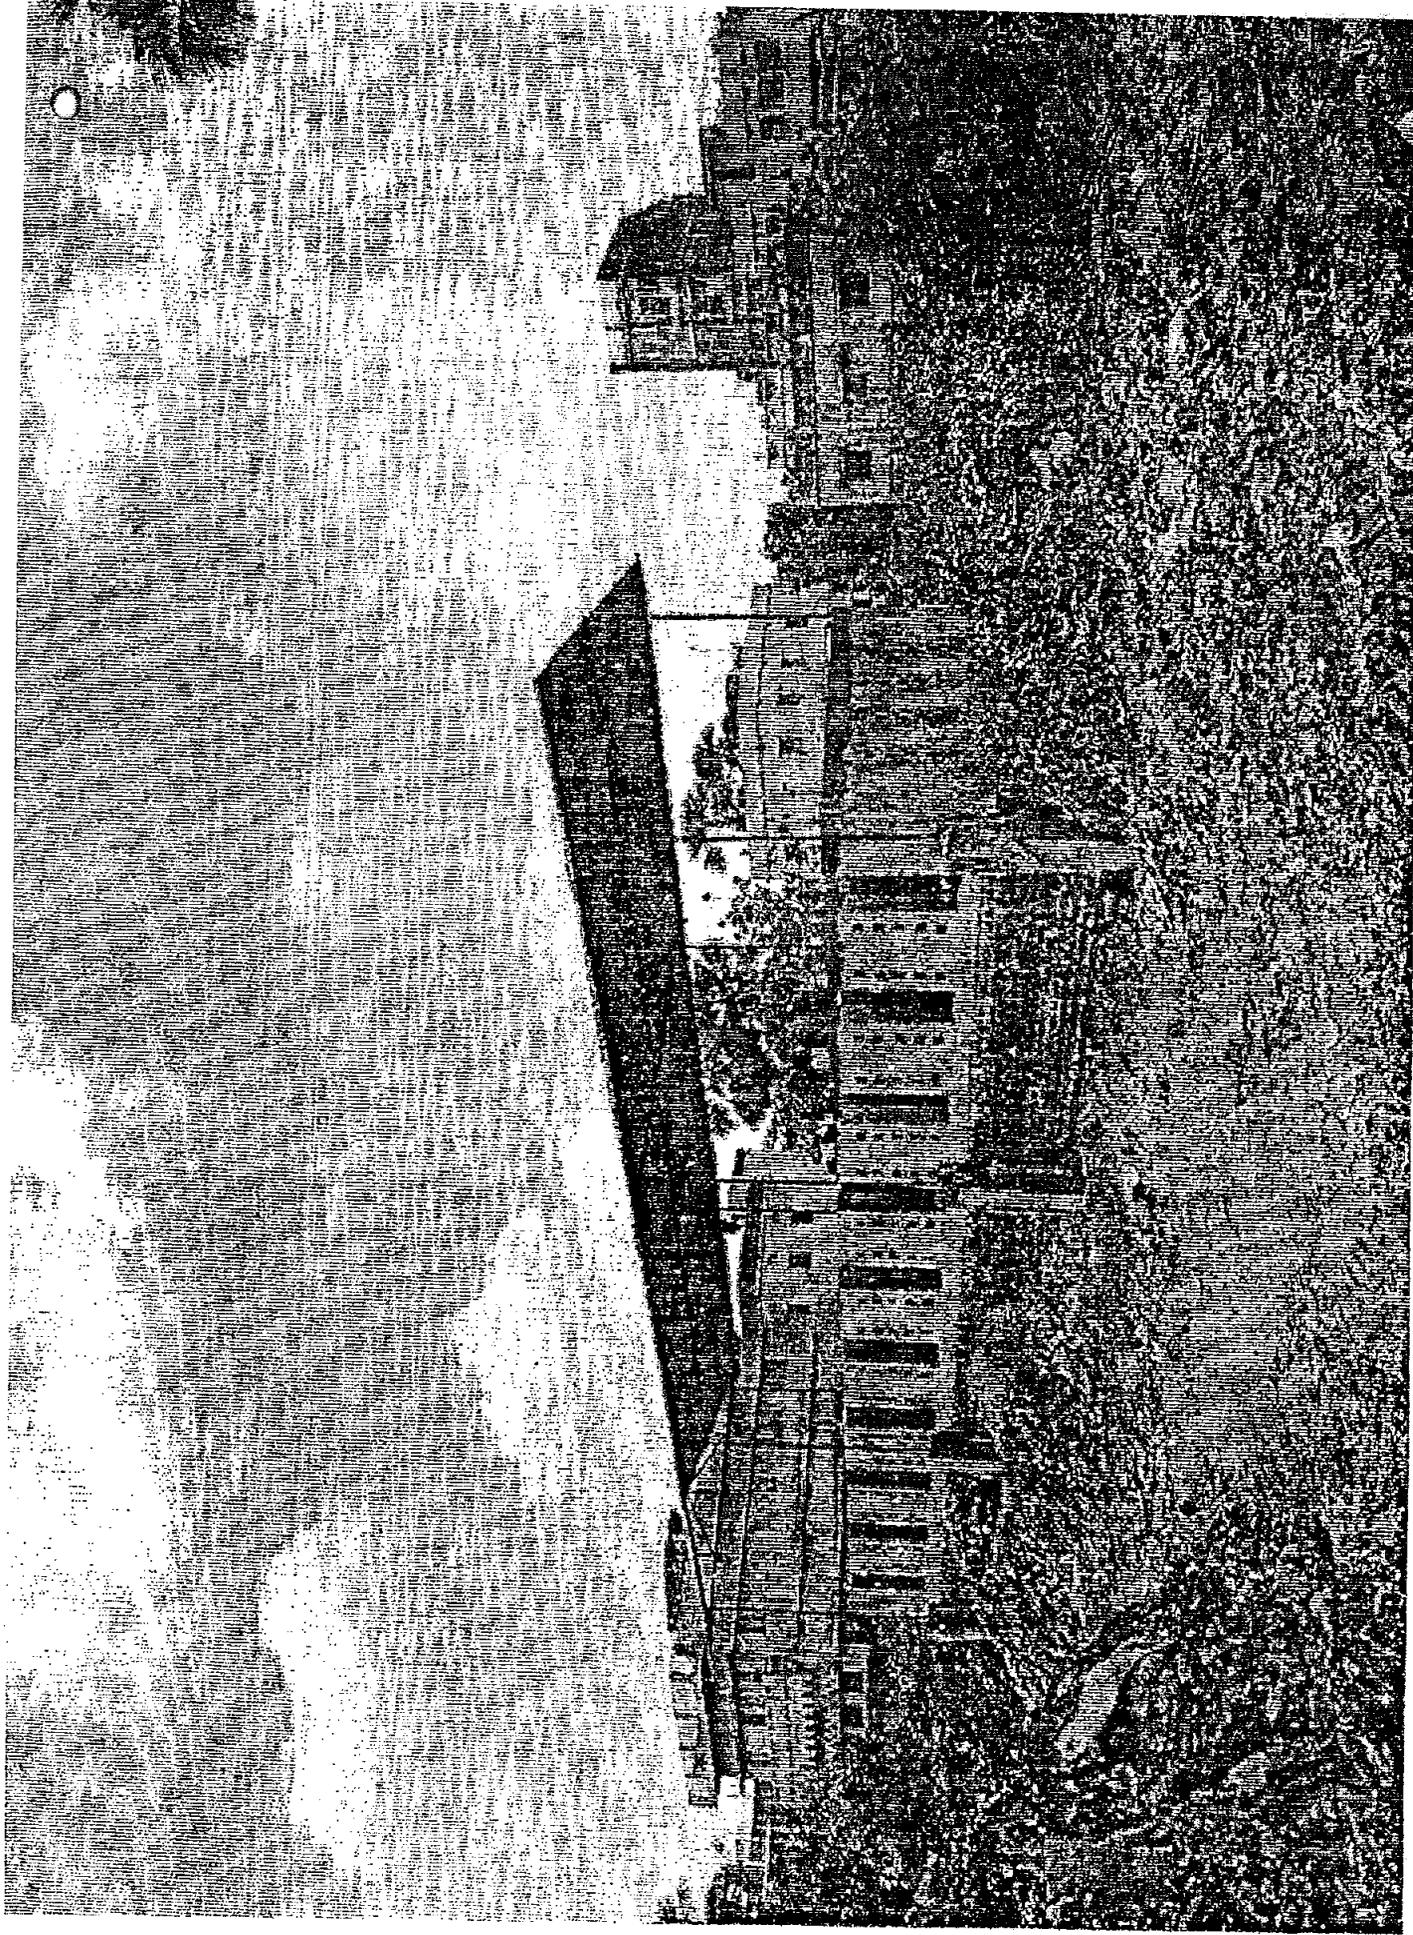

261

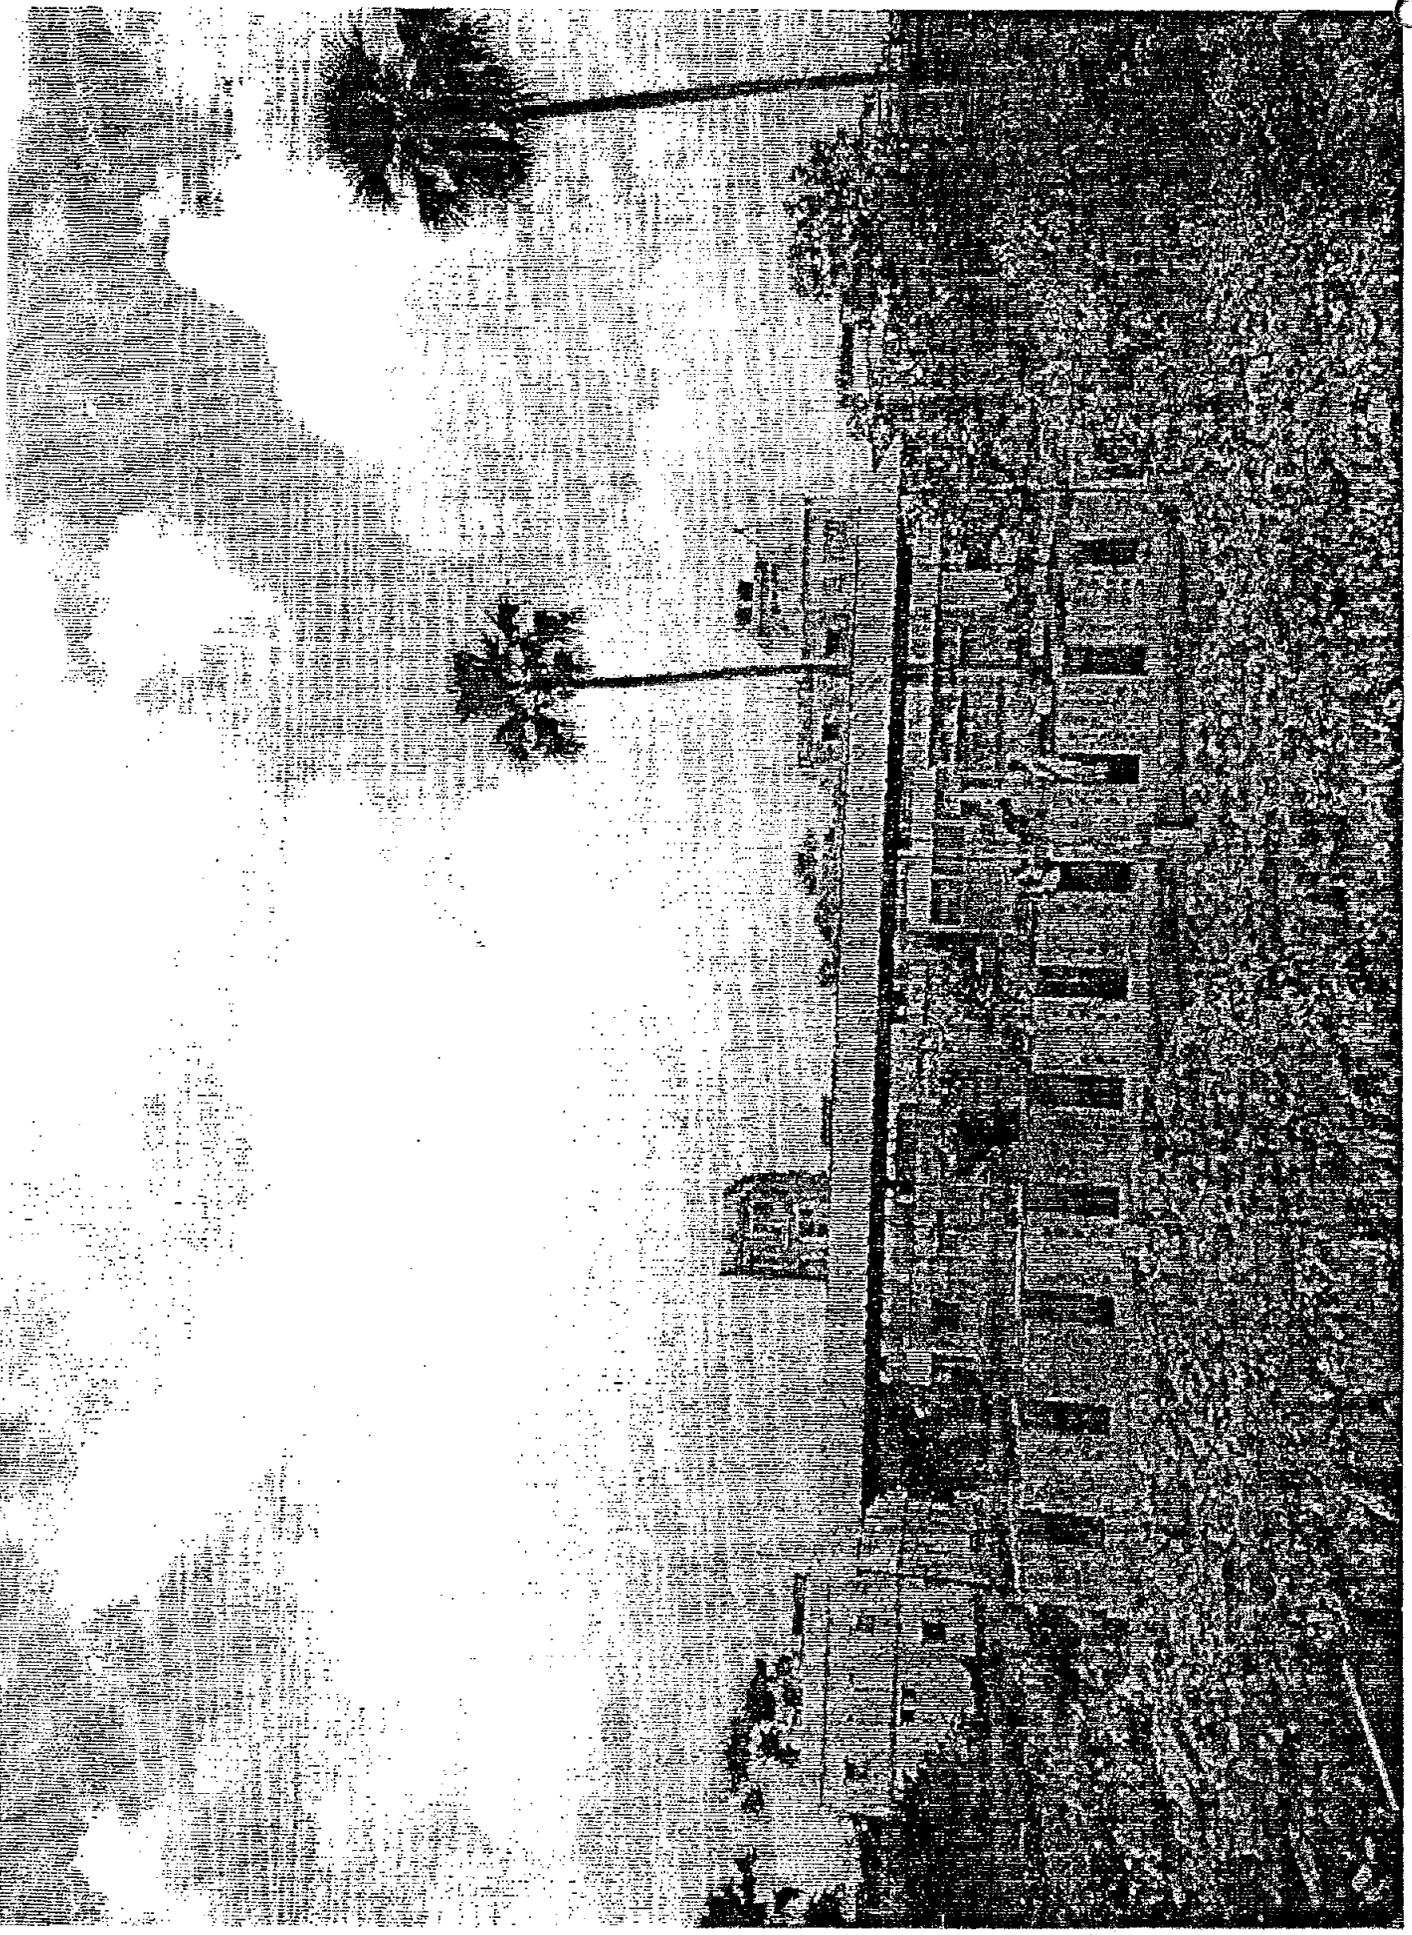

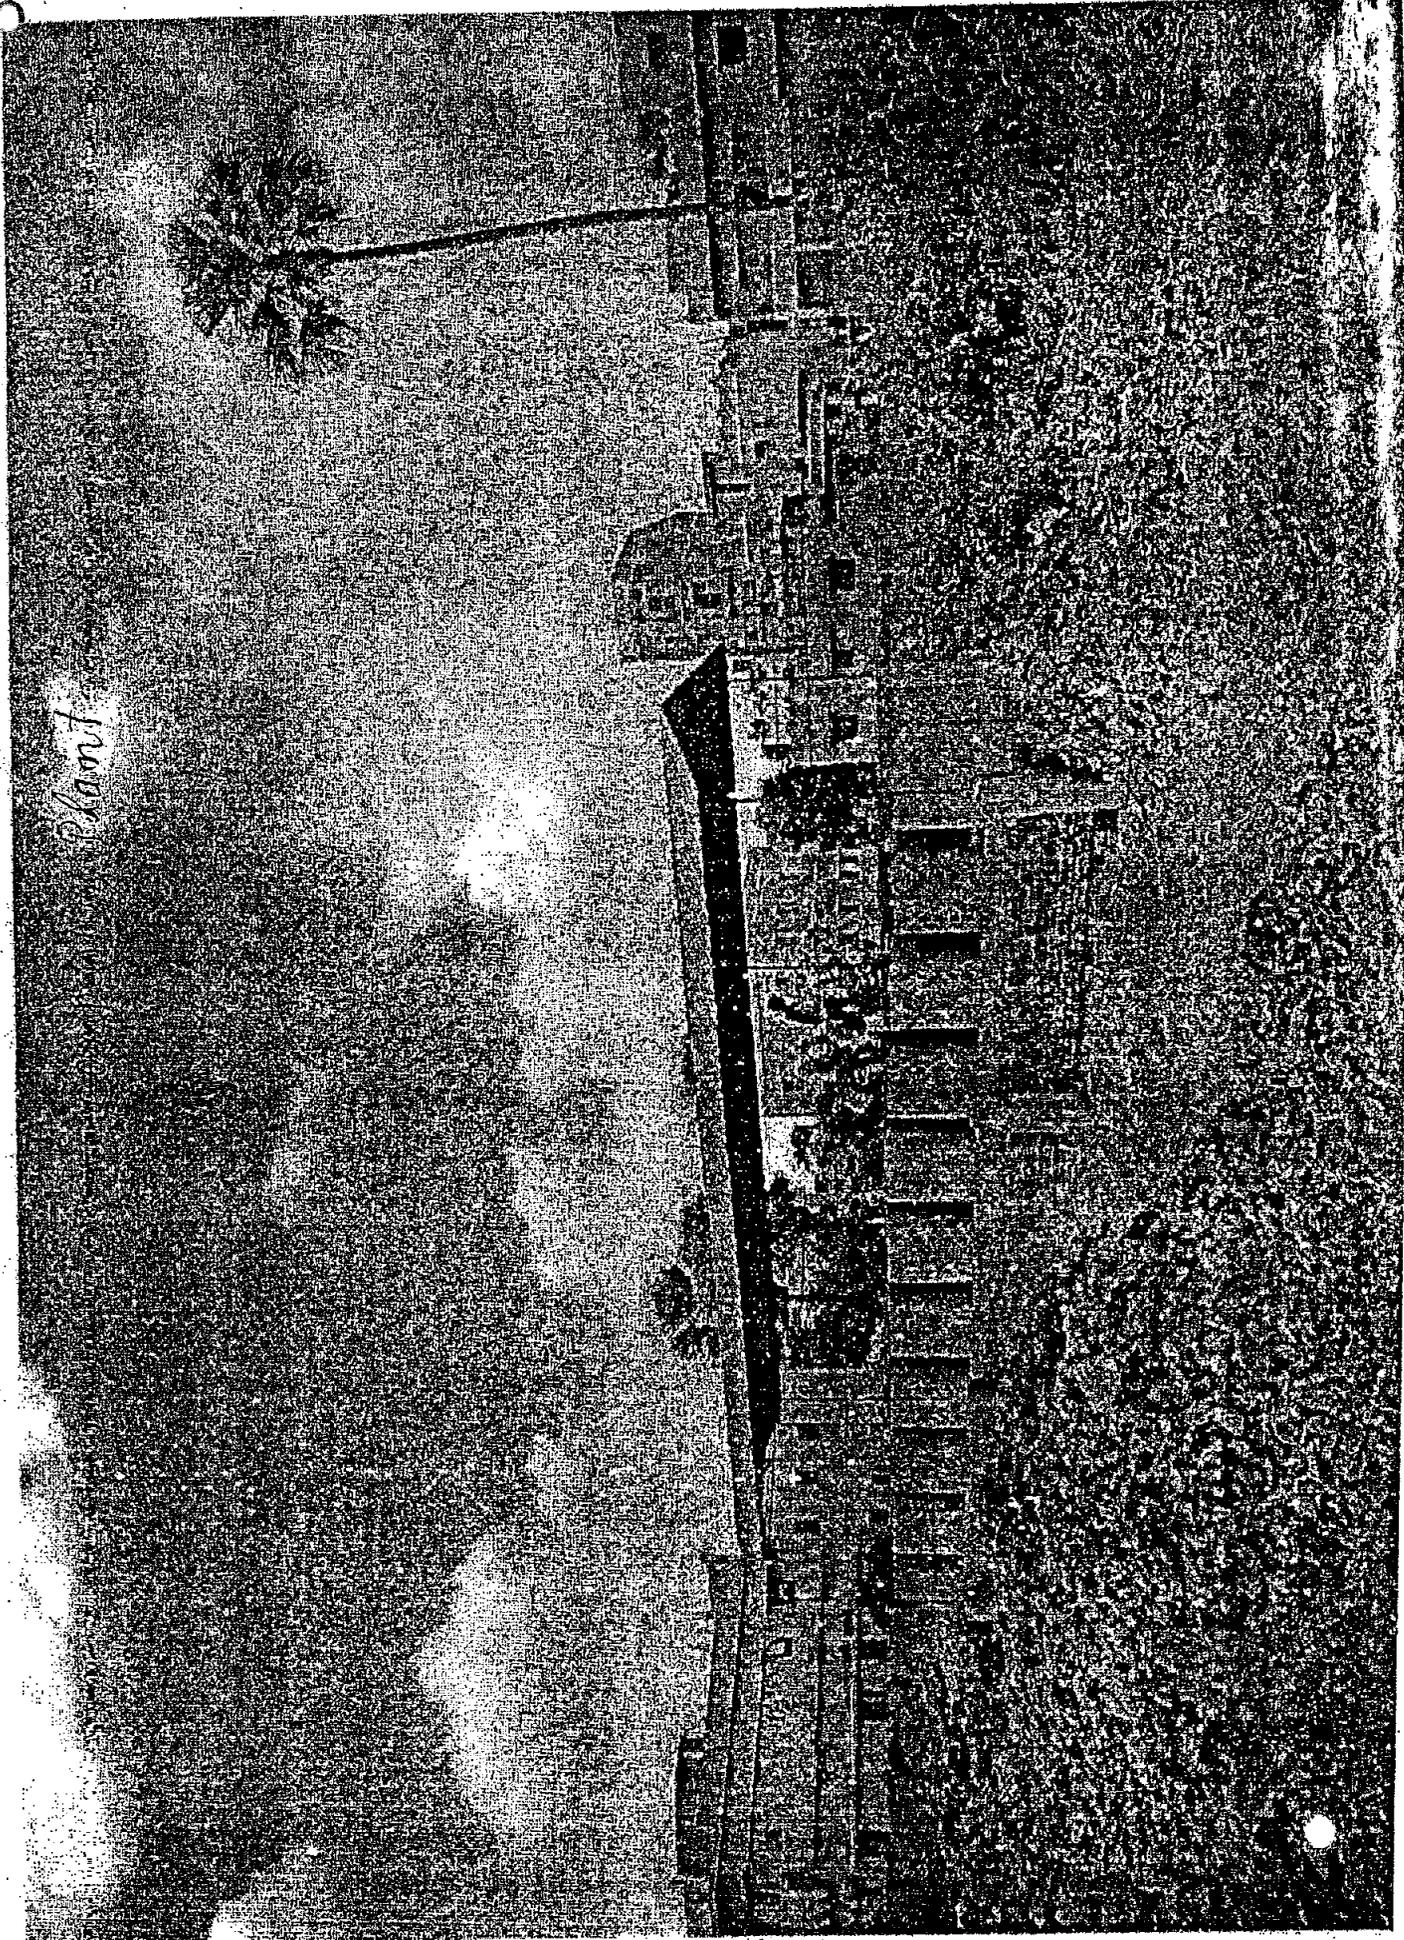

Plant

कार्यालय छपरा नगर निगम

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय National Green Tribunal पाठ, नई दिल्ली द्वारा प्रारित न्यायादेश के अनुपालन में छपरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत खुनुआ नाला का वृहद सफाई कार्य कराया जा रहा है। खुनुआ नाला के प्रवाह में कतिपय पर सफाई कार्य हेतु सुपर सकर मशीन की आवश्यकता का आकलन है, जिस क्रम में द्वारा भाड़े पर सुपर सकर मशीन के उपयोग की अनुमति दी गई है। एतद् क्रम में सु मशीन रखने वाली सरकारी/ गैरसरकारी/ व्यक्तिगत एजेंसी से सुपर सकर मशीन भाड़े पर नगर निगम को उपलब्ध कराने के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति निम्न शर्तों के अन्तर्गत मु लिफाफे में आमंत्रित की जाती है:-

- (i) आपूर्तिकर्ता को आधे संख्या पैन कार्ड की छायाप्रति देनी होगी।
- (ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा किन्हीं अन्य निकायों/ जगहों पर सुपर सकर मशीन भाड़े गई हो, तो उसकी प्रति भी देनी होगी।
- (iii) आपूर्तिकर्ता को प्रतिदिन की कार्य अवधि का वर्णन करते हुए प्रतिदिन हेतु का दर (तेल/ ऑपरेटर) सभी खर्चों के साथ अंकित करना होगा।
- (iv) आपूर्तिकर्ता द्वारा एतद् अभिरूचि की अभिव्यक्ति सभी कागजातों की प्रति क सुहर नद लिफाफे में दिनांक 17.11.2018 को 1:00 बजे अपराह्न तक छपरा निगम के कार्यालय में जमा करना होगा।
- (v) प्राप्त सभी अभिरूचि की अभिव्यक्ति दिनांक 17.11.2018 को 1:30 बजे अपरा छपरा नगर निगम के सराफे स्टाई समिति के समक्ष अवलोकन एवं स्वीकृि रखा जायेगा, जिसमें अभिरूचिप्रदाता को कागजातों की मूल प्रति के साथ उ रहना होगा। आपूर्तिकर्ता स्वयं की अनुपस्थिति में किसी व्यक्ति को वि प्राधिकृत कर सकते हैं।
- (vi) इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी कार्यालय अवधि में नगर छपरा नगर निगम से अथवा उनके मोबाइल नम्बर-9123280119 पर प्राप्त किया सकता है।
- (vii) एतद् अभिरूचि के आमन्त्रण को नगर कार्यालय चतारवाहद करण का अधिकार नगर निगम को होगा।

80/-

नगर आयुक्त

छपरा नगर निगम

जापंक 1383 / 80 नो नो

छपरा दिनांक 23/11/18

प्रतिलिपि :- e-advertisement के विनामिय प्रवसाहद पर निगम/अपरा/को/अपना/कार्य/सेवा/माला

नगर आयुक्त

छपरा नगर निगम

कार्यालय छपरा नगर निगम

258

पत्रांक...../छ0न0नि0 छपरा/दिनांक...../...../2019

आदेश

छपरा नगर निगम प्रक्षेत्र अन्तर्गत खनुआ नाला नगर निगम क्षेत्र का मुख्य नाला है, जिसकी निरन्तर सफाई सम्प्रति इस नाला के अतिक्रमित होने एवं अन्य कारणों से भी आवश्यक है। विदित है कि माननीय National Green Tribunal, New Delhi में दायर O.A No. 234/2015 एवं O.A No. 444/2017 में पारित न्यायादेश दिनांक 27.10.2016 तथा 30.10.2017 के अनुपालन एवं एतद् न्यायादेशों के क्रियान्वयन के क्रम में भी खनुआ नाला की निरन्तर सफाई आवश्यक है। एतद् के आलोक में छपरा नगर निगम में उपलब्ध उपकरण एवं मशीनरी संसाधन में से एक जे0सी0बी0 एवं दो ट्रैक्टर (ट्रैलर सहित) खनुआ नाला की प्रतिदिन सफाई हेतु Dedicate किये जाते हैं। अधोलिखित कंडिका-2 के अनुसार प्रतिनियुक्त कर्मी आवश्यकतानुसार अतिरिक्त उपकरण एवं मशीन खनुआ नाला की सफाई हेतु प्रयुक्त करेंगे।

खनुआ नाला की निरन्तर सफाई हेतु अधोलिखित बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है:-

क्र०	दिनांक	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	प्रतिनियुक्त सफाई निरीक्षण का नाम	प्रतिनियुक्त जमादार का नाम	प्रतिनियुक्त सफाई कर्मियों की संख्या	सफाई उपयोग में लाई गई वाहन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	01.08.19 से 03.08.19	अपर नगर आयुक्त, छपरा नगर निगम के अध्यक्षता में गठित टीम के द्वारा किया जायेगा।	श्री अखिलेश राय, श्री राजनाथ राय एवं श्री असगर अली-II	श्री रमेशचन्द्र पाण्डेय, श्री मोहन सिंह एवं श्री रुदल सिंह	यथा उपस्थिति	जे.सी.बी., ट्रैक्टर, ट्रैनक्टर मशीन इत्यादि
2	05.08.19 से 10.08.19		"	"	"	"
	19.08.19 से 22.08.19		"	"	"	"
	26.08.19 से 31.08.19		"	"	"	"

(i) उपरोक्त समय सारणी में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों/पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि को कार्यालय में उपलब्ध संसाधनों से खनुआ नाला की सफाई कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि खनुआ नाला से पानी का बहाव नियमित एवं निर्बाध रूप में हो सके।

(ii) किये जाने वाले कार्य की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी सुनिश्चित की जाय।


नगर आयुक्त,
छपरा नगर निगम।

ज्ञापांक 1183/छ0न0नि0 छपरा/दिनांक 01/08/2019
प्रतिलिपि :- नाज़िर को सूचनार्थ एवं निर्देश दिया जाता है कि खनुआ नाला की सफाई में आवश्यकतानुसार कुदाल, टोकरी, पंजा, बेलचा, ईंधन एवं अन्य आवश्यक उपस्कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- अपर नगर आयुक्त/नगर प्रबंधक, छपरा नगर निगम को सूचनार्थ प्रेषित, उपरोक्त बर्णित कार्य की समीक्षा स्वयं अपने स्तर से करेंगे।

नगर आयुक्त,
छपरा नगर निगम।

257

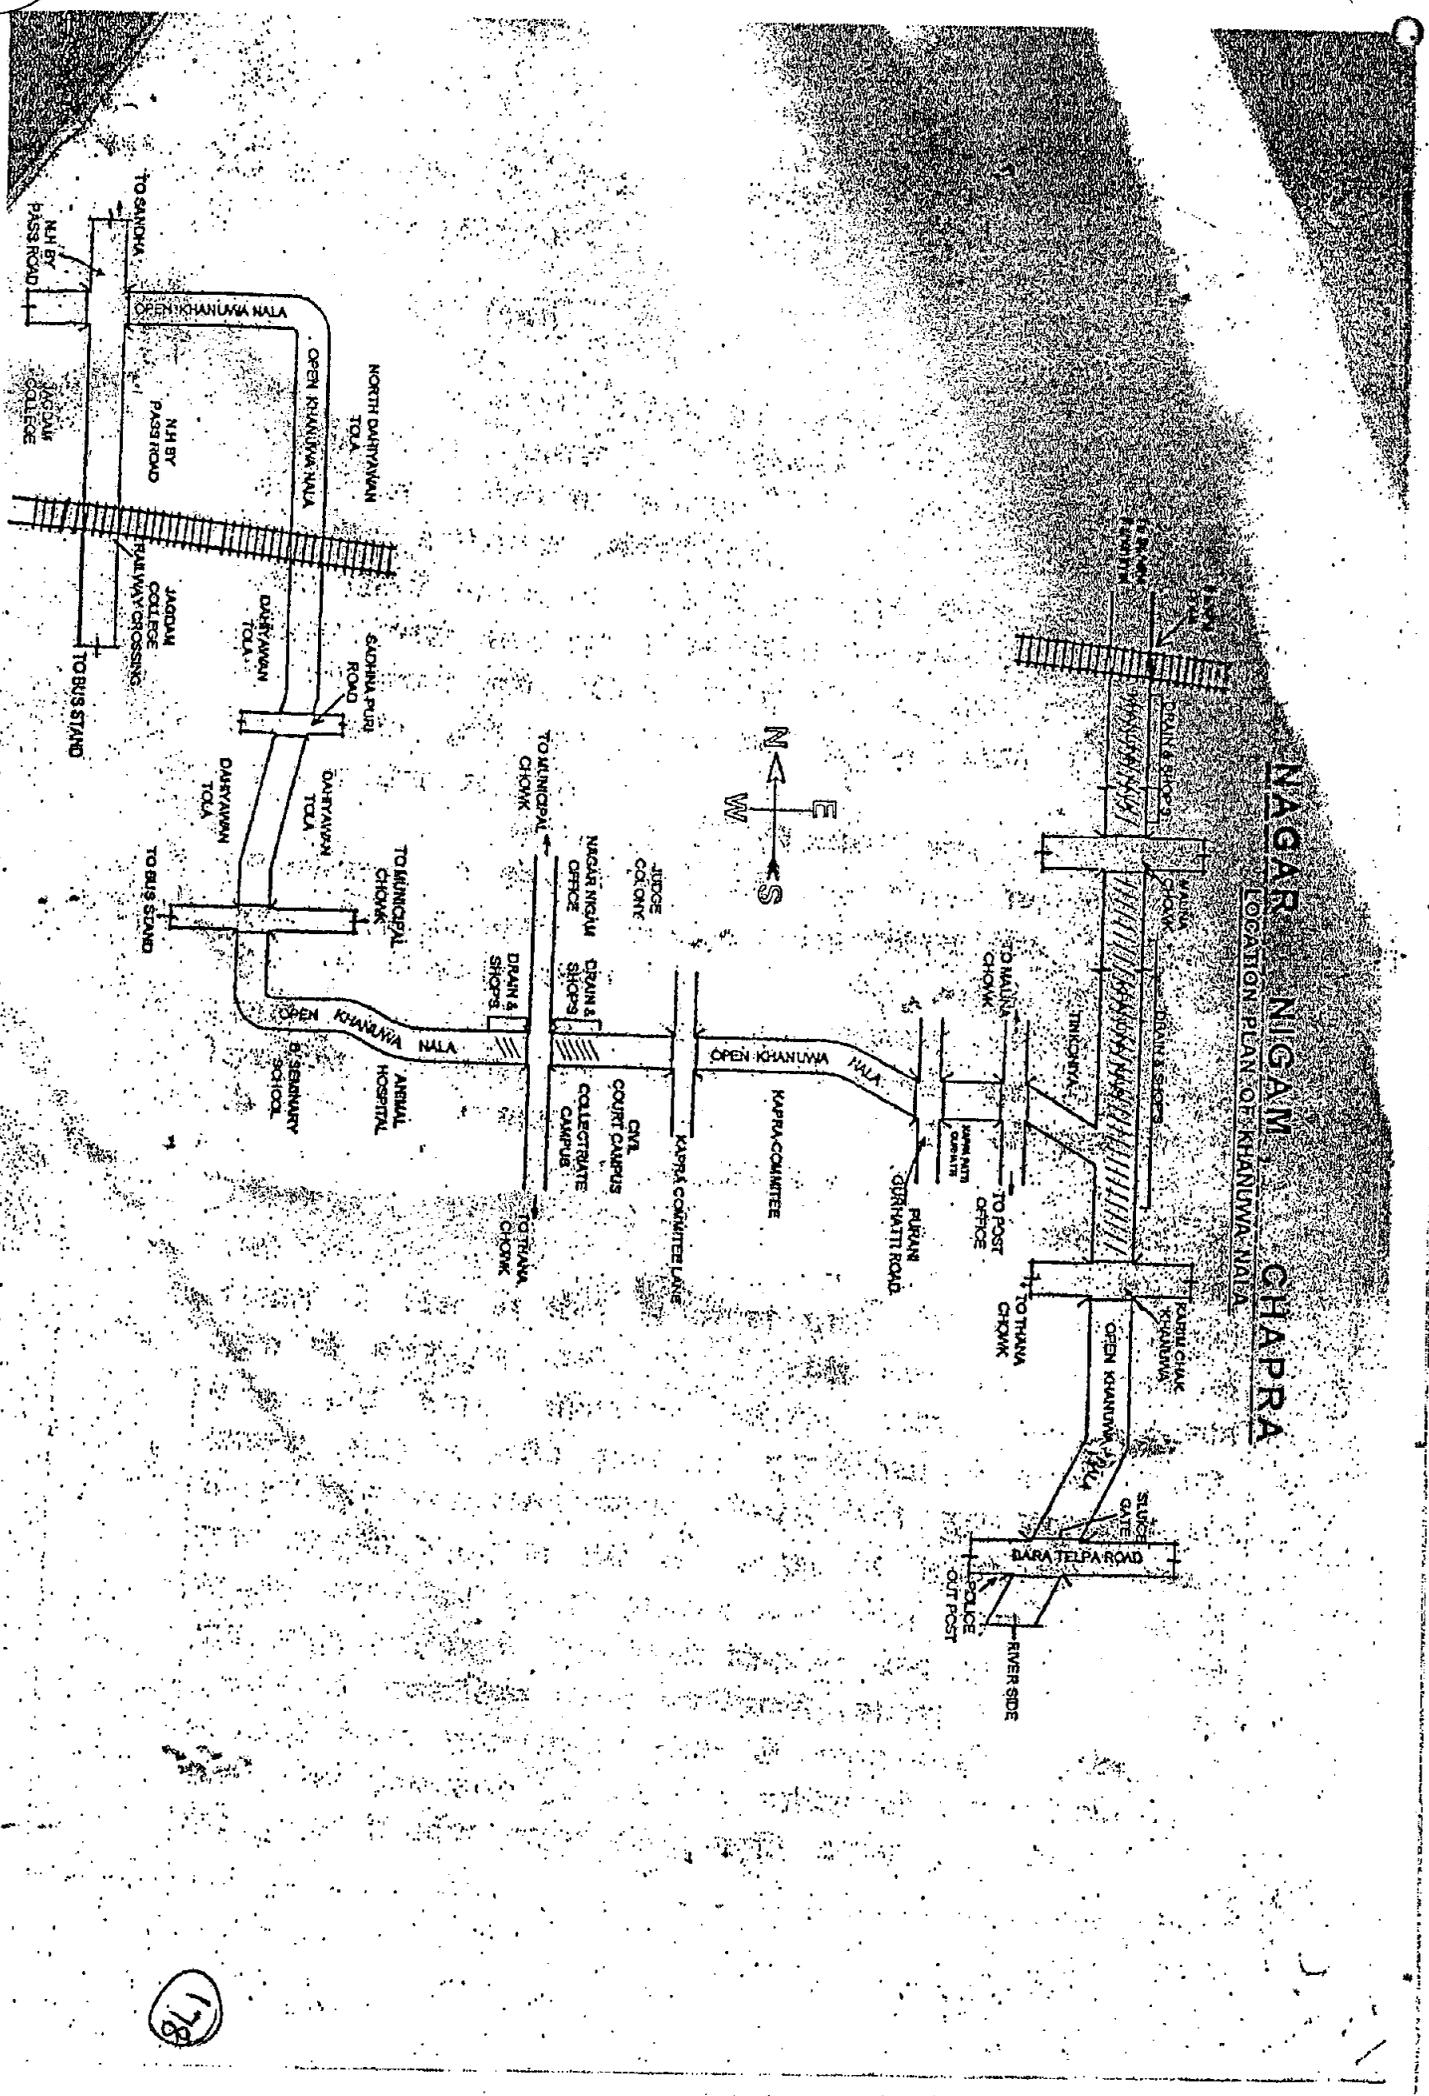

NAGAR NIGAM CHAPRA
 LOCATION PLAN OF KHANLUWA NALA

178

कार्यालय छपरा नगर निगम

पत्रांक...../छ0न0नि0 छपरा/दिनांक...../...../2019

256

आदेश

छपरा नगर निगम प्रक्षेत्र अन्तर्गत खनुआ नाला नगर निगम क्षेत्र का मुख्य नाला है, जिसकी निरन्तर सफाई सम्प्रति इस नाला के अतिक्रमित होने एवं अन्य कारणों से भी आवश्यक है। विदित है कि माननीय National Green Tribunal, New Delhi में दायर O.A No. 234/2015 एवं O.A No. 444/2017 में पारित न्यायादेश दिनांक 27.10.2016 तथा 30.10.2017 के अनुपालन एवं एतद् न्यायादेशों के क्रियान्वयन के क्रम में भी खनुआ नाला की निरन्तर सफाई आवश्यक है। एतद् के आलोक में छपरा नगर निगम में उपलब्ध उपकरण एवं मशीनरी संसाधन में से एक जे0सी0बी0 एवं दो ट्रैक्टर (ट्रिलर सहित) खनुआ नाला की प्रतिदिन सफाई हेतु Dedicate किये जाते हैं। अधोलिखित कंडिका-2 के अनुसार प्रतिनियुक्त कर्मी आवश्यकतानुसार अतिरिक्त उपकरण एवं मशीन खनुआ नाला की सफाई हेतु प्रयुक्त करेंगे।

खनुआ नाला की निरन्तर सफाई हेतु अधोलिखित बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है:-

क्र0	दिनांक	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	प्रतिनियुक्त सफाई निरीक्षण का नाम	प्रतिनियुक्त जमादार का नाम	प्रतिनियुक्त सफाई कर्मियों की संख्या	सफाई उपयोग में लाई गई वाहन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	01.08.19 से 03.08.19	अपर नगर आयुक्त, छपरा नगर निगम के अध्यक्षता में गठित टीम के द्वारा किया जायेगा।	श्री अखिलेश राय, श्री राजनाथ राय एवं श्री असगर अली-11	श्री रमेशचन्द्र पाण्डेय, श्री मोहन सिंह एवं श्री रुदल सिंह	यथा उपस्थिति	जे.सी.बी., ट्रैक्टर, ट्रैक्टर मशीन इत्यादि
2	05.08.19 से 10.08.19		"	"	"	"
	19.08.19 से 22.08.19		"	"	"	"
	26.08.19 से 31.08.19		"	"	"	"

(i) उपरोक्त समय सारणी में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों/पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि को कार्यालय में उपलब्ध संसाधनों से खनुआ नाला की सफाई कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि खनुआ नाला से पानी का बहाव नियमित एवं निर्बाध रूप में हो सके।

(ii) किये जाने वाले कार्य की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी सुनिश्चित की जाय।

नगर आयुक्त,
छपरा नगर निगम।

ज्ञापांक 1183/छ0न0नि0 छपरा/दिनांक 01/08/2019
प्रतिलिपि :- नाजिर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि खनुआ नाला की सफाई में आवश्यकतानुसार कुदाल, टोकरी, पंजा, बेल्वा, ईंधन एवं अन्य आवश्यक उपस्कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि :- अपर नगर आयुक्त/नगर प्रबंधक, छपरा नगर निगम को सूचनार्थ प्रेषित, उपरोक्त वर्णित कार्य की समीक्षा स्वयं अपने स्तर से करेंगे।

नगर आयुक्त,
छपरा नगर निगम।

कार्यालय छपरा नगर निगम

पत्रांक...../छ0न0नि0 छपरा/दिनांक...../...../2019

आदेश

छपरा नगर निगम प्रक्षेत्र अन्तर्गत खनुआ नाला नगर निगम क्षेत्र का मुख्य नाला है, जिसकी निरन्तर सफाई सम्प्रति इस नाला के अतिक्रमित होने एवं अन्य कारणों से भी आवश्यक है। विदित है कि माननीय National Green Tribunal, New Delhi में दायर O.A No. 234/2015 एवं O.A No. 444/2017 में पारित न्यायादेश दिनांक 27.10.2016 तथा 30.10.2017 के अनुपालन एवं एतद् न्यायादेशों के क्रियान्वयन के क्रम में भी खनुआ नाला की निरन्तर सफाई आवश्यक है। एतद् के आलोक में छपरा नगर निगम में उपलब्ध उपकरण एवं मशीनरी संसाधन में से एक जे0सी0बी0 एवं दो ट्रैक्टर (ट्रिलर सहित) खनुआ नाला की प्रतिदिन सफाई हेतु Dedicate किये जाते हैं। अधोलिखित कंडिका-2 के अनुसार प्रतिनियुक्त कर्मी आवश्यकतानुसार अतिरिक्त उपकरण एवं मशीन खनुआ नाला की सफाई हेतु प्रयुक्त करेंगे।

खनुआ नाला की निरन्तर सफाई हेतु अधोलिखित बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है:-

क्र0	दिनांक	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	प्रतिनियुक्त सफाई निरीक्षण का नाम	प्रतिनियुक्त जमादार का नाम	प्रतिनियुक्त सफाई कर्मियों की संख्या	सफाई उपयोग में लाई गई वाहन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	01.08.19 से 03.08.19	अपर नगर आयुक्त, छपरा नगर निगम के अध्यक्षता में गठित टीम के द्वारा किया जायेगा।	श्री अखिलेश राय, श्री राजनाथ राय एवं श्री असगर अली-II	श्री रमेशचन्द्र पाण्डेय, मोहन सिंह एवं श्री रुदत सिंह	यथा उपस्थिति	जे.सी.बी., ट्रैक्टर, ड्रेनकटर मशीन इत्यादि
2	05.08.19 से 10.08.19		"	"	"	"
	19.08.19 से 22.08.19		"	"	"	"
	26.08.19 से 31.08.19		"	"	"	"

(i) उपरोक्त समय सारणी में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों/पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि को कार्यालय में उपलब्ध संसाधनों से खनुआ नाला की सफाई कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि खनुआ नाला से पानी का बहाव नियमित एवं निर्बाध रूप में हो सके।

(ii) किये जाने वाले कार्य की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी सुनिश्चित की जाय।

र. —————
नगर आयुक्त,
छपरा नगर निगम।

ज्ञापांक 1183/छ0न0नि0 छपरा/दिनांक 01/08/2019
प्रतिलिपि :- नाजिर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि खनुआ नाला की सफाई में आवश्यकतानुसार कुदाल, टोकरी, पंजा, बेल्टा, ईंधन एवं अन्य आवश्यक उपस्कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि :- अपर नगर आयुक्त/नगर प्रबंधक, छपरा नगर निगम को सूचनार्थ प्रेषित, उपरोक्त वर्णित कार्य की समीक्षा स्वयं अपने स्तर से करेंगे।

नगर आयुक्त,
छपरा नगर निगम।



Khanua Nala



Khanua Nala, Mauna Chauk, Date: 25.03.2019



Khanua Nala, Sandha






Khanua Nala, K



Khanua N



Khanua Nala, Karim Chak,

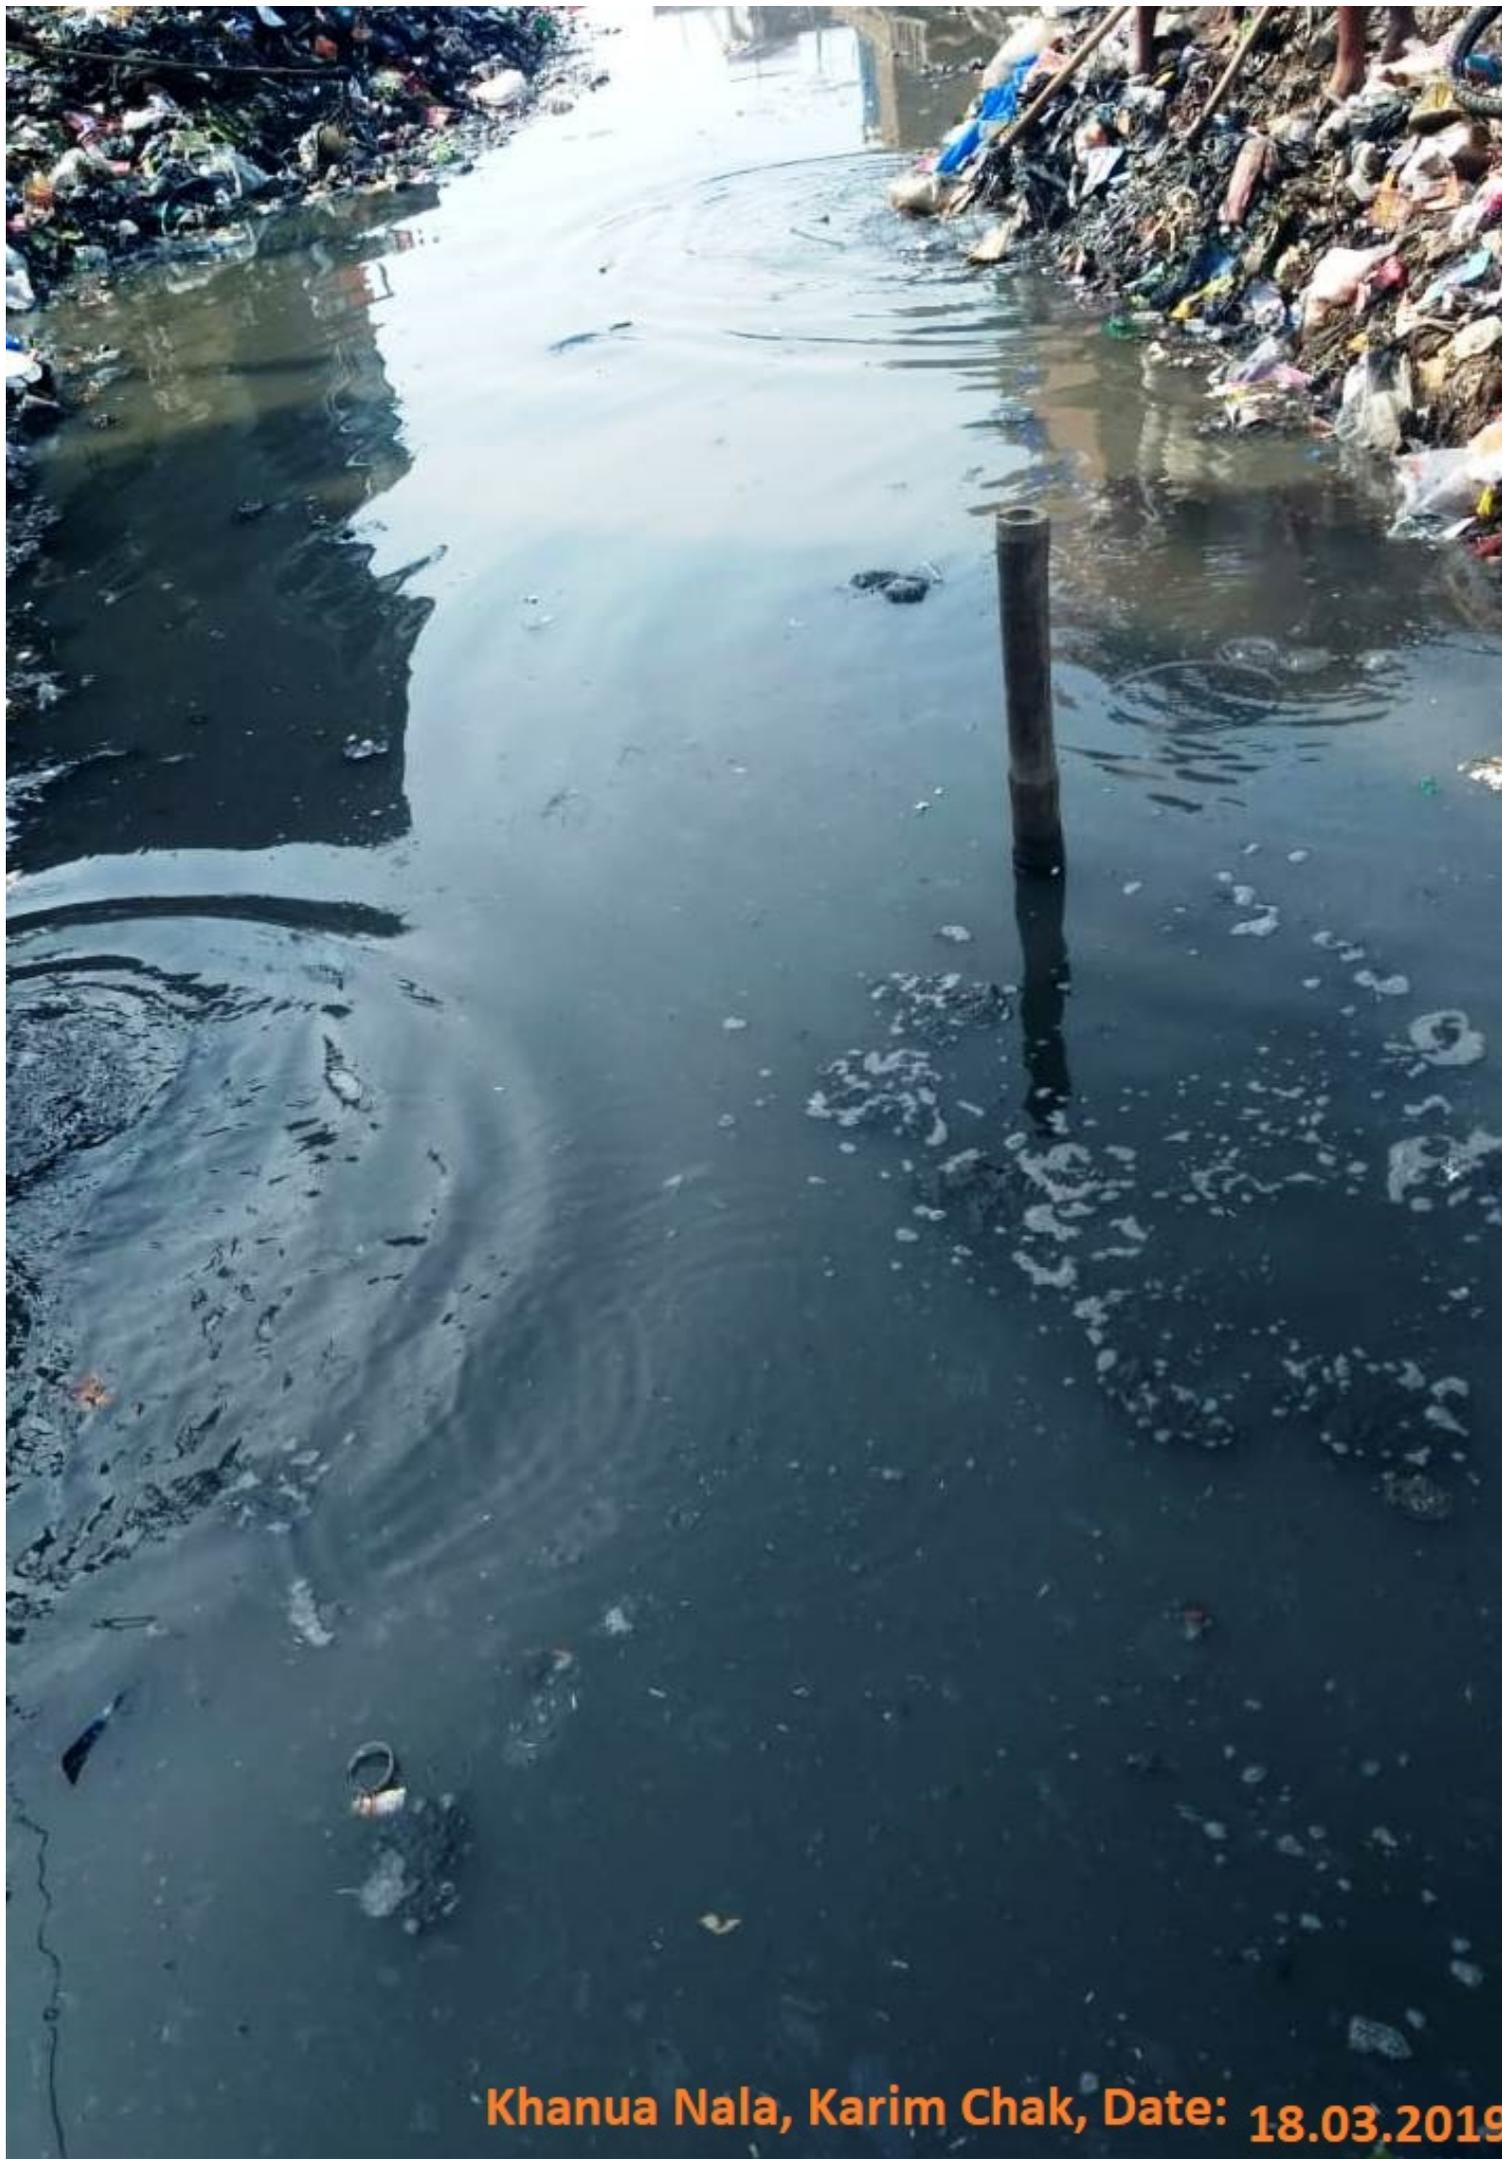

Khanua Nala, Karim Chak, Date: 18.03.2019



Khanua Nala, Sandha D



Khanua Nala, Sandha



Khanua Nala, Karim Chak, Date: 19.03.2019
