

Reply for the Hon'ble NGT writ petition no. 11/2022

- 1- The demarcation report of Govardhan Sagar for survey no. 1281 has been submitted by Sub Divisional Magistrate Ujjain city. The report is enclosed as per **annexure no.-1**. The Collector Ujjain directed to Commissioner Municipal Corporation Ujjain vide their letter no. 1537 dated 02-09-2022 (is enclosed as per **annexure no. – 2**) to remove encroachment in accordance with aforesaid report. The list of encroachment holder is found to be inconclusive over the issue of Guardian, Father name & address. It is concluded for the examination of list from the concerning building officer before going to proceed under Municipal Corporation act & in reference to this acts the necessary action is under procedure.
- 2- Municipal Corporation Ujjain ensured that no solid waste is thrown in the Govardhan Sagar (Water Body/Pond) & around. The letter from Health Officer Municipal Corporation Ujjain is enclosed as per **annexure no. – 3**.
- 3- During the survey of Govardhan Sagar by M/s WAPCOSE Ujjain it was found that the drain from V.D. Cloth Market chamber overflow , Patel Nagar colony drain overflow & open drain from Nagarkot Mata Mandir Fajalpura is being mix with the Govardhan Sagar. For the taping of above three identified nallha, the work of laying of sewerage network around the Govardhan Sagar is being done by M/s Tata Project, Mumbai under Amrut Mission underground sewerage project.
As per work plan given by M/s Tata Project Ltd the work proposed to be completed up to 31-03-2023. The work plan & Govardhan Sagar Map is enclosed as per **annexure no.– 4**.
- 4- The Municipal Corporation Ujjain submit report regarding the compliance in Govardhan Sagar case vide their letter no. 1392 dated 06-09-2022 is enclosed as per **annexure no.- 5**
- 5- Madhya Pradesh Pollution Control Board constitute a committee of three Regional Officers from Regional Office Pithampur, Ujjain & Indore. The joint committee inspection report is enclosed as per **annexure no. 6**
- 6- Collector Ujjain issued the orders for the concerning authority to comply the last passed order from Hon'ble NGT dated 05-05-2022.
- 7- The meeting has been called by collector on dated 30-06-2022 with all concerning officer & Govt. Authorities . The minutes of the meeting are enclosed as per **annexure no. 7**.



(Santosh Tagore)
ADM Ujjain



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन नगर, जिला उज्जैन

क्रमांक/एस.डी.एम. नगर/रीडर-1/2022/1374

उज्जैन, दिनांक:-12/08/2022

प्रति,

अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी महोदय
जिला उज्जैन

विषय :- माननीय हरित न्यायाधिकरण में प्रचलित प्रकरण में सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय हरित न्यायाधिकरण में प्रचलित प्रकरण में कलेक्टर महोदय के द्वारा दिये गये मौखिक निर्देश के पालन में गोरधन सागर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1281 के संबंध में सीमांकन करवाया गया। उक्त संबंध में राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 तहसील उज्जैन से प्राप्त सीमांकन रिपोर्ट अनुसार भूमि की स्थिति निम्नानुसार है- करबा उज्जैन स्थित भूमि मूल सर्वे क्रमांक 1281 खसरे में अभिलिखित कुल रकबा 7.716 हे. में से रकबा 4.560 हे. पर पानी के नीचे, 0.313 हे. पर सडक एवं वाटर वर्क्स तथा 1.150 हे. पर स्थाई एवं अस्थाई निर्माण एवं शेष भूमि रिक्त पाई गई। सीमांकन के दौरान निर्मित स्थाई एवं अस्थाई निर्माणों की सूची तैयार करवाई गई जो पत्र के संलग्न मौका पंचनामा नक्शा अक्स एवं फिल्डबुक, नजरी नक्शा एवं राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन श्रीमान की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न- यथोपरि मूल।

अनुविभागीय अधिकारी,
उज्जैन नगर, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक:-12/08/2022

पृ. क्रमांक/एस.डी.एम. नगर/रीडर-1/2022/1374

प्रतिलिपि-

✓ क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय संभाग उज्जैन की ओर उक्तानुसार सीमांकन रिपोर्ट इत्यादि की छायाप्रतियां सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी,
उज्जैन नगर, जिला उज्जैन

प्रति,

श्री मान अनुविभागीय अधिकारी महोदय

अनुभाग - उज्जैन नगर

जिला - उज्जैन

विषय :- शीमांजन प्रतिवेदन ।

संदर्भ :- श्री मान के कार्यालय का आदेश क्र. 1185 दि. 18-7-22 के पालन में ।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के पालन में कस्बा उज्जैन स्थित भूमि सूच संके क्र. 1281 का शीमांजन गठित एक हार दिनांक 22/7/2022 को पत्तारो नक्शे में दर्ज आकृति अनुसार परीक से शीमांजन दिखा गया ।

शीमांजन के दौरान पाया गया है उक्त भूमि संके क्र. 1281 सर्वे में अभिलिखित कुल रकबा 7.716 हे. में से रकबा 4.560 हे. पर पानी के मोचे, 0.313 हे. पर सड़क रकबा 1.150 हे. पर स्थानिक अस्थायी निगमों से संबंधित भूमि रिक्त पाई गई । शीमांजन के दौरान निम्नलिखित स्थानिक अस्थायी निगमों की सूची तैयार करने हेतु मौजा पत्तारी को निर्दिष्टित किया गया ।

अतः प्रतिवेदन श्री मान को जोर सादर प्रेषित है ।

संलग्न :-

- (1) मौजा पंचनामा
- (2) नक्शा अकस व फील्ड बुक
- (3) नजरी नक्शा

01/15/22
एक 05


18/7/22
मुख्य नि.स. (क.स.)
जिला ब.स. न(ब.स.)

हम पंचनाम व हस्ताक्षर करण-उपयोग के हीदर पंचनामा
 तस्वीर करत है कि श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी उपके
 नगर के अधिकार क्षेत्र 1155 दिनांक 18/07/2022 के फाइन
 में करण-उपयोग की भूमि अर्के छं 1281 (मूल) का सीमाकेन
 वाकित दल द्वारा धरिब पदति की किया गया तथा सीमाकेन
 के दौरान उपर अर्के नगर के अंतर्गत निर्मित श्यामी एम
 अश्यामी निर्माणों की भूमि तस्वीर करनी हेतु मीजा पवारी को
 निर्देशित किया गया। सीमाकेन में 4.560 हे. पानी के नीचे 0.313 हे. अडकल
 वाटर वरम तथा 1.150 हे पर मकान एवं दुकाने तथा शेष भूमि खिल पार्कि गार्ड।

अतः पंचनामा तस्वीर किया गी रही।

दि
 राजेश



17/07/2022
 22/7/2022





प्रति,

श्री मान अनुविभागीय अधिकारी महोदय

अनुभाग - उज्जैन नगर

जिला - उज्जैन

विषय :- सीमांकन प्रतिवेदन ।

संदर्भ :- श्री मान के कायलिय का आदेश क्र. 1185 दि. 18-7-22 के पालन में ।

उपरोक्त विषयात्मक संदर्भित आदेश के पालन में कस्बा उज्जैन स्थित भूमि सूच संवे क्र. 1281 का सीमांकन गठित रूप द्वारा दिनांक 22/7/2022 को पत्तारो नक्शे में दर्ज आकृति अनुसार प्ररीख से सीमांकन दिखा गया ।

सीमांकन के दौरान पाया गया है उक्त भूमि संवे क्र. 1281 रकबा में अभिलिखित कुल रकबा 7.716 हे. में से रकबा 4.560 हे. पर पानी के मोर्चे, 0.393 हे. पर सड़क रकबा वाटर कवर्ज तथा 1.150 हे. अस्थाई रकबा अस्थाई निशानि रकबा भूमि रिक्त पाई गई । सीमांकन के दौरान निर्मित रकबा रकबा अस्थाई निशानियों को सूची तैयार करने हेतु मौजा पत्तारो को निर्देशित दिखा गया ।

अतः प्रतिवेदन श्री मान को जोर सादर प्रेषित है ।



सेलर :-

- (1) मौका पंचनामा
- (2) नक्शा अकस व फील्ड बुक
- (3) नजरो नक्शा


20/7/22
01/11/22
05
..... (पत्तारो)
जिला पत्तारो, प (प.प.)

1281 1281

श्री श्री गुरुदेव गुरुदेव - U.E. नं. - 05-76 सुवर्ण नदी
श्री श्री देव देव 1281

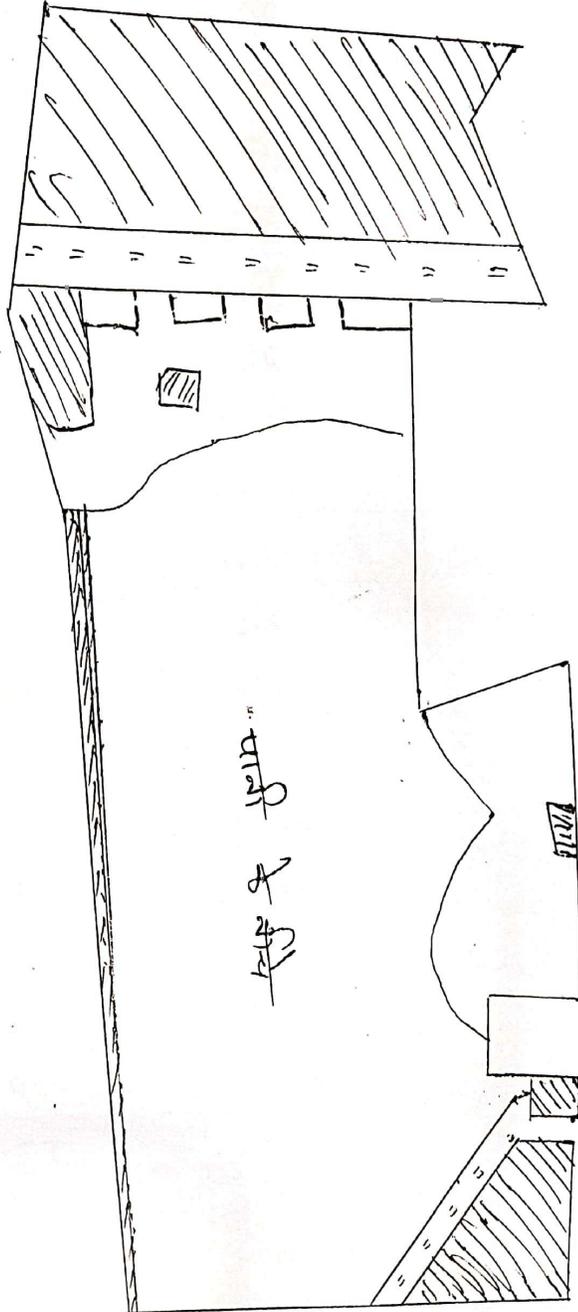

श्री श्री गुरुदेव गुरुदेव 1281 श्री श्री गुरुदेव गुरुदेव
□ → अक्षरों आदि

श्री श्री गुरुदेव गुरुदेव
1281

फिल्ड बुक
खर्च क्र. 1281
ग्राम - कन्नका उज्जैन

बिन्दु	दूरी (जरीब में)
AB	3.90
BC	0.40
CD	2.20
DE	2.90
EF	0.70
FG	1.30
GH	1.30
HI	0.60
IJ	0.30
JK	4.30
KL	2.80
LM	5.70
MN	1.50
NO	0.90
OP	1.20
PQ	0.90
QR	7.60
RS	0.25
ST	0.90
TU	1.50
AT	16.70
	 R. J.
	 R. J.

प्रति ,

श्रीमान तहसीदार महोदय

तहसील उज्जैन नगर

विषय :-मौका जाँच विषयक ।

सन्दर्भ :-कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन नगर जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक /एस .डी.एम. नगर /रीडर -1 /२०२२/1185 उज्जैन दिनांक 18-07-2022

महोदय ,

विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के पालन में लेख है कि माननीय राष्ट्रिय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण के अनुक्रम में कस्बा उज्जैन स्थित मूल भूमि सर्वे क्रमांक १२८१ में स्थित निर्माण चिन्हित करने हेतु आदेशित किया गया था तदनुसार उक्त सर्वे क्रमांक १२८१ में स्थित स्थाई संरचनाओ की सूचि इस पत्र के साथ संलग्न है ।


कस्बा निटवारी
05

प.ह.न. 05

क्रमांक	नाम	पिता /पति	पूर्ण /आंशिक	क्षेत्रफल <वर्ग फीट में>	अन्य विवरण
1	शकुंतला	बाबूलाल यादव	पूर्ण	9*31	
2	लक्ष्मीनारायण पांचाल	तुलसीराम	पूर्ण	13*31	
3	रामचंद्र	तुलसीराम	पूर्ण	17*31	
4	मुरलीधर	बाबूलाल	पूर्ण	10*31	
5	अशोक	बाबूलाल	पूर्ण	10*31	
6	घोट्टू	बाबूलाल	पूर्ण	18*31	
7	मीना यादव	शंकरलाल	पूर्ण	14*31	
8	कुलदीप जायसवाल	बाबूलाल	पूर्ण	38*31	
9	दिलीप	नाथूलाल	पूर्ण	8*30	
10	(i) संतोष	नाथूलाल	पूर्ण	16*30	
	(ii) विनोद	नाथूलाल			
11	दिलीप	नाथूलाल	पूर्ण	60*30	
12	महेशचन्द्र	मांगीलाल शुक्ल	पूर्ण	54*30	
13	दिनेश यादव	--	पूर्ण	14*30	
14	सरस्वती	मिश्रीलाल	पूर्ण	11*30	
15	दुर्गाबाई	बाबूलाल कोशल	पूर्ण	19*30	
16	सुरेश यादव	--	पूर्ण	27*30	
17	मनीष कुमार व्यास	--	पूर्ण	14*30	
18	(i) सीताबाई	बालाप्रसाद	पूर्ण	21*30	
	(ii) दिलीपकुमार	बालाप्रसाद	पूर्ण	--	
19	पुष्पाबाई	राजेंद्र लशकरी	पूर्ण	17*20	
20	जगदीश मालवीय	सिद्धनाथ	पूर्ण	37*24	
21	राजेंद्र जायसवाल	---	पूर्ण	31*58	
22	अनिल	मुन्नालाल जोशी	पूर्ण	9000 वर्गफीट	13800 रिक्त भाग
23	सुनील	रामचंद्र यादव	पूर्ण	2281 वर्गफीट	7900 भाग रिक्त
24	अब्दुल मुख्तलिफ	अब्दुल रहमान	पूर्ण	12*25	वी डी क्लायथ मार्ग
25	राधिका	अमोल झालानी	पूर्ण	12*25	
26	राधिका	अमोल झालानी	पूर्ण	12*25	

Dij
2005

क्रमांक	नाम	पिता /पति	पूर्ण /आंशिक	क्षेत्रफल <वर्ग फीट में>	अन्य विवर
27	राकेश गुप्ता		पूर्ण	12*25	
28	राजेश गुप्ता				
29	किरण	जिनेश कुमार	पूर्ण	12*25	
30	जितेश गोहिल	मिंदूलाल	पूर्ण	12*25	
31	सुशीलकुमार	मनीषकुमार	पूर्ण	12*25	
32	विपुलकुमार	हीरालाल	पूर्ण	12*25	
33	हस्तीमल	राजमल गादिया	पूर्ण	12*25	
34	राजेंद्र कुमार	सरदारमल	पूर्ण	12*25	
35	गोविंदप्रसाद	प्रभुदयाल	पूर्ण	12*25	
36	गोपाल दास	चतुरमल	पूर्ण	12*25	
37	माणकलाल दिलीप कोठारी	चम्पालाल माणकलाल	पूर्ण	12*25	
38	किरणजैन	दिलीप कोठारी	पूर्ण	12*25	
39	रमेश बागवानी		पूर्ण	12*25	
40	कैलाशचंद्र	समरथमल	पूर्ण	12*25	
41	उषा जैन	नरेन्द्रजैन	पूर्ण	12*25	
42	प्रकाशचन्द	मागीलाल माहेश्वरी	पूर्ण	12*25	
43	गोपाल	रामनिवास	पूर्ण	12*25	
44	जयराम जयसिघानी	गोपालदास	पूर्ण	12*25	
45	आशीष कुमार	पूरनमल	पूर्ण	12*25	
46	उमा जयसिघानी	जयराम जयसिघानी	पूर्ण	12*25	
47	ब्रजलाल पलोड		पूर्ण	12*25	
48	प्रशांत	सुभाषचन्द अग्रवाल	पूर्ण	12*25	
49	सुभाषचन्द जैन	शांतिलाल जैन	पूर्ण	12*25	
50	श्रद्धा जैन	विशाल जैन	पूर्ण	12*25	
51	विशाल जैन	महावीर जैन	पूर्ण	12*25	
52	सुनीता जैन	महावीर जैन	पूर्ण	12*25	
53	महावीर जैन	मागीलाल जैन	पूर्ण	12*25	
54	नारायण दास	सेवकराम	पूर्ण	12*25	
55	पूजाजैन	वैभव जैन	पूर्ण	12*25	
56	दिनेश भावसार		पूर्ण	12*25	
57	दुर्गा	नारायणदास	पूर्ण	12*25	
58	पीरूलाल कोचर	राजमल कोचर	पूर्ण	12*25	
59	राजकुमार	हिम्मतलाल अचलिया	पूर्ण	12*25	

Signature
1/1/2019

60	उषा	ज्ञानचन्द कोचर	पूर्ण	12*25
61	मनीष कोठारी		पूर्ण	12*25
62	महावीर कुमार	गेंदालाल	पूर्ण	12*25
63	मो.उस्मान	जहूर अहमद	पूर्ण	12*25
64	मो.इमरान	मो. शरीफ	पूर्ण	12*25
65	अजय कुमार जैन	सबमरमल जैन	पूर्ण	12*25
66	अ. हमिद	निसार मोहम्मद	पूर्ण	12*25
67	खेरनिसा	मंजूर अहमद	पूर्ण	12*25
68	राजकुमार	आनंदीलाल	पूर्ण	12*25
69	सुनील	हस्तीमल गादीया	पूर्ण	12*25
70	रमेश चन्द्र	राकेश कुमार	पूर्ण	12*25
71	पंकज परमार	मनोहर परमार	पूर्ण	12*25
72	सुशीला	महेंद्र जैन	पूर्ण	12*25
73	शसुशीला	महेंद्र जैन	पूर्ण	12*25
74	रितेश आहूजा	जवाहर आहूजा	पूर्ण	12*25
75	सुमित आहूजा	जवाहर आहूजा	पूर्ण	12*25
76	भागवंतीबाई	ओमप्रकाश तिवारी	आंशिक	700 वर्गफीट
77	शंकरलाल जायसवाल	कन्हैयालाल	आंशिक	21*15
78	राजेश	बालकिशन	पूर्ण	33*25
79	ममताबाई	रामप्रकाश बाथम	पूर्ण	9*25
80	जगदीश बाथम		पूर्ण	12*9
81	यूसूफ	मासूम अली तेजकुवरपतिरामप्रसाद	पूर्ण	24*14.7
82	सुन्दरलाल	नंदराम	पूर्ण	20*32
83	राजेंद्र	कैलाश	पूर्ण	17*12
84	कैलाश	नंदराम	पूर्ण	19*20
85	राजेंद्र मकवाना	--	आंशिक	48*7.5
86	भागीरथ	मादू जी	पूर्ण	15*25
87	संजय यादव दुर्गाबाई	नारायण यादव	पूर्ण	39*14
88	रंजना	कैलाशचन्द	पूर्ण	19*28
89	मागीलाल	हल्का जी	पूर्ण	14.4*55
90	रेशमबाई	कन्हैयालाल	पूर्ण	15*20
91	ताराबाई	रामप्रसाद	पूर्ण	15*20

नोट:- 1.उपरोक्त सूचि मोक़े पर उपस्थित लोगो द्वारा बताए अनुमार बनाई गई है।

2.रकबा 0.313 हे .भूमि पर मोक़े पर सडक एवं वाटर वर्क्स कार्यालय स्थित है।

Signature

क्रमांक	नाम	पिता /पति	पूर्ण /आंशिक	क्षेत्रफल <वर्ग फीट में>	अन्य विवरण
1	मूलचंद यादव		आंशिक	400 वर्गफीट	
2	चेरिटेबल ट्रस्ट	--	आंशिक	600 वर्गफीट	
3	रामरतीबाई	रूपसिंह	आंशिक	26*10	
4	जे के सक्सेना आभा	जितेन्द्र	आंशिक	22*40*11	
5	जितेन्द्र	गोविन्दसिंह	आंशिक	15*17	
6	शंकरसिंह	देवेन्द्रसिंह	आंशिक	16*16	
7	मथुरालाल शास्त्री		आंशिक	24.5*10	
8	संजय तिवारी		आंशिक	15*17	
9	आशा खगार	सुरेश खगार	आंशिक	22.6*28	

नोट:- उपरोक्त सूचि मोकें पर उपस्थित लोगी द्वारा बताए अनुसार बनाई गई

[Handwritten Signature]
25/05

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन (म.प्र.)

क्रमांक - / एडीएम/रीडर/2022/
प्रति, 1537

उज्जैन दिनांक - 02/09/2022

आयुक्त
नगर पालिक निगम
उज्जैन

विषय - माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2022 (बाकिर अली रंगवाला विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 को पारित आदेश के पालन में कार्यवाही की जानें के संबंध में।

- संदर्भ -1- कलेक्टर जिला उज्जैन का कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक 995/2022 उज्जैन दिनांक 04.08.2022
2- अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन नगर जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 1374 दिनांक 12.08.2022

—000—

कृपया संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न है, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2022 (बाकिर अली रंगवाला विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 को पारित आदेश के पालन में संदर्भित कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक- 1 द्वारा विन्दु क्रमांक -1 में - "माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विधि के अनुक्रम में गोवर्धन सागर से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतिक्रमण का चिन्हांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन द्वारा किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा की जावेगी।"

संदर्भित पत्र क्रमांक-2 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन द्वारा अवगत कराया है कि हरित न्यायाधिकरण में प्रचलित प्रकरण में कलेक्टर महोदय के द्वारा दिये गये मौखिक निर्देश के पालन में गोवर्धन सागर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1281 के संबंध में सीमांकन करवाया गया। उक्त संबंध में राजस्व निरीक्षक वृत्त -1 तहसील उज्जैन से प्राप्त सीमांकन रिपोर्ट अनुसार भूमि की स्थिति निम्नानुसार है- करवा उज्जैन स्थित भूमि गूल सर्वे क्रमांक 1281 खसरे में अभिलिखित कुल रकबा 7.716 हे. में से रकबा 4.560 हे पर पानी के नीचे 0.313 हे0 पर सड़क एवं वाटर वर्क्स तथा 1.150 हे0 पर स्थाई एवं अस्थायी निर्माण एवं शेष भूमि रिक्त पाई गई। सीमांकन के दौरान निर्मित स्थाई एवं अस्थायी निर्माणों की सूची तैयार करवाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः संदर्भित कार्यवाही पत्र क्रमांक-1 के अनुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2022 (बाकिर अली रंगवाला विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 को पारित आदेश के पालन में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही आपके द्वारा की जाना है। अतः आप रुद्रसागर बुधवारिया जिला उज्जैन से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा आदेशित)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला उज्जैन

पृ० क्रमांक - 1537 / एडीएम/रीडर/2022/

उज्जैन दिनांक - 02 / 09 / 2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, गृह/संस्कृति, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त उज्जैन संगम उज्जैन।
3. पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेंज उज्जैन।
4. पुलिस अधीक्षक, उज्जैन।
5. अपर कलेक्टर जिला उज्जैन।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उज्जैन।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उज्जैन नगर।
8. क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी जिला उज्जैन।
9. निज सचिव, स्टेनों शाखा कलेक्ट्रेट, जिला उज्जैन।


अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला उज्जैन

कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन
(Municipal Corporation Ujjain)

स्वच्छताशिववाजी भवन आगर रोड उज्जैन
टेली 0734 2535220
E-mail: nn.ujjain@mpurban.gov.in

क्रमांक - 771

उज्जैन दिनांक - 6-4-2022


पति

अधीक्षण यंत्री
नगर पालिक निगम उज्जैन

विषय - माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2022 (वाकिर अली रंगवाला विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 को पारित आदेश के पालन में कार्यवाही की जाने के संबंध में।
संदर्भ :- आपके द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देश के क्रम में।

--00--

विषयांकित क्रम में लेख है कि वर्तमान स्थिति में गोवर्धन सागर में किसी भी प्रकार सॉलिड वेस्ट नहीं जा रहा है।
अतः उपरोक्त क्रम में रिपोर्ट आपकी ओर सादर सूचनार्थ प्रस्तुत है।


स्वास्थ्य अधिकारी
(झान क्र. 2)
नगर पालिक निगम उज्जैन



TPL/C&E/UJJAIN/1132

30th May 2022

The Resident Engineer
PDMC Amrut,
WAPCOS Limited
Ujjain (M.P.)

1421
4/06/22

Project: - Survey, Investigation, Design, Construction, Testing & Commissioning of Sewerage Network and Sewage Treatment for Ujjain City under Ujjain Municipal Corporation.

Subject: Regarding submission of Work programme for completion of balance works.
Ref:

1. LoA No. AMRUT/506; dated 26th Oct-2017
2. Agreement Number: AMRUT/525; dated 07th Nov-2017
3. TPL/C&E/UJJAIN/1096 dated 09-05-2022
4. WAPCOS letter no. WAPCOS/Amrut/Ujjain/16/1743 dated 17-05-2022.
5. TPL/C&E/UJJAIN/1119 dated 20-05-2022.
6. WAPCOS letter no. WAPCOS/Amrut/Ujjain/16/1753 dated 21-05-2022.

Dear Sir,

In reference to the subject matter and references, as per your instructions from your good office, we would like to submit the compressed work programme for the balance works.

In this regards, your kind cooperation, coordination will be appreciable as well as will lead the project towards a better accomplishment with an embattled success.

Thanking and assuring you of our best services at all times.

For TATA Projects Limited

Satish Kr. Jha
(Satish Kr. Jha)
Residential Construction Manager
Ujjain Sewerage Network & STP

Encl: Balance Work Programme

CC:

1. The Commissioner, Ujjain Municipal Corporation - FYIP
2. The Superintending Engineer AMRUT Project, Ujjain - FYIP
3. The Executive Engineer, AMRUT Project, Ujjain- FYIP

TATA PROJECTS LIMITED

Registered Office : "Mithuna Towers-1" 1-7-80 to 87 Prenderghast Road, Secunderabad - 500 003, Telangana, India

Phone : +91-40-6623 8801, Fax : 6617 2535

CIN : U45203TG1979PLC057431 e-mail : tpi@tataprojects.com www.tataprojects.com

Item No.	Description	Start	Finish	Duration
1	Urbain Sewerage Network Project	1327 days	Fri 02-03-18	Fri 31-03-23
Zone - 9				
2	Excavation	990 days	Mon 17-09-18	Thu 30-06-22
3	Network Pipe Laying	980 days	Mon 17-09-18	Thu 16-06-22
4	Manhole Installation	979 days	Tue 18-09-18	Thu 16-06-22
5	HSC Connection with IC Installation	969 days	Thu 04-10-18	Sat 18-06-22
6	HSC Connection with IC Installation	977 days	Thu 04-10-18	Thu 30-06-22
Zone - 8				
7	Road Restoration	970 days	Mon 15-10-18	Thu 30-06-22
8	Excavation	955 days	Mon 05-11-18	Thu 30-06-22
9	Network Pipe Laying	945 days	Mon 05-11-18	Thu 16-06-22
10	Manhole Installation	944 days	Tue 06-11-18	Thu 16-06-22
11	HSC Connection with IC Installation	934 days	Thu 22-11-18	Sat 18-06-22
12	HSC Connection with IC Installation	942 days	Thu 22-11-18	Thu 30-06-22
Zone - 7				
13	Road Restoration	935 days	Mon 03-12-18	Thu 30-06-22
14	Excavation	1162 days	Sun 21-10-18	Fri 31-03-23
15	Network Pipe Laying	1152 days	Sun 21-10-18	Fri 17-03-23
16	Manhole Installation	1150 days	Tue 23-10-18	Fri 17-03-23
17	HSC Connection with IC Installation	1139 days	Thu 08-11-18	Sun 19-03-23
18	HSC Connection with IC Installation	1148 days	Thu 08-11-18	Fri 31-03-23
Zone - 6				
19	Road Restoration	1141 days	Mon 19-11-18	Fri 31-03-23
20	Excavation	881 days	Mon 18-11-19	Fri 31-03-23
21	Network Pipe Laying	871 days	Mon 18-11-19	Fri 17-03-23
22	Manhole Installation	870 days	Tue 19-11-19	Fri 17-03-23
23	HSC Connection with IC Installation	859 days	Thu 05-12-19	Sun 19-03-23
24	HSC Connection with IC Installation	868 days	Thu 05-12-19	Fri 31-03-23
Zone - 5				
25	Road Restoration	860 days	Tue 17-12-19	Fri 31-03-23
26	Excavation	909 days	Wed 09-10-19	Fri 31-03-23
27	Network Pipe Laying	899 days	Wed 09-10-19	Fri 17-03-23
28	Manhole Installation	898 days	Thu 10-10-19	Fri 17-03-23
29	HSC Connection with IC Installation	887 days	Mon 28-10-19	Sun 19-03-23
30	HSC Connection with IC Installation	896 days	Mon 28-10-19	Fri 31-03-23
Zone - 4				
31	Road Restoration	880 days	Wed 06-11-19	Fri 31-03-23
32	Excavation	775 days	Sun 15-12-19	Wed 30-11-22
33	Network Pipe Laying	765 days	Sun 15-12-19	Wed 16-11-22
34	Manhole Installation	763 days	Tue 17-12-19	Wed 16-11-22
35	HSC Connection with IC Installation	753 days	Thu 02-01-20	Fri 18-11-22
36	HSC Connection with IC Installation	761 days	Thu 02-01-20	Wed 30-11-22

Urbain Sewerage Network Project
 23-05-23



Project Summary
 Inactive Tax
 Inactive Mileage


Monthly Sum
 Monthly Sum
 Monthly Sum

20
 20

Sl. No.	Activity	Duration	Start	End
37	Road Restoration	754 days	Mon 13-01-20	Wed 30-11-22
38	Zone - 3	701 days	Tue 28-04-20	Sat 31-12-22
39	Excavation	691 days	Tue 28-04-20	Sat 17-12-22
40	Network Pipe Laying	690 days	Wed 29-04-20	Sat 17-12-22
41	Manhole Installation	678 days	Fri 15-05-20	Mon 19-12-22
42	HSC Connection with IC Installation	688 days	Fri 15-05-20	Sat 11-12-22
43	Road Restoration	681 days	Tue 26-05-20	Sat 11-12-22
44	Zone - 2	592 days	Sat 27-06-20	Fri 30-09-22
45	Excavation	538 days	Sat 27-06-20	Sun 17-07-22
46	Network Pipe Laying	536 days	Tue 30-06-20	Sun 17-07-22
47	Manhole Installation	525 days	Thu 16-07-20	Tue 19-07-22
48	HSC Connection with IC Installation	534 days	Thu 16-07-20	Sun 31-07-22
49	Road Restoration	527 days	Mon 27-07-20	Sun 31-07-22
50	Zone - 1	593 days	Fri 25-09-20	Sat 31-12-22
51	Excavation	473 days	Fri 25-09-20	Sun 17-07-22
52	Network Pipe Laying	472 days	Mon 28-09-20	Sun 17-07-22
53	Manhole Installation	461 days	Wed 14-10-20	Tue 19-07-22
54	HSC Connection with IC Installation	470 days	Wed 14-10-20	Sun 31-07-22
55	Road Restoration	463 days	Fri 23-10-20	Sun 31-07-22
56	Trunk Main	841 days	Tue 15-10-19	Sat 31-12-22
57	STP	1131 days	Fri 02-03-18	Thu 30-06-22
58	STP & Allied Structures	1131 days	Fri 02-03-18	Thu 30-06-22
59	MPS with operation	929 days	Mon 13-05-19	Wed 30-11-22
60	Rising Main NS Pipe Line	831 days	Mon 13-05-19	Fri 15-07-22
61	MPS Structural & Allied Works	810 days	Fri 25-10-19	Wed 30-11-22



Handwritten signature and date: 20/07/2020

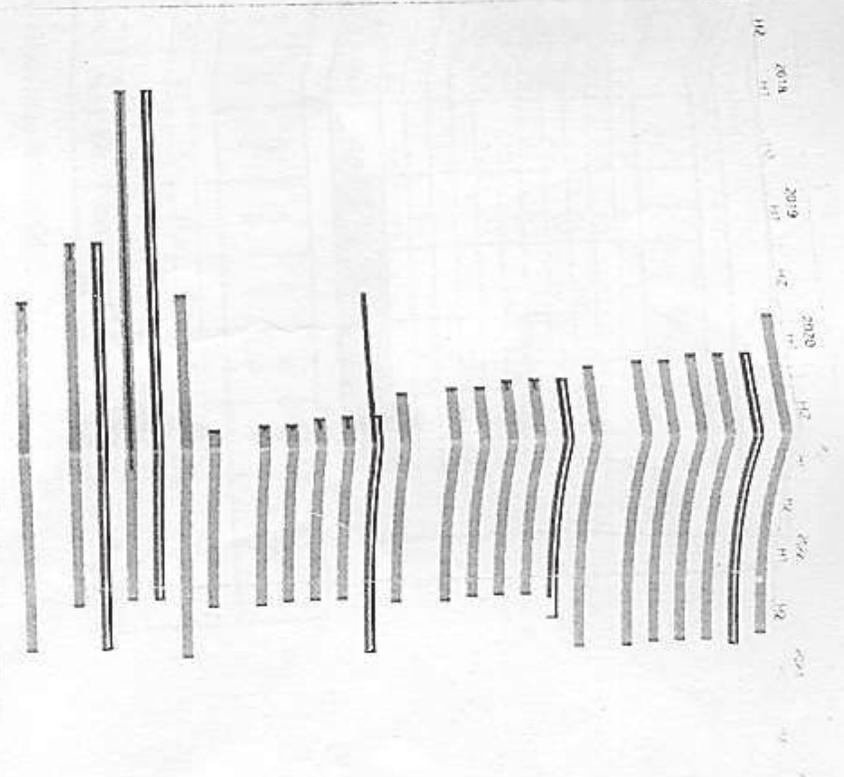

L-2 Zone wise Complet
23-05-22

Task: Site
Milestone: Summary

Project Summary
Inactive Task
Inaction/Milestone
Inaction Summary

Manual Task
Duration
Start/End
2


Page 2



Tata Projects Limited												
Main Sewerage Network & STP Project												
Sl. No.	Description of Work	22 Jul	22 Aug	22 Sep	22 Oct	22 Nov	22 Dec	Jan 23	Feb 23	Mar 23		
1	Pipe Supply	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
2	Pipe Laying	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3	Manhole Construction	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
4	Excavation	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
5	Road Restoration	1.0	1.0	1.0	1.5	4.6	5.8	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
6	Lack Pushing	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
7	MFP Construction	2.0	1.3	0.8	0.8	1.8	2.1	2.1	2.6	2.3	0.5	0.5
8	Rising Main	0.1	-	-	1.8	4.2	7.2	5.2	-	-	-	-
9	STP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	STP Supply	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-
11	Substation	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-	-	-	-
Cumulative Proposed Sales (In Crs.) =		4.6	3.9	3.7	13.2	18.6	29.4	29.9	29.2	26.1	13.2	

Type of Sales	ITD Sales	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Oct 22	Nov 22	Dec 22	Jan 23	Feb 23	Mar 23
Monthly Sales (In Crs.)	196.2	4.6	3.9	3.7	13.2	18.6	29.4	29.9	29.2	26.1	13.2
Withhold Cumulative (In Crs.)	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cumulative Sales to Completion (In Crs.)	217.2	221.8	225.8	229.5	242.7	261.3	290.7	320.6	349.8	375.9	389.1


Monthly Invoice Plan & S-Curve

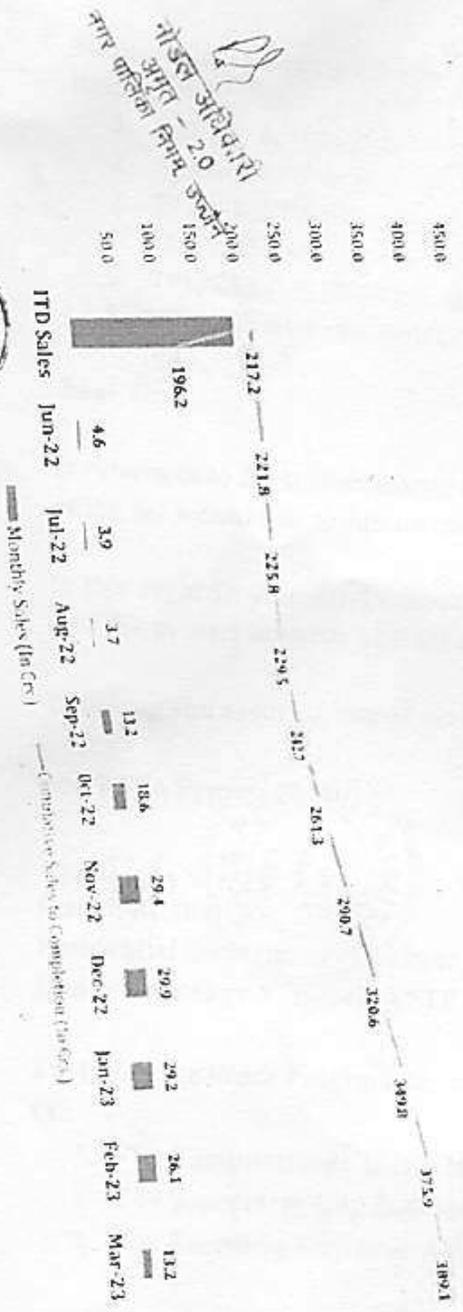

नोडल अधिकारी
 आर - 20
 आर मंडल आर उदाहरण



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

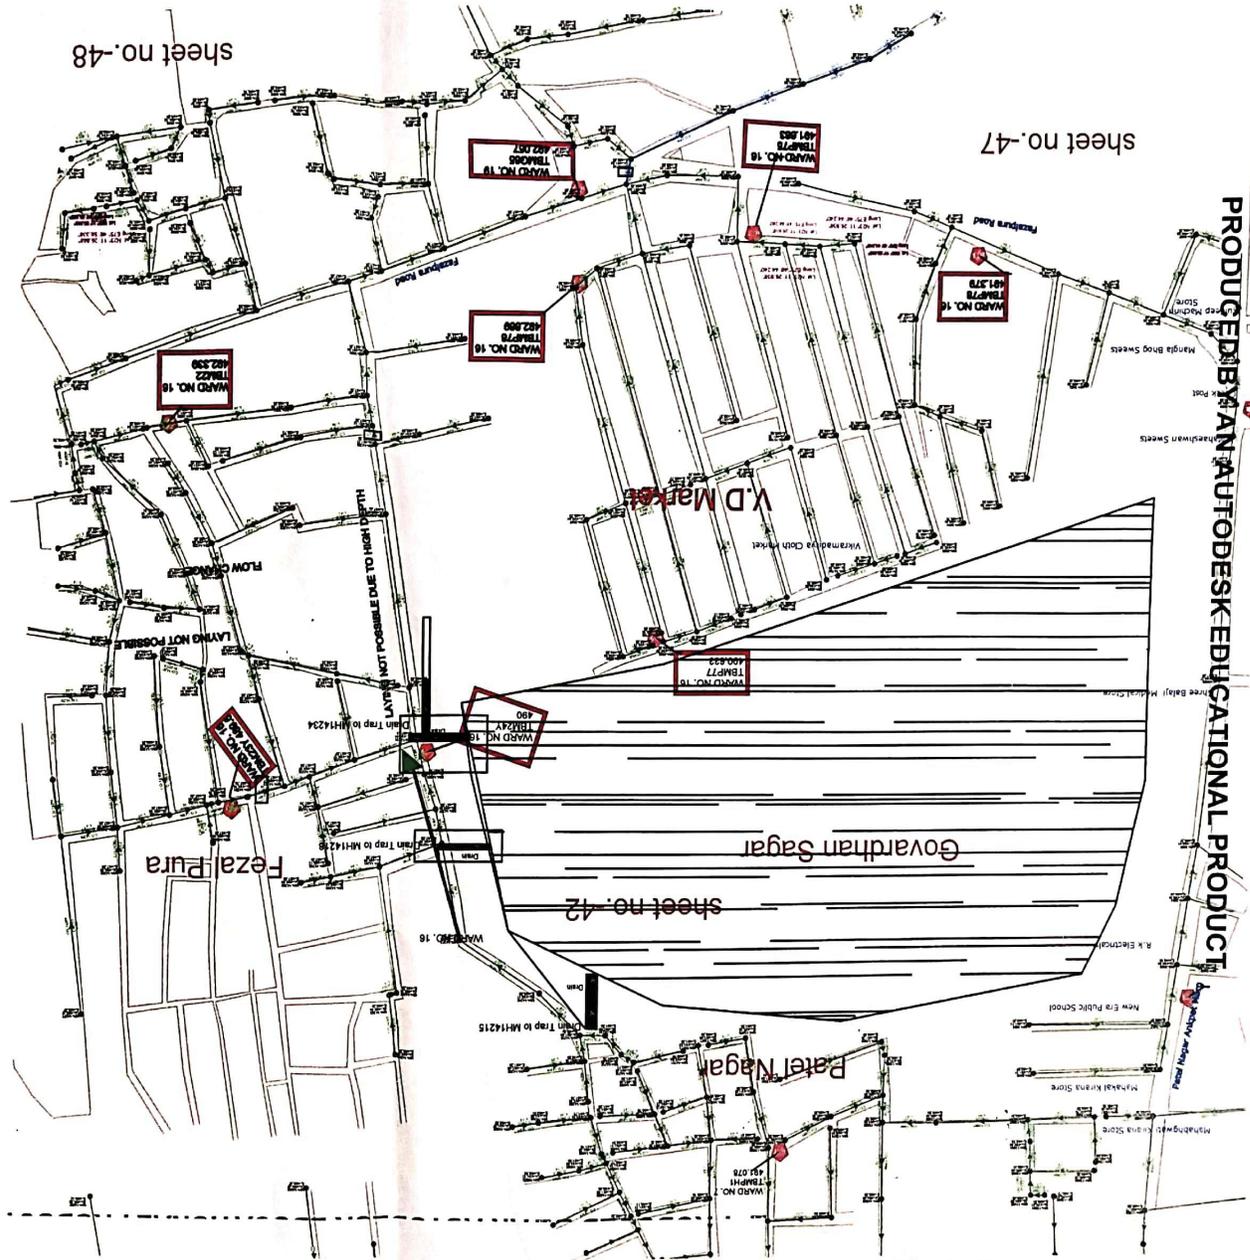

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन
(Municipal Corporation Ujjain)

छवतिशिवाजी भवन आगर रोड उज्जैन
टेली. 0734 2535220
E-mail: nn.ujjain@mpurban.gov.in

क्रमांक:- 1392

उज्जैन दिनांक:- 06/09/2022

प्रति,

अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी
जिला उज्जैन


विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2022 (वाकिर अली रंगवाला विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 को पारित आदेश के पालन में कार्यवाही की जाने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 1537/एडीएम/रीडर/2022 उज्जैन दिनांक 02.09.2022।

---00---

विषयांकित एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि वांछित प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


आयुक्त
नगर पालिक निगम उज्जैन

प्रतिवेदन

1. दिन्दि क्रमांक 1 के संबंध में लेख है कि वर्तमान में गोवर्धन सागर में किसी भी प्रकार सॉलिड वेस्ट नहीं जा रहा है। इस संबंध में संबंधित डोन के स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट संलग्न है।
2. दिन्दि क्रमांक 2 के संबंध में लेख है कि गेरारा वाफ़ोस उज्जैन से विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया था। गोवर्धन सागर में निम्नानुसार तीन स्थानों से पानी आ रहा है :-
 - (1) वी.डी. क्लाय मार्केट के चेम्बर का ओवर फ्लो।
 - (2) पटेल नगर कालोनी के निस्तार के पानी का ओवर फ्लो।
 - (3) नगर कोट माता मंदिर, फाजलपुरा से आने वाली ओपन ड्रेन।

उक्त तीनों स्थानों से आने वाले पानी को टेपिंग करने हेतु अमृत मिशन के अंतर्गत अण्डरग्राउण्ड सीवरेज परियोजना अंतर्गत गोवर्धन सागर के चारों ओर सीवरेज नेटवर्क विछाने का कार्य वर्तमान में मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड मुम्बई द्वारा कराया जा रहा है, उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा दिये गये वर्क प्लान अनुसार कार्य पूर्णता की प्रस्तावित तिथि 31.03.2023 निर्धारित है। (वर्क प्लान एवं गोवर्धन सागर का मानचित्र संलग्न है)

3. दिन्दि क्रमांक 3 के संबंध में लेख है कि सर्वे क्र. 1281 (गोवर्धन सागर) की भूमि पर स्थित निर्माण चिह्नित कर रथाई/अरथाई अतिक्रमण की सूची दिनांक 06.09.2022 को कार्यालय में प्राप्त हुई है, जिसमें अतिक्रमणकर्ताओं के नाम दिये गये हैं एवं कहीं-कहीं नाम के सामने वल्दीयत का भी उल्लेख नहीं है, तथा पते स्पष्ट नहीं हैं। सूची का परीक्षण संबंधित भवन अधिकारी से कराया जाकर नगर निगम अधिनियम के अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।


कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम उज्जैन


अधीक्षण यंत्री
नगर पालिक निगम उज्जैन

"Joint Committee Inspection Report in the matter of "Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh"


Hon'ble NGT (CZ) , Bhopal vide its order dated 5-5-2022 in in original application no. 11/2022 in the matter of "Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh" directed under point no. 42 as .

- 1- The Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board is directed to constitute a Committee of three Regional Officers including the Regional Officer of Ujjain to implement the rule of law and enforce the environmental laws and to ensure that there shall not be any discharge of untreated water into the water bodies and there shall not be any discharge of solid waste into the water bodies as narrated above. In case of encroachment or discharge of solid waste or liquid waste in violation of Environment rules necessary action, prosecution in addition to the realization of environmental compensation must be initiated in accordance with the environmental rules.
- 2- In compliance with the above Hon'ble NGT order Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board constitute a joint committee of Regional Officer of Ujjain , Indore & Pithampur by letter no. 1698 dated 13-05-2022.
- 3- The joint committee visited Govardhan Sagar on dated 23-06-2022. The joint committee comprise of following officers.
 1. Shri Kantilal Choudhary, Regional Officer, Pithampur
 2. Shri Hemant Kumar Tiwari, Regional Officer, Ujjain
 3. Shri Shrinivas Dwivedi, Regional Officer, IndoreFinding by joint committee during visit are as follows:
 - a. No solid waste was observed in Govardhan Sagar Pond however Municipal Solid waste & water hypocinth was found lying on the boundary of pond in Charitable Hospital side . The work to remove deposited & dried hypocinth will be done by Municipal Corporation Ujjain as earliest.

Continue.....2

//2//


- b. In rainy season drain carrying domestic waste water may come into the pond. Similarly in case of failure of pump of Vikramaditya Cloth Market main sump the waste water overflow may meet pond water.
- c. Tehsildar Ujjain city is directed to remove encroachment as per Hon`able NGT order within stipulated time vide Collector Office letter no. 577 dated 17/06/2022.
- d. Photographs taken during visit are enclosed as per Annexure No. -1



(Shrinivas Dwivedi)
Regional Officer,
Indore



(Hemant Kumar Tiwari)
Regional Officer,
Ujjain



(Kantilal Choudhary)
Regional Officer,
Pithampur





Ujjain, Madhya Pradesh, India

5QVG+9XC, Ujjain Jaora Rd, Patel Nagar, Ujjain, Madhya Pradesh 456006, India
Lat 23.193256°
Long 75.777234°
23/06/22 05:09 PM

 GPS Map Camera

कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन (म.प्र.)

क्रमांक-

/2022

उज्जैन, दिनांक-

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2022 (वाकिर अली रंगवाला विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 05.05.2022 को पारित आदेश के पालनार्थ की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में दिनांक 30.06.2022 को संपन्न बैठक का कार्यवाही विवरण।

--00--

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2022 (वाकिर अली रंगवाला विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 05.05.2022 को पारित आदेश के पालनार्थ की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में दिनांक 30.06.2022 गुरुवार को संबंधित विभागों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए।

1. श्री अविप्रसाद, अपर कलेक्टर उज्जैन,
2. श्री संतोष टेंगोर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, उज्जैन
3. श्री संजीव साहु, अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) नगर उज्जैन
4. श्री आदित्य नागर, अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन
5. श्री जी के कंटिल, अधीक्षण यंत्री, नगर पालिक निगम, उज्जैन
6. श्री एच. के. तिवारी, क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2022 (वाकिर अली रंगवाला विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 05.05.2022 को पारित आदेश के पालनार्थ की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में उपस्थित अधिकारियों को चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्देशित किया गया।

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विधि के अनुक्रम में गोवर्धन सागर से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निर्देश दिया गया है। अतिक्रमण का चिन्हांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन द्वारा किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नगरपालिक निगम उज्जैन द्वारा की जायेगी।

(कार्यवाही - आयुक्त, उज्जैन नगरपालिक निगम, उज्जैन एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) नगर उज्जैन)

2. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2022 में पारित आदेश में उल्लेखानुसार Municipal Corporation द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि That no solid waste should be thrown in the pond & There shall not be any discharge of untreated sewage water in to the water body/pond के संबंध में Action Taken Report & Remedial Measures समय सीमा में प्रस्तुत की जावें।

(कार्यवाही - आयुक्त, उज्जैन नगरपालिक निगम, उज्जैन)

निर.....2

//2//

3. विक्रमादित्य क्लथ मार्केट उज्जैन से उत्पन्न घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना पीपीपी मॉडल के तहत की जावे।

(कार्यवाही - आयुक्त, उज्जैन नगरपालिक निगम, उज्जैन)

4. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2022 में पारित आदेश में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित कार्यवाही समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही - क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन)

(आशीष सिंह)

कलेक्टर,

जिला उज्जैन

क्रमांक- 995 / 2022
प्रतिलिपि :-

उज्जैन, दिनांक- 4/8/22

1. आयुक्त, उज्जैन नगरपालिक निगम, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री अविप्रसाद, अपर कलेक्टर उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री संतोष टैगोर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री संजीव साहु, अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) नगर उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्री एच. कं. तिवारी, क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कलेक्टर)

जिला उज्जैन
