Writ Petition No. 4436(M/B)-2003

Volume - III
INDEX

Sl No.	Description of Paper	Dt.	Page No.
42	Affidavit of S.K. Singh, Nagar Ayukt, Nagar Nigam, Lko. in compliance of order dated 30.04.2008	22.05.2008	1049-1055
43	Affidavit of Sri S. S. Mishra, Secretary LDA, Lucknow in compliance of Hon'ble Court's order dated 30.04.2008	22.05.2008	1056-1064
44	Compliance of order dated 30.04.2008 on oath by D. K. Sharma, G. M., Lucknow Jal Sansthan	22.5.2008	1065-1069
45	Affidavit of Department of Urban Development in compliance of Hon'ble Court's order dated 30.04.2008	22.5.2008	1070-1138
46	Affidavit on behalf of Nagar Nigam in compliance of hon'ble Court's order dated 22.05.2008	22.5.208	1139-1161
47	Affidavit of Department of Urban Development in compliance of Hon'ble Court's order dated 22.05.2008	21.7.2008	1162-1184
48	Affidavit on behalf of Jal Sansthan, Lucknow in compliance of Hon'ble Court's order dated 22.05.2008	21.7.2008	1185-1198
49	Affidavit on behalf of Jal Nigam in compliance of Hon'ble Court's order dated 22.05.2008	21.7.2008	1199-1230
50	Objection against the second option for development of the park	25.8.2008	1231-1236
51	Affidavit of Brikeshwar Tiwari, General Secretary of Gomti Nagar Jan Kalyan Maha Samiti	25.8.2008	1237-1239
52	Affidavit on behalf of Jal Sansthan, Lucknow in	25.8.2008	1240-1255

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

	compliance of order dated 21.07.2008		
53	Affidavit on behalf of Nagar Nigam, Lucknow in compliance of Hon'ble Court's order dated 21.07.2008	25.8.2008	1256-1310
54	Affidavit of department of Urban Development in compliance of Hon'ble Court's order dated 21.07.2008	25.8.2008	1312-1343
55	Affidavit on behalf of UP Jal Nigam in compliance of order dated 21.07.2008	25.8.2022	1344-1360
56	Affidavit of Department of Urban Development in compliance of Hon'ble Court's order dated 25.08.2008	16.10.2008	1361-1391
57	Affidavit on behalf of Nagar Nigam, Lucknow in compliance of Hon'ble Court's order dated 25.08.2008	16.10.2008	1392-1402
58	Affidavit on behalf of Jal Sansthan, Lucknow in compliance of order dated 25.08.2008	16.10.2008	1403-1411
59	Affidavit on behalf of UP Jal Nigam in compliance of order dated 25.08.2008	16.10.2008	1412-1454

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

therefore, he has proposed that over that plot beautification can be done by laying down a park."

3. That on the basis of the said statement this Hon'ble Court was pleased to pass an order that -

"The aforesaid matter requires an expert and, therefore, the parties' counsel say that the L.T.R.C. along with officers of U.P. Pollution Control Board be requisted to make an inspection of the site and submit its report as to whether it is necessary to remove the garbage and if not, the effect of the same on the water of the river and all such factors shall be mentioned in the report. The aforesaid team shall consider all aspects of having the water of river Gomti cleaned and shall also propose ways and means for the purpose. This report shall be submitted before the Court within three weeks.

We also find it expedient to ask the respondents to submit the report regarding the work already undertaken for cleaning of river Gomti, for Sewage Treatment Plant Project, Boring Projects and Third Water Works Project, the amount so far sanctioned and released, and the work done till date."

4. That in compliance of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 30.4.2008 the present affidavit is being filed thereby mentioning the steps taken at the end of Nagar Nigam, Lucknow.

30.4.2008 the deponent issued a letter No.D-122/MC/AMC-1/08 dated 16.5.2008 addressed to the Director I.T.R.C. Lucknow and to the Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow thereby offering its support for formulation of the report. A photocopy of said letter dated 30.4.2008 along with its Fax Receipts are cumulatively annexed herewith as Annexure No.1 to this affidavit.

6. That thereafter in compliance of the said order a Joint Committee was formed by I.T.R.C., Lucknow and U.P. pollution Control Board, Lucknow which visited the site i.e. near Gandhi Setu on the banks of Gomti River on 17.5.2008 along with officers of Nagar Nigam, Lucknow.

7. That the said report at the end of the said authorities is awaited and the deponent further undertakes to ~~xxxxx~~ provide complete information and assistance to this Hon'ble Court and also to the expert committee as and when required.

8. That from the narration made herein above, it is established that the Nagar Nigam, Lucknow has taken all relevant steps in compliance of order dated 30.4.2008 passed by this Hon'ble Court, and the deponent further undertakes that he will carry out every direction that is issued by this Hon'ble Court from time to time.

Lucknow.

Dated: 22.05 , 2008

Deponent

1052 962 4

(4)

Verification

I, the abovamed deponent do hereby verify that the contents of paras 1 to 8 of this affidavit are true to my personal knowledge. No partof it is false and nothing material has been concealed, so help me God.

Lucknow

Dated: 22/5, 2008

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me on 22/5/08 at 11.30 a.m./p.m. by the deponent Sri Shailesh Kumar Singh who is identified by Sri Hemit Sharma, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which have been readover and explained to him by me.

22/5/08

Oath Commissioner.

S. K. Singh
OATH COMMISSIONER
HIGH COURT, ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.
No. 138330 Date 22-5-08.

1053 963 5

(5)

ANNEXURE NO 1

Lucknow Nagar Nigam

From,
Municipal Commissioner
Lucknow Nagar Nigam

Ref. no.- D-122/MC/AMC-A/08

Date- 16.05.2008

To,
1. The Director
Industrial Toxological Research
Institute, Lucknow.
2. Secretary
U.P. Pollution Control Board
Lucknow.

Subject

Compliance of order dated 30-04-2008 passed by Lucknow Bench, of Hon'ble High Court in writ petition no. 4436(M/B) of 2003, Sewage Treatment Plant v/s State of U.P. and others.

Sir,

Regarding the above subject, it is requested that for formulation of the report, if you require any logistics support from Lucknow Municipal Corporation. Kindly inform us.

Yours

(S.K. Singh)
Municipal Commissioner

ch

22/5

1054 (6) 964 6

ITR

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT

TIME : 16/05/2008 04:58

DATE,TIME	16/05 04:58
FAX NO./NAME	2628227
DURATION	00:00:22
PAGE(S)	01
RESULT	OK
MODE	STANDARD

el

99/5

1055 ~~965~~ 7

(7)

U.P. PCB

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT

TIME : 16/05/2008 05:25

DATE,TIME	16/05 05:25
FAX NO./NAME	2720764
DURATION	00:00:28
PAGE(S)	01
RESULT	OK
MODE	STANDARD

22/5/08

1056

966

8

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

State of U.P. & Others ... Applicants/Respondents

2008 AFFIDAVIT HIGH COURT ALLAHABAD 014716 5

In Re:

Writ Petition No. 4436 (M/B) 2003

Sewage Treatment Plant,
Lucknow ..... Petitioner.

Vs.

State of U.P. & Others. .....Respondents.

AFFIDAVIT

I, Sheo Shyam Mishra, aged about 51 years, son of Sri J S Mishra, presently posted as Secretary, Lucknow Development Authority, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on Oath as under:-

1. That the deponent is presently posted as Secretary, Lucknow Development Authority, Lucknow and as such he is fully conversant with the facts of the case deposed to hereunder.

2. That this Hon'ble Court vide its order dated 30/04/2008 required the Lucknow Development Authority to apprise the Court about the installation and functioning of Sewage Treatment Plant as well as

3rd Water Works Project and also identification of all places for water recharging in the city of Lucknow.

3. That so far as installation and functioning of the 3rd Water Works Project is concerned, it is most humbly submitted that the work is to be carried out by U.P. Jal Nigam under the aegis of the Department of Urban Development Government of U.P..

4. That with respect to the sewage treatment plant it is submitted that a land admeasuring 119.87 hectare has already been acquired by Gomti Pollution Control Unit of U.P. Jal Nigam through Nagar Nigam Lucknow and requisite notification under Section 4 of the Land Acquisition Act has already been issued on 25/03/2008.

It is further submitted that the said area of land has been acquired in villages Lonapur, Bharwaara and Bainsora. The said area of land is already earmarked for STP in the Master Plan 2021.

5. That in a meeting held on 11/05/2007 and 16/10/2007 under the Chairmanship of the Principal Secretary, Urban Development, Government of U.P. it has been decided that the land for Sewage Treatment Plant be acquired at the same places where it is earmarked in the Master Plan 2021

pursuant to the said decision and after the survey conducted by Gomti Pollution Control Unit of U.P. Jal Nigam. The land has been identified in the aforesaid villages in respect of which the land use in Master Plan 2021 is Sewage Treatment Plant/Sewage Farm.

6. That it may be stated here earlier a proposal was sent by Lucknow Development Authority on 14/11/2006 to change the land use of the land earmarked as STP/Sewage Farm in the Master Plan 2021 as mentioned in para 21 of the Affidavit filed in this Hon'ble Court on dated 30.04.2008. However, Vice Chairman, Lucknow Development Authority requested vide his letter dated 28/04/2008 to reject the earlier proposal dated 14/11/2006 regarding the change in land use. The said proposal dated 14/11/2006 has been rejected by the State Government vide its order dated 19/05/2008. A true copy of the order dated 19/05/2008 is being annexed as **Annexure No. 1** to this Affidavit.

7. That thus the acquisition proceedings in respect of the aforesaid land which is earmarked for Sewage Treatment Plant in the Master Plan is likely to be concluded soon by issuing notification under section 6 of the Land Acquisition Act.

8. That after the rejection of the proposal as requested by the Vice Chairman, Lucknow Development Authority regarding the change in land use, no proposal for change in land use of the land which is under acquisition proceeding is pending.

9. That as regards the 3rd Water Works, it is stated that the Lucknow Development Authority has already allotted 10 Hectare of land to U.P. Jal Nigam near Kathouta Lake in Gomti Nagar Scheme. The possession of the said land has also been handed over to the U.P. Jal Nigam on 11/06/1996.

10. That so far as the arresting declining ground water level and its recharging is concerned, State Government has from time to time issued orders for implementation of rain water harvesting projects and has made various provisions Some of which are as follows:-

a) Rain water harvesting projects have been made mandatory on all types of plots having an area of 200 Sqm and above.

b) In regard to the plots having an area of less than 200 sqm, provision for recharging pit in parks etc for group of plots has been made mandatory.

c) In the projects having an area of 20 acres or more, 5 per cent of the total area, subject to minimum of 1 acre is to be developed as a Water Body to collect the Surface-Run- Off.

11. That the authorities of the Lucknow Development Authority are making all round endeavor to enforce the aforesaid provisions provided in the Government Orders. Besides, till 30th April,2008, 143 buildings were got inspected by the Lucknow Development Authority out of which only 34 were found to contain provision for rain water harvesting. 85 buildings were not having any provisions for rain water harvesting and 24 buildings were under construction. After the aforesaid date i.e. 30th April, 2008, 498 buildings were again inspected out of which 411 buildings were found not having any provisions for water harvesting for which the requisite notices have been issued.

12. That two colonies being developed by the private sector namely one by M/s Eldico and one by M/s OMAXE at Raibareilly Road, Lucknow are developing water bodies. Further 2 buildings have been sealed for not providing adequate provisions for rain water harvesting even after sufficient time given to them. It

is further stated that after expiry of the said period of notice, such premises will be sealed and challaned as per the law.

13. That as far bye laws for implementation of rain water harvesting project is concerned, the Vice Chairman , Lucknow Development Authority has earlier constituted a Committee which met on 13/05/2008 and has proposed necessary changes in the byelaws as well as in the Urban Planning and Development Act. The recommendations made by the said Committee are going to be placed before the Board of Lucknow Development Authority for its consideration.

LUCKNOW

DATED: 22-05-, 2008.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of paras 1 , _____ of this affidavit are true to my knowledge and the contents of paras 2 to 13 ___ are true to my knowledge derived from records and those of paras _____ are believed by me to be true. Nothing material has been concealed and no part of it is false. So help me God.

LUCKNOW:

DATED: 22-05 — ,2008

DEPONENT.

1062

-7-

972 14

I identify the above named deponent,
who has signed before me and personally known to me

Sheo
~~Clerk~~ Of C.S.C. Office.

Solemnly affirmed before me on 22-05-2008
at 9:30 a.m./~~p.m.~~.
by Sri Sheo Shyam Mishra
the deponent who is identified by
Sri Suresh Kr , CSC Office,
High Court, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit, which have been read out and explained by me.

Sheo

OATH COMMISSIONER
HIGH COURT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
No. 147165 Dt. 22-05-2008

1063

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW
BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436(M/B) OF 2003
Sewage Treatment Plant VERSUS STATE OF UP & OTHERS
LUCKNOW ANNEXURE NO 1

15

973

FAX NO. :1234567890 May. 19 2008 05:49PM P1

उपाध्यक्ष कार्यालय
लखनऊ विकास प्राधिकरण
संख्या 29756
दि. 19.5.2008

महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता
संख्या– 3015 /8-3-2008-58एल.यू.सी./ 06

प्रेषक,

हरमिन्दर राज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 19 मई, 2008

विषयःजनहित याचिका संख्या–4436(एम.बी.)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक–30.04.2008 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–351/वी.सी./सीटीपी/08 दिनांक–15.05.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में आपके पत्र संख्या–1018/उपा./मु.न.नि./2006 दिनांक–14.11.2006 द्वारा ग्राम–हासेमऊ,भरवारा,लोनापुर,चन्दियामऊ,भैसोरा एवं बक्कारा से प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में आपके अनुवर्ती पत्र संख्या–292/उपा./2008–09 दिनांक–28.04.2008 द्वारा शासन से यह अनुरोध किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भू–उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर विचार न किया जाय।

2– उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक–11.05.2007 एवं 16.05.2007 में यह निर्णय लिया गया है कि सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट हेतु महायोजना–2021 में प्रस्तावित स्थल पर ही भूमि

Shukla-G.O.-07(127)

1064 16

974 9

अधिग्रहण की कार्यवाही की जाय। तत्क्रम में गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, जल निगम द्वारा सर्वेक्षणोपरांत ग्राम–भरवारा,लोनापुर एवं भैसोरा में ऐसी भूमि का चयन किया गया जिसका महायोजना–2021 में वर्तमान भू–उपयोग सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट / सीवेज फार्म है। तद्नुसार प्रश्नगत भूमि के अधिग्रहण हेतु जलनिगम / नगर विकास विभाग द्वारा भू–अर्जन अधिनियम की धारा–4 की कार्यवाही भी दिनांक–25.03.2008 को की जा चुकी है।

3– अतः उक्त वर्णित परिस्थितियों में उपाध्यक्ष,लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपर्युक्त अनुरोध के आधार पर प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव पर विचार करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(हरमिन्दर राज सिंह)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मुख्य स्थायी अधिवक्ता,मा. उच्च न्यायालय,लखनऊ खण्डपीठ।

2– आयुक्त, लखनऊ मण्डल,लखनऊ।

3– प्रमुख सचिव नगर विकास अनुभाग–5 उत्तर प्रदेश शासन।

4– प्रबन्ध निदेशक,जल निगम।

आज्ञा से,

(हरमिन्दर राज सिंह)

प्रमुख सचिव।

COMMISSIONER FOR OATHS सत्यमेव जयते High Court ALLAHABAD

215

1065

975

17

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

In Re:

Writ Petition No. 4436 (MB) of 2003

Sewage Treatment Plant ..... Petitioner

Versus

State of Uttar Pradesh & others.. Opp. Parties

30.04.2008

Compliance of the order dated ~~27.03.2008~~ on oath

I, D.K.Sharma, aged about 55 years, S/o Late D.L. Sharma, presently working as General Manager, Lucknow Jal Sansthan, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirms and state on oath as under:-

1. That the deponent is impleaded in the aforesaid writ petition as opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed herein.

22/5/08

2. That the aforesaid writ petition was taken up on 30.04.2008 whereby this Hon'ble Court was pleased to pass following order "We also find it expedient to ask the respondents to submit the report regarding the work already undertaken for cleaning of river Gomti, for Sewage Treatment Plant Project, Boring Projects and Third Water Works Project, the amount so far sanetioned and released, and the work done till date".

3. That in compliance of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 30.04.2008 the present affidavit is being filed mentioning therein the details of works undertaken by Lucknow Jal Sansthan for providing clean and regular supply of drinking water in the city of Lucknow.

4. That it is submitted that efforts have been made by UP Jal Nigam to complete the work with regard to installation of tube well. It is further submitted that so far as installation of 61 tube wells and reboring of 43 tube wells are concerned, A photocopy of Cumulative chart indicating the work completed zonewise is being annexed herewith as **Annexure No.1** to this affidavit.

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD
215

1067 977 (3) 19

5. That the averments made herein above in the present affidavit shows the works being executed by the Lucknow Jal Sansthan and the steps being taken by it for providing clean and regular supply of drinking water to the entire city of Lucknow. It is also important to point out here that the deponent has always carried out every direction and instructions issued by this Hon'ble Court and in future also the deponent undertakes to carry out every direction that is issued by this Hon'ble Court from time to time.

Lucknow:
Date: 22.05.2008

Deponent

Verification

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 5 of this affidavit are true to my personal knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed by me.
So help me god.

Lucknow
Date:22.05.2008

Deponent

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD
2213

1068 978 (9) 20

I, identify the deponent who has signed before me.

Lucknow
Date: 22.05.2008

Advocate

Solemnly affirmed before me on 22/5/08 at 2:30 A.M./P.M.

by the deponent who is identified by Shri Namit Sharma, Advocate High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him by me.

S. N. Singh
OATH COMMISSIONER
HIGH COURT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.
No. Date
13835 22/5/08

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

22/5

IN THE HONBLE HIGH COURT JUDICATURE AT LUCKNOW
W.P. NO 4436(MB)2003
ANNEXURE-(1)

लखनऊ जल संस्थान

Sewage Treatment Plant- VB State Sothern

1. जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत चालू नये नलकूप

क्रम सं0	जोन का नाम	नये नलकूपों का विवरण	लाभान्वित क्षेत्रों के नाम
1.	जोन–3	सेक्टर–डी, अलीगंज	अलीगंज सेक्टर–बी,सी एवं डी की पेयजल व्यवस्था में सुधार।
2.	जोन–3	सेक्टर–एच, अलीगंज	अलीगंज सेक्टर–एच, आई, जे0 के पेयजल व्यवस्था में सुधार।
3.	जोन–5	इन्दिरा नगर डी–ब्लाक	इन्दिरा सी तथा डी ब्लाक के पेयजल व्यवस्था में सुधार।
4.	जोन–5 (गोमती नगर)	विजय खण्ड	गोमती नगर विजय खण्ड की पेयजल व्यवस्था में सुधार।
5.	जोन–5	मानस बिहार (लिबर्टी कालोनी कुर्मांचल नगर पेयजल योजना)	शक्ति नगर, मानस बिहार, कुर्मांचल नगर की पेयजल व्यवस्था में सुधार।

2. जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत रिबोर के बाद चालू नलकूप

क्रम सं0	जोन का नाम	रिबोर के बाद चालू नलकूपों का विवरण	लाभान्वित क्षेत्रों के नाम
1.	जोन–1	डायमण्ड डेरी	डायमण्ड डेरी कालोनी की पेयजल व्यवस्था में सुधार।
2.	जोन–1	हाता मातादीन	हाता मातादीन, तिलपुरवा, पंजाबी मोहल्ला, न्यू गणेशगंज की पेयजल व्यवस्था में सुधार।
3.	जोन–3	सब्जी मण्डी महानगर	चांदगंज, छप्परतल्ला, माई की बगिया, सब्जी मण्डी, सेक्टर डी महानगर की पेयजल व्यवस्था में सुधार।

3. चालू वित्तीय वर्ष में शासन से प्राप्त अनुदान से चालू किये गये रिबोर नलकूप

क्रम सं0	जोन का नाम	रिबोर नलकूप	लाभान्वित क्षेत्रों के नाम
1.	जोन–2	जुबली कालेज	रीवर बैंक कालोनी, बारूद खाना, जगत नारायण रोड, बुलन्दबाग की पेयजल व्यवस्था में सुधार।
2.	जोन–4 (साउथ सिटी)	बी–ब्लाक, नलकूप	साउथ सिटी, बी–ब्लाक की पेयजल व्यवस्था में सुधार।
3.	जोन–5	इन्दिरा सेक्टर–सी नलकूप नं0–6	इन्दिरा नगर बी–ब्लाक, सी–ब्लाक की पेयजल व्यवस्था में सुधार।
4.	जोन–6	राजाजीपुरम ई–ब्लाक नलकूप	राजाजीपुरम ई–ब्लाक की पेयजल व्यवस्था में सुधार।

अधिशासी अभियन्ता जोन–2

सचिव

minister meeting 22-4-08.doc

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

1070

22

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW.

C. M. Application No. of 2008

State of U. P. ----------Applicant

In re

Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

APPLICATION FOR TAKING ON RECORD

The applicant – respondent above named, most respectfully submit as under:

The applicant is filing the affidavit in the above noted writ petition in compliance of the order dated 30.4.2008 passed by this Hon'ble Court, which is expedient in the interest of justice. Hence the same be taken up on the record of the writ petition.

P R A Y E R

Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow the accompanying affidavit to be taken on the record.

Such other and further order which this Hon'ble Court may deem just, fit and proper under the circumstances of the case may also be passed.

Lucknow

Dated: 22-05-2008

ADDL.CHIEF STANDING COUNSEL

(COUNSEL FOR APPLICANT)

1071 981 23

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW .

Oath Commissioner LUCKNOW 445 Civil Secretariat

2008 AFFIDAVIT HIGH COURT ALLAHABAD 013130 2

Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

AFFIDAVIT OF DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF U.P., IN COMPLINACE OF THIS HON'BLE COURT'S ORDER DATED 30.4.2008.

I, Surya Prakash Mishra aged about 50 years, son of Late Sri R. P. Mishra, presently posted as Special Secretary, Department of Urban Development , Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as Special Secretary , Department of Urban Development , Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, and as such he is fully conversant with the facts of the case deposed to hereinafter.

2 .That the deponent has read over the writ petition filed by the petitioner and has understood the contents thereof and is

Oath Commissioner LUCKNOW 445 Civil Secretariat

submitting some necessary facts, which are expedient in the interest of justice to be submitted before the Hon'ble Court herein under:

3. That the subject matter of the present writ petition relates to improvement of drinking water situation and sewage disposal system in Lucknow city.

4. That it is submitted that instant matter was listed on 30.4.2008 and on the day this Hon'ble Court pleased to pass an order , and directed to list the matter on 22.5.2008.

5. That in compliance of the order dated 30.4.2008 passed by this Hon'ble Court, instant affidavit is being filed narrating the facts and records relating to the matter in question.

6. That it is submitted that the U. P. Jal Nigam is an implementing agency on behalf of Nagar Nigam Lucknow and Jal Sansthan , Lucknow for execution, planning and design for drinking water supply, river pollution control work as well as the sewage disposal work. Therefore, the separate affidavit is being filed by the U. P. Jal Nigam and Jal Sansthan , Lucknow in compliance of orders passed by this Hon'ble Court. However, the deponent is filing Zone-wise progress report submitted by the U. P. Jal Nigam. The true photostat copy of the progress details relating to the work performed by the U. P. Jal Nigam in different Zones of the Lucknow City is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 1** to this affidavit.

It is significant to submit that for setting up Sewage Treatment Plant, and for the acquisition of land for construction of Sewage Treatment Plant under Gomti Action Plan, vide Notification No. 887 / Nine – 2 – 08 – 5 LA (1) / 08 dated 25.3.2008 the State Government has initiated

Oath Commissioner LUCKNOW 245 Civil Secretariat

proceedings under Section 4 / 17(1) of the Land Acquisition Act, 1894 for acquiring 120 Hectare land situate at village Bharawara, Lonapur and Bhaisora. It is significant to submit that as per information received through Jal Nigam, for construction of Sewage Treatment Plant, the tender have been invited and the technical and financial bids have been received. After observation of the technical bids, the financial bids shall be opened till the end of this month. It is submitted that for construction of STP (Sewage Treatment Plant) approximately 2 years time would be required.

7. That it is submitted that under Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow during the Financial Year 2007 – 08, for construction of Sewage Treatment Plant at village Bharawara, Lonapur and Bhaisora total 106.866 Hectare land has been acquired, and for granting its compensation an amount of Rs. 3287.2897 Lakhs are needed. In reference to the said acquisition at village Bharawara, Lonapur and Bhaisora, vide Government Order No. 2278 / Nine – 5 – 2008 – 11 (162) / 2000 TC dated 31st March 2008, an amount of Rs. 31,59,42,000.00 has been sanctioned by the State Government to the U.P. Jal Nigam, Lucknow. It is submitted that from the aforesaid sanctioned amount, U.P. Jal Nigam, Lucknow has been authorized for expenditure of Rs. 3,51,45,800.00; and remaining amount of Rs. 28,07,96,200.00 has been credited in the PLA (Personal Leger Account) of the U.P. Jal Nigam, Lucknow. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 31st March 2008 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 2** to this affidavit.

It is most humbly submitted that the proceedings for withdrawl of the aforesaid remaining amount of Rs.

Oath Commissioner LUCKNOW 245 Civil Secretariat

28,07,96,200.00 which has been credited in the PLA (Personal Leger Account) of the U.P. Jal Nigam, Lucknow are in progress.

8. That it is submitted that under Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow during the Financial Year 2008 – 09, in reference to the aforesaid acquisition of 106.866 Hectare land at village Bharawara, Lonapur and Bhaisora, for granting its compensation, the remaining amount of Rs. 1,27,86,970.00 has been sanctioned by the State Government to the U.P. Jal Nigam, Lucknow vide Government Order No. 3933 / Nine – 5 – 2008 – 11 (162) / 2000 TC dated 21st May 2008. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 21st May 2008 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 3** to this affidavit.

9. That it is submitted that for implementation of the sanctioned schemes under Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow during the 4th Quarter of the Financial Year 2007 – 08 , the National River Conservation Directorate, Ministry of Environment and Forests, Government of India released grant-in-aid of Rs. 4,65,00,000.00 in favour of Managing Director, U.P. Jal Nigam, Lucknow vide Government Order No. M – 14014 / 3 / 2003 – NRCD – II dated 28th March 2008. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 28th March 2008 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 4** to this affidavit.

It is submitted that since the cost of the project is to be shared on 70:30 basis between the Government of India and State Government. Therefore, for implementation of the sanctioned schemes under Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow during the Financial Year 2008 – 09, and in

Oath Commissioner LUCKNOW 245 Civil Secretariat

pursuance of the Government Order No. 664 CGA / Nine – 5 – 07 – 11 (162) / 2000 TC dated 10th October 2007, vide Government Order No.3932-CGA / Nine – 5 – 2008 – 11 (162) / 2000 TC dated 21st May 2008, an amount of Rs. 1,99,28,600.00 has been sanctioned by the State Government. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 21st May 2008 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 5** to this affidavit.

It is significant to submit that from the aforesaid amount, the construction work relating to Sewage Treatment Plant, G.H. Canal and remaining works relating to the sanctioned schemes under Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow shall be performed.

10. That in compliance of the order passed by this Hon'ble Court, the Director, Bhugarbh Jal Vibhag, U.P., Lucknow vide letter No. 252 G / Bhu. Ja. Vi. / S – 26 dated 21st May 2008 has submitted its report about action taken for checking the draining of ground water, which is remain as same, as it was submitted by him earlier vide letter No. 65 G / Bhu. Ja. Vi. / S – 26 dated 23rd April 2008. The true photostat copy of the aforesaid letter dated 21st May 2008 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 6** to this affidavit.

11. That it is significant to submit that for checking the draining of ground water and its recharging, the State Government has taken decision regarding rain water harvesting / recharging in the town areas. In this regard, the Department of Housing and Urban Planning issued several government orders. It is submitted that vide Government Order No. 0035 / Eight – 1 – 2005 dated 25th April 2006, the State Government directed for rain water harvesting / recharging in the town areas, and

Oath Commissioner LUCKNOW 245 Civil Secretariat

several directions with regard to the same have been issued to the Housing Commissioner, U.P. Awas Vikas Parishad; Vice Presidents of all the Development Authorities; Managing Director, U.P. Sahakari Awas Sangh Ltd., Lucknow. It is submitted that for rural area the similar directions has been issued to the Department of Village Development; Miner Irrigation Department; Agriculture Department; Land Development and Water Resource Department; U.P. Jal Nigam; Forest Department and Panchayati Raj Department etc.. The true photostat copy of the Government Order dated 25.4.2006 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 7** to this affidavit.

12. That in view of facts and circumstances stated herein above, it is significant to submit that the Urban Development Department, State of U.P. is taking all necessary steps in the matter in question.

Lucknow

Dated : 22/5/08

Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of the paragraphs 1, 2 of this affidavit are true to my personal knowledge those of paragraphs 3 to 11 are true to my information which derived from the records and those of paragraphs 12 is ~~are~~ based on legal

Oath Commissioner LUCKNOW 22/5 Civil Secretariat

advice. No part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God.

Lucknow

Dated : Deponent

I , identify the deponent who has signed before me.

Clerk of the C. S. C. office solemnly affirmed before me on ..... at a.m./ p.m. by the deponent Sri S. P. Mishra who has identified by Sri , clerk of CSC Office, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit which has read and explained to him by me.

(डा० जटाशंकर त्रिपाठी)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग–5 (फौजदारी)
उ० प्र० लखनऊ

कक्ष सं० 01/31302
द्वारा शपथ ली गई
जिनका परिचय श्री
दिनांक समय
वाद संख्या
पक्षकार
न्यायालय
शपथ की फीस वसूली गई

ANNEXURE No. A-1

1078 988 30

जनहित याचिका संख्या 4436(एम.बी.)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ0 प्र0 सरकार में दिनांक 30.4.2008 को हुई सुनवाई के दौरान मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप अनुपालन आख्या का प्रेषण

गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण अनुमानित लागत रु. 263.04 करोड़ जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.6.2008 को स्वीकृत हुई है, में ककरहा के निकट 370 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाये जाने के कार्य सम्मिलित थे। अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की मूल कार्य लागत रु. 104.22 करोड़ थी।

जुलाई 2006 में मूल प्रस्ताव में चिन्हित स्थान ग्राम बाघामऊ एवं भैंसोरा में 120 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी थी, किन्तु उक्त प्रस्ताव लखनऊ महायोजना-2021 में इसके अधिकांश भाग आवासीय उपयोग में निहित होने के कारण दिनांक 25.09.2007 को राजस्व परिषद, लखनऊ द्वारा वापस कर दिया गया। इसके उपरान्त लखनऊ महायोजना-2021 के अनुरूप ग्राम भरवारा, लोनापुर एवं भैंसोरा में 120 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहा हेतु नया प्रस्ताव प्रेषित किा गया, जिस पर नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा दिनांक 25.03.2008 को धारा-4 की कार्यवाही की जा चुकी है तथा 25.3.2008 को गजट नोटिफिकेशन हो चुका है एवं ज़िलाधिकारी, लखनऊ के द्वारा समाचार पत्रों में दिनांक 26.04.2008 को प्रकाशित कराया जा चुका है (समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न) (संलग्नक-1)

एस.टी.पी. हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें प्राप्त हो चुकी हैं एवं तकनीकी निविदाओं के परीक्षण के उपरान्त इस माह के अन्त तक वित्तीय निविदायें खोली जायेगीं।

एस.टी.पी. के निर्माण कार्यों में 2 वर्ष का समय लगेगा और यह कार्य 2 वर्ष में पूर्ण हो जायेगा, यदि आवश्यक धन समय से प्राप्त होता रहे।

गोमती कार्य योजना प्रथम चरण में अवशेष 2 योजनायें एवं गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण के कार्य प्रगति पर हैं एवं उपलब्ध धन के अनुरूप वांछित प्रगति दी जा रही है, जिसका विवरण संलग्न तालिका (संलग्नक-2 & 3) में दिया गया है। लखनऊ नगर में किये जा रहे सीवर कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति संलग्न है। (संलग्नक-4)

संलग्नक :- यथापरोक्त ।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-।
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

rohit/courtcase.doc

Notice

Notice

rabanki on behalf of Governor of Uttar bids from the eligible and approved in Class A & B as the case may be. **The ll of the works. Bidders are advised to riteria specified in Clause 4 of the the award of the contract.**

d rity ks	Address of Executive Engineer Executing the Work	Address of the Superintending Engineer	Address of D.M.	Address of Chief Engineer
	6	7	8	9
चरण) के अन्तर्गत निम्न ग्रामीण मार्गों का निर्माण कार्य।				
35	CD-I., P.W.D. Daburaich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
00	CD-I., P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
50	CD-I., P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
00	CD-I, P.W.D.	Barabanki	D.M.	Faizabad

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-2

संख्या 887/नौ-2-08-5एल.ए.(1)/08 लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2008

अधिसूचना

भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या-1 सन 1894) की धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्व साधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन,अर्थात लखनऊ में गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु जिला तहसील एवं परगना, लखनऊ के ग्राम भखारा लोनापुर एवं भैंसोरा में सीवेज शोधन संयंत्र के निर्माण की आवश्यकता है।

चूंकि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा (1) के उपबंध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, क्योंकि उक्त भूमि की गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के लिए आत्ययिक आवश्यकता है और इस आत्ययिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जाँच करने में संभावित विलम्ब को विवर्जित किया जाय। अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन अग्रतर निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5-क के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

अनुसूची

क्र. सं.	जिला	परगना/तहसील	मौजा	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे.)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	लखनऊ	लखनऊ	लोनापुर	01	0.637	
2.				02	0.428	
3.				03	0.255	
4.				04	1.100	
5.				05	0.190	
6.				10	0.989	
7.				11	0.699	
8.				12	0.537	
9.				15	0.727	
10.				17	0.330	
11.				18	0.343	
12.				20	0.820	
13.				21	0.701	
14.				23	0.265	

त : महंगाई

ग

ए, राज्य सभा में विपक्ष की उपनेता सुषमा
ी भी धमकी भरे अंदाज में कहा कि महंगाई
र सरकारें झूठ बोल रही है। महंगाई घटने के
र हफ्ते बढ़ रही है। दरअसल, महंगाई पर
हैं
उठाते
न

शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। 12 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई की दर एक बार फिर बढ़ती हुई 7.33 फीसदी हो गई है। इसके पिछले हफ्ते जब यह दर घट कर 7.14 फीसदी हुई थी तो ऐसा लगा था कि सरकारी
छ सफल हो रहे हैं लेकिन यह उम्मीद भी
ई। ठीक एक वर्ष पहले महंगाई की दर 6.38
थी। यही कारण है कि वाम दलों ने प्रधानमंत्री

उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-2

संख्या-887/नौ-2-08-5एल.ए.(1)/08

लखनऊ दिनांक: 25 मार्च, 2008

अधिसूचना

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या-1 सन् 1894) की धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण को सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात लखनऊ में गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु जिला तहसील एवं परगना, लखनऊ के ग्राम भरवारा लोनापुर एवं भैसोरा में सीवेज शोधन संयंत्र के निर्माण की आवश्यकता है।

चूँकि राज्यपाल को राय है कि उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं क्योंकि उक्त भूमि की गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के लिए आत्ययिक आवश्यकता है और इस आत्ययिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जांच करने में संभावित विलम्ब को विवर्जित किया जाय, अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन आदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

अनुसूची

क्र. सं.	जिला	परगना/तहसील	मौजा	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे.)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	लखनऊ	लखनऊ	लोनापुर	01	0.637	
2.				02	0.428	
3.				03	0.255	
4.				04	1.100	
5.				05	0.190	
6.				10	0.989	
7.				11	0.699	
8.				12	0.537	
9.				15	0.727	
10.				17	0.330	
11.				18	0.343	
12.				20	0.830	

संलग्नक- 2

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 28.4.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति
गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 28.04.08 तक प्रगति	दिनांक 17.5.08 तक कुल प्रगति	दिनांक 28.04.2008 से 17.05.2008 तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	आई. एण्ड डी. कार्य - 6 नग	6 नग	5 नग पूर्ण	5 नग पूर्ण	--
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 5 नग	6 नग	5 नग पूर्ण + 1 नग (5%)	5 नग पूर्ण + 1 नग (10%)	5 नग पूर्ण + 1 नग (5%)
3	राइजिंग मेन - 7525 मीटर	7525 मीटर	5120 मीटर	5120 मीटर	--
4	सीवर लाइन - 20 मीटर	20 मीटर	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
5	स्टाफ क्वार्टर - 4 नग	4 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
6	जेनसेट - 8 नग	8 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
7	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग	1 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
8	भूमि अधिग्रहण - जाब	1 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
9	पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग	25 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
10	विद्युत संयोजन - 6 नग	6 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
11	विविध कार्य - जाब	50%	20%	25%	5%
(ब)	वित्तीय प्रगति				
1.	वित्तीय प्रगति (व्यय)	लागत रु. 45.22	33.89	34.28	0.39
2.	प्राप्त धन		31.24	31.24	--

नोट : कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु उ0 प्र0 सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.04.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

परियोजना प्रबन्धक (प्रथम)

महाप्रबन्धक
महाप्रबन्धक
गो0प्र0नि0 इकाई
उ.प्र0 जल निगम, लखनऊ

d:progress/progressformat.xls sh1

LUCKNOW Civil Secretariat

1082

34

संलग्नक - 3

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 28.4.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति
गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रु. ल[illegible] में)

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 28.04.08 तक प्रगति	दिनांक 17.5.08 तक कुल प्रगति	दिनांक 28.04.2008 से 17.05.2008 तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	आई. एण्ड डी. कार्य - 18 नग	18 नग	17 नग (95%) + 1 नग (8%)	17 नग (95%) + 1 नग (10%)	17 नग (10%) + 1 नग (2%)
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग	11 नग	1 नग (5%)	1 नग (5%)	
3	राइजिंग मेन - 18955 मीटर	18955 मीटर	8091 मीटर	8104 मीटर	15 मीटर
4	सीवर लाइन - 6092 मीटर	6092 मीटर	3330 मीटर	3340 मीटर	10 मीटर
5	स्टाफ क्वार्टर - 11 नग	11 नग	80%	80%	--
6	जेनसेट - 25 नग	25 नग	100%	100%	--
7	मेन पम्पिंग स्टेशन - 1 नग	1 नग	32%	40%	8%
8	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग	3 नग	4%	4%	1%
9	सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग	7 नग	6 नग (100%) + 1 नग (60%)	6 नग (100%) + 1 नग (65%)	6 नग (0%) 1 नग (5%
10	नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग	5 नग	5 नग (85%)	5 नग (90%)	5%
11	शौचालय का निर्माण - 21 नग	21 नग	6 नग	6 नग	--
12	वनीकरण - जाब	20%	5%	5%	--
13	जनजागरण - जाब	20%	5%	5%	--
14	भूमि अधिग्रहण - जाब	100%	50%	50%	--
15	पम्पिंग प्लान्ट - जाब	58 नग	95%	95%	--
16	विद्युत संयोजन - जाब	30%	65%	70%	5%
17	विविध कार्य - जाब	50%	25%	30%	5%
(ब)	वित्तीय प्रगति				
1.	वित्तीय प्रगति (व्यय)	लागत रु. 263.04	56.773	57.32	0.55
2.	प्राप्त धन		58.395	58.395	--

परियोजना प्रबन्धक (प्रथम/अस्थाई)

महाप्रबन्धक
गो0प्र0नि0 इकाई
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

d:progress/progressformat.xls sh1

Commissioner (LUCKNOW)

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 28.4.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 28.04.08 तक प्रगति	दिनांक 17.5.08 तक कुल प्रगति	दिनांक 28.04.2008 से 17.05.2008 तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज	289 कि.मी.	8 कि.मी.	10 कि.मी.	2 कि.मी.
2	ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.)	48 कि.मी.	0.50 कि.मी.	1.00 कि.मी.	0.50 कि.मी.
3	सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.)	1 नग	3%	6%	कार्य एवार्ड
4	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.)	1 नग	3%	6%	कार्य एवार्ड
5	राइजिंग मेन - 1000 एम.एम.	45 मीटर	0	0	इसकी आवश्यकता वर्ष 2009-10 में है।
(ब)	वित्तीय प्रगति				
1.	वित्तीय प्रगति (व्यय)	लागत रु. 236.23	6.95	10.99	4.04
2.	प्राप्त धन		30.00	30.00	--

नोट :
1. योजना दिनांक 17.8.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रु. 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को निर्गत की गयी।
3. लगभग 180 कि.मी. सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम.एल.डी. के कार्य दिनांक 19.5.2008 से प्रारम्भ/ 18 माह की कार्य अवधि।
5. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य एवार्ड/कार्य 01.06.2008 से प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

परियोजना प्रबन्धक (प्रथम)

महाप्रबन्धक
गो0प्र0नि0 इकाई
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

d:progress/progressformat.xls sh1

Uttar Pradesh Jal Nigam Commissioner LUCKNOW

36

जनहित याचिका संख्या 4436(एम.बी.)/2003 पर दिनांक 30.04.08 को मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के सम्बन्ध में आख्या

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत लखनऊ नगर पेयजल योजना प्रथम चरण, भाग-1, अनुमानित लागत रू0 388.61 करोड़ के अन्तर्गत तृतीय जलकल गोमती नगर का कार्य प्रस्तावित है। उक्त जलकल से गोमती नदी के पार स्थित गोमती नगर, इन्दिरा नगर एवं उससे सटी हुई अन्य आवासीय कॉलोनियों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाना है। उक्त जलकल हेतु कच्चे जल के श्रोत के रूप में शारदा सहायक फीडर कैनाल से कच्चा जल उपलब्ध होना है, जिसके लिये सिंचाई विभाग द्वारा रू0 19.01 करोड़ का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजना के विरूद्ध लखनऊ नगर निगम के माध्यम से उपलब्ध करायी गई धनराशि से रू0 5.00 करोड़ का भुगतान सिंचाई विभाग को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के विरूद्ध किया जा चुका है।

तृतीय जलकल के निर्माण हेतु निविदायें आमन्त्रित की जा चुकी है एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुए स्वीकृति हेतु निविदा समिति की दिनांक 12.05.08 की बैठक में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिस पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त होना सम्भावित है, तदोपरान्त कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जायेगी। तृतीय जलकल का निर्माण कार्य वर्ष 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

लखनऊ नगर के विभिन्न समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 40 नग नये नलकूप एवं 43 नग रिबोर नलकूपों का कार्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त योजना में सम्मिलित पाँच पाइप पेयजल योजनाओं में 21 नग अतिरिक्त नलकूपों का कार्य भी प्रस्तावित है। योजना में सम्मिलित 40 नग नलकूपों, जिनको पूर्ण करने के उपरान्त केवल राइजिंग मेन बिछाकर वर्तमान में पड़ी हुई वितरण प्रणाली/उच्च जलाशय के माध्यम से चालू किया जाना है, के अन्तर्गत 3 नग नलकूपों की राइजिंग मेन बिछाकर चालू किया जा चुका है, 28 नग नलकूपों का कार्य प्रगति पर है जिसमें से 6 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर है जिन्हें अतिशीघ्र पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है। पाइपों के अभाव में शेष नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य बाधित है।

शेष 21 नग नलकूप, जो विभिन्न पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित हैं, उन नलकूपों का उपयोग नलकूप के पूर्ण होने के उपरान्त राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली आदि बिछाकर ही किया जा सकेगा। इनमें से 8 नग नलकूपों का कार्य प्रगति पर है एवं जिनमें से 2 नग नलकूपों के उपयोग हेतु राइजिंग मेन एवं आंशिक वितरण प्रणाली का कार्य प्रगति पर है, जिसको बिछाकर जलापूर्ति किये जाने की शीघ्र सम्भावना है। शेष नलकूपों के उपयोग हेतु वितरण प्रणाली बिछाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

योजना में सम्मिलित 43 नग रिबोर नलकूपों में से 3 नग नलकूप चालू किये जा चुके हैं एवं 4 नग पर कार्य प्रगति पर है। नलकूप के यंत्र-संयंत्र की कमी एवं राइजिंग मेन हेतु पाइप की अनुपलब्धता के कारण प्रगति प्रभावित हो रही है। इसको दूर करने हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

पेयजल योजना सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 5 नग नये नलकूपों का कार्य प्रस्तावित था, जिसमें से 3 नग नलकूप क्रमशः फैजुल्लागंज, विनय खण्ड, गोमती नगर एवं बी-ब्लॉक, राजाजीपुरम्, रानीलक्ष्मीबाई पार्क चालू किया जा चुका है एवं 1 नग नलकूप का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। प्रस्तावित 39 नग रिबोर नलकूपों में से 37 नग रिबोर नलकूपों को चालू किया जा चुका है एवं शेष 2 नग नलकूपों का कार्य प्रगति पर है।

महाप्रबन्धक

परियोजना प्रबन्धक

Letter Mar-08

Oath Commissioner LUCKNOW

पेयजल योजना

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 30.04.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

सामान्य कार्यक्रम — रु. लाख में

क्र.सं.	कार्य प्रगति	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 30.04.2008 तक कुल प्रगति		दिनांक 21.05.2008 तक कुल प्रगति		दिनांक 30.04.2008 से 21.05.08 तक कुल प्रगति	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1.	नये हैण्डपम्प	409 नग	179 नग	61.93	284 नग	115.53	105 नग	53.60
2.	विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्ड पम्प	670 नग	286 नग	69.00	413 नग	96.40	127 नग	27.40
3.	नये नलकूप	5 नग	2 नग	80.00	3 नग चालू	125.00	1 नग चालू	45.00
4.	रिबोर नलकूप	39 नग	37 नग	640.00	39 नग चालू	690.00	2 नग चालू	50.00
	योग			**850.93**		**1026.93**		**176.00**

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक

पेयजल योजना

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 30.04.08 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम

क्र0सं0	कार्य प्रगति	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 30.04.08 तक की प्रगति	दिनांक 21.05.08 तक कुल प्रगति	दिनांक 30.04.08 के उपरान्त प्रगति
1.	नया नलकूप	40 नग 21 नग	22 नग प्रगति पर 5 नग प्रगति पर	3 नग चालू 28 नग प्रगति पर 2 नग चालू 6 नग प्रगति पर	3 नग चालू 14 नग पर कार्य प्रारम्भ एवं प्रगति पर 3 नग चालू 2 नग प्रगति पर
2.	रिबोर नलकूप	43 नग	1 नग पूर्ण एवं 3 नग प्रगति पर	3 नग चालू 4 नग प्रगति पर	2 नग चालू 3 नग पर कार्य प्रारम्भ एवं प्रगति पर
3.	वितरण प्रणाली	133.31 कि0मी0	6.00 कि0मी0	12.00 कि0मी0	6.00 कि0मी0 का कार्य प्रारम्भ एवं शेष प्रगति पर।
4.	राइजिंग मेन	14.40 कि0मी0	8 नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर	3 नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू 6 नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रारम्भ	3 नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू 1 नलकूप की राइजिंग मेन का कार्य प्रारम्भ

योजना पर अवमुक्त धनराशि रू0 40.00 करोड़

योजना पर अब तक व्यय रू0 22.00 करोड़

नोटः पाइपों की आपूर्ति बाधित होने के कारण कार्य प्रभावित।

महाप्रबन्धक (प्र0नि0एवं कु0)
Progress General & S. Programmes

परियोजना प्रबन्धन

Oath Commissioner LUCKNOW

लखनऊ नगर में जल संस्थान के विभिन्न जोनों में नगरीय पेयजल (सामान्य) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

दिनांक 01.04.2006 से कराये गये कार्य

दिनांक 21.05.2008 तक

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
1.	जोन-1, लालबाग	नलकूपों की रोबोरिंग का कार्य	4 नग
		मिनी नलकूप	2 नग
2.	जोन-2, ऐशबाग	नलकूपों की रोबोरिंग का कार्य	2 नग
		मिनी नलकूप	1 नग
3.	जोन-3, अलीगंज	फैजुल्लागंज पेयजल योजना	
		नया नलकूप	1 नग
		स्टाफ क्वार्टर	90 प्रतिशत पूर्ण
		नलकूपों की रोबोरिंग का कार्य	12 नग
4.	जोन-4, आलमबाग	नलकूपों की रोबोरिंग का कार्य	7 नग पूर्ण
5.	जोन-5, इन्दिरा नगर	विनयखण्ड, गोमती नगर में एक नये एवं एक रीबोर नलकूप का कार्य	
		नया नलकूप	1 नग
		रीबोर नलकूप	1 नग
6.	जोन-6, राजाजीपुरम	'बी' बलाक रानी लक्ष्मीबाई पार्क में नलकूप का निर्माण	1 नग
		राजाजीपुरम 'ई' एवं 'एफ' ब्लाक पेयजल योजना	
		नया नलकूप	--
		वितरण प्रणाली	1.00 कि.मी.
		नलकूपों की रोबोरिंग का कार्य	9 नग
	योग	**नया नलकूप**	**3 नग पूर्ण**
		रीबोर नलकूप	**39 नग पूर्ण**
		मिनी नलकूप	**4 नग पूर्ण**

d:/JNNURM/kanshiram.xls

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक

29

Commissioner LUCKNOW Secretary

लखनऊ नगर में जल संस्थान के विभिन्न जोनों में जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

दिनांक 21.07.2008 तक

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
1.	जोन-1, लालबाग	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	1 चालू, 3 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	2 नग पूर्ण, 2 नग प्रगति पर।
2.	जोन-2, ऐशबाग	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	2 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	--
3.	जोन-3, अलीगंज	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	2 नग चालू, 14 नग पगति पर
		रीबोर नलकूप	1 नग चालू, 3 नग पगति पर
4.	जोन-4, आलमबाग	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	10 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	
5.	जोन-5, इन्दिरा नगर	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	3 नग चालू, 6 नग पगति पर
		रीबोर नलकूप	2 नग प्रगति पर।
6.	जोन-6, राजाजीपुरम	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	2 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	--
	योग	**नया नलकूप**	**6 पूर्ण, 37 नग प्रगति पर।**
		रीबोर नलकूप	**3 पूर्ण, 7 नग प्रगति पर।**

d:/JNNURM/kanshiram.xls

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई तृतीय(वि0/यॉ0), उ0प्र0,जल निगम , लखनऊ

दिनांक 20.5.2008 तक की प्रगति

अ	जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित किये जाने वाले 40 नलकूपों का निर्माण-: लक्ष्य- 40 नग नये नलकूपों को चालू करने की संभावित तिथि - 31.7.08 उपलब्धि - 5 नग (जलापूर्ति प्रारम्भ)						
क्र सं.	नलकूपो का नाम और जल स्त्राव ली. प्रति मिनट	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स. उपलब्ध होने की स्थिति में)		जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी	वर्तमान की प्रगति	टिप्पणी
			वास्तविक	संभावित			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अलीगंज सेक्टर-एच जोन-3 1500 ली.प्र. मि.	1.1.07	6.5.08		1.5	दि. 16.5.08 से जलापूर्ति प्रारम्भ	
2	इंदिरानगर डी ब्लाक, जोन-5 1000 ली..प्र.मि.	15.12.07	1.5.08		1.00	दिनांक 12.5.08 से जलापूर्ति प्रारम्भ	
3	विजय खण्ड, जोन-5 1000 लि.प्र.मि.	5.3.08	12.5.08		1.00	दिनांक 17.5.08 से जलापूर्ति प्रारम्भ	
4	अर्लीगज सेक्टर -सी/डी, जोन-3 1000 ली.प्र.मि.	17.3.08	7.5.08		1.00	तदैव	
5	गुलिस्ता कालोनी, जोन-1 1000 ली.प्र.मि.	18.3.08	18.5.08		1.00	दिनांक 18.5.08 से जलापूर्ति प्रारम्भ	
6	अहिभबरनपुर जोन-3	30.3.08	8.5.08			पम्प सेट चालू	राइजिंग मेन जोडा जाना है।
7	हिन्द नगर नलकूप जोन-4	11.3.08		25.5.08		ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	
8	त्रिवेणी नगर, जोन-3	17.3.08				पम्प सेट चालू	तदैव
9	इंदिरा नगर बी ब्लाक, जोन-5	15.3.08		30.5.08		कम्प्रेसर से विकास कार्य पूर्ण	
10	विनीत खण्ड, जोन-5	24.3.08		31.5.08		लोअरिंग पूर्ण, वि.स. की धनराशि जमा	
11	तातारपुर सेक्टर-ई अलीगंज जोन-3	13.4.08		31.5.08		ओ.पी.यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	
12	विकास नगर, सेक्टर-9	19.4.08		20.5.08		पम्प सेट चालू	तदैव
13	कानपुर रोड योजना सेक्टर-जे, जोन-4	10.4.08		25.5.08		लोअरिंग पूर्ण	
14	मातादीन शेरवाली कोठी,सहादतगंज	13.4.08		31.5.08		तदैव	
15	दामोदर नगर आलमबाग. जोन-4	13.4.08		31.5.08		तदैव	
16	विवेक खण्ड-4 गोमती नगर, जोन-5	15.4.08		31.5.08		तदैव	
17	शिवपुरी पार्क गणेश गंज, जोन-1	15.4.08		31.5.08		तदैव	
18	साउथ सिटी सेक्टर सी-1 जोन-4	21.4.08		31.5.08		कम्प्रेसर से विकास कार्य प्रगति पर	
19	जानकीपुरम सेक्टर-एच ,अलीगंज जोन-3	15.4.08		31.5.08		लोअरिंग पूर्ण वि.स. की धनराशि जमा	
20	डायमंड डेरी, जोन-1	17.4.08		31.5.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	
21	सेक्टर-आई, एल.डी.ए. कालोनी आलमबाग, जोन -4	29.4.08		10.6.08		लोअरिंग पूर्ण	
22	सहयोग पार्क, महानगर जोन-3	29.4.08		10.6.08		पम्प सेट अधिष्ठापित वि.स. की धनराशि अपेक्षित	
23	अशोकनगर राजाजीपुरम जोन-6	29.4.08		10.6.08		लोअरिंग पूर्ण	
24	इंदिरानगर सेक्टर-14, जोन-5	5.5.08		15.6.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	
25	मेवा नर्सरी निशातगंज, जोन-3	5.5.08		15.6.08		लोअरिंग पूर्ण वि.स. की धनराशि जमा	

क्र सं.	नलकूपो का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स. उपलब्ध होने की स्थिति में)		जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी	वर्तमान की प्रगति	टिप्प
			वास्तविक	सम्भावित			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	मेहदी टोला,विष्णुपुरी कालोनी जोन-3	9.5.08		20.6.08		कम्प्रेसर से विकास कार्य प्रगति पर	
27	बडा बरहा, आनन्दनगर, जोन-4	8.5.08		20.6.08		लोअरिंग पूर्ण	
28	ब्रहम नगर, जोन-4	8.5.08		20.6.08		कार्य प्रगति पर	
29	साउथ सिटी रश्मिखण्ड, जोन-4	9.5.08		20.6.08		तदैव	
30	जानकीपुरम सेक्टर-सी ,जोन-3	9.5.08		20.6.08		तदैव	विवाद के कारण कार्य बाधित है।
31	सोसाइटी पार्क नरही , जोन-1	9.5.08		20.6.08		तदैव	
32	विशाल खण्ड गोमतीनगर, जोन-5	19.5.08		25.6.08		शिफ्टिंग से संबंधित कार्य प्रगति पर	
33	आनन्द नगर छोटा बरहा , जोन-4	19.5.08		25.6.08		तदैव	स्थान विवादित है।
34	पंचवटी कालोनी , रहीमनगर, जोन-1	19.5.08		25.6.08		तदैव	
35	हुसैनाबाद शिवपुरी , जोन-2	19.5.08		25.6.08		तदैव	उपलब्ध मशीन कार्यस्थल तक नही पहुँच सकी।
36	अहमदगंज पजावा , जोन'-2	19.5.08		25.6.08		तदैव	तदैव
37	शरीपुरा आलमबाग जोन-6	20.5.08		30.6.08			तदैव
38	स्टार कालोनी सेक्टर-9 प्राईवेट क्षेत्र , जोन-5	20.5.08		30.6.08			तदैव

सार-:

1. चालू नलकूप की संख्या - 5 नग , जलावृद्धि - 5.5 एम.एल.डी.
2. नलकूपों की संख्या जिनके पम्प सेट चालू है राइजिंग मेन जोडा जाना है। - 3 नग, संम्भावित जलावृद्धि - 3.0 एम.एल.डी.
3. पम्प अधिष्ठापित । विद्युत संयोजन आपेक्षित है। - 2 नग, जलावृद्धि - 2 एम.एल.डी.
4. निर्माणधीन नलकूपों की संख्या -28 नग

परियोजना प्रबंधक

City Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

1091 दि 1000

43

ब	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ शहर के विभिन्न पेयजल योजनाओं के विरूद्ध प्रस्तावित 21 नलकूप का विवरण लक्ष्य - 21नग नये नलकूपों को चालू करने की संभावित तिथि - 31.7.08 उपलब्धि - 1 नग नलकूप						
क्र सं.	नलकूपों का नाम स्त्राव लीटर प्रति मिनट	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (राइजिंग मेन पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स. उपलब्ध होने की स्थिति में)		जल आपूर्ति में वृद्धि एम. एल.डी.	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			वास्तविक	सम्भावित			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लिवर्टी कालोनी कुर्मान्चल नगर पेयजल योजना -: 2 नग , जोन-3						
	1.कुर्मान्चल नगर(मानसबिहार)नलकूप-1 1000 ली.प्र.मि.	10.2.08	8.5.08		1.00	दिनांक 18.5.08 से जलापूर्ति प्रारम्भ	
	2.कुर्मान्चल नगर(लिवर्टी कालोनी) नलकूप-2	17.3.08			-	ओ.पी.यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	
2	शिवनगर जल योजना :- 4 नलकूप जोन-3						
	3. नलकूप सं.-1	10.11.07	8.5.08		-	पम्प सेट चालू	राइजिंग मेन जोड़ा जाना है।
3	भारतनगर पेयजल योजना :- 3 नलकूप , जोन-3						
	4. सत्यलोक कालोनी	15.3.08		15.7.08	-	पम्प सेट चालू	तदैव
	5. भगत सिंह पार्क	28.4.08		15.7.08		ड्रिलिंग प्रगति पर, वि.स.की धनराशि जमा	
	6. महाराजा अग्रसेन पार्क	30.4.08		15.7.08		तदैव	
4	गढ़ीकनौरा पुनर्गठन पेयजल योजना-: 6 नलकूप , जोन-2						
	7. पी.टी.सी. , मिल के पास,	30.4.08		15.7.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	
	8. नलकूप संख्या-2, तालकटोरा	21.5.08		31.7.08		कार्य प्रगति पर	
5	खरिकावार्ड पेयजल योजना-: 6 नलकूप, जोन-4						
	9. नलकूप संख्या-1	3.5.08		15.7.08		लोअरिंग पूर्ण	
	10. नलकूप संख्या-2	13.5.08		25.7.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	
	11. नलकूप संख्या-3	17.5.08		25.7.08		कार्य प्रगति पर	

परियोजना प्रबन्धक

Addl. Commissioner LUCKNOW Secretariat

1042

~~1001~~

स	जे.एन.एन.यू.आर.एम के अन्तर्गत 43 नग री-बोर नलकूपो का निर्माण कार्य-: लक्ष्य- 43 री-बोर नलकूपों को चालू करने की सम्भावित तिथि 31.12.08 उपलब्धि -- 3 नग						
क्र स.	नलकूपों का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (राइजिंग मेन पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			वास्तविक	सम्भावित			
1	2	3	4	5	6	7	
1	डायमंड डेरी, जोन-1	1.3.08	29.4.08		1.00	जल संस्थान द्वारा रख-रखाव	
2	महानगर सेक्टर-डी, जोन-3	6.4.08	1.5.08		1.00	तदैव	
3	हातामातादीन, जोन-1	20.3:08	13.5.08		0.60	जलापूर्ति प्रारम्भ	
4	जवाहर भवन, जोन-1	17.4.08		31.5.08		कम्प्रेसर से विकास कार्य पूर्ण	
5	इंदिरानगर नलकूप स.-54 जोन-5	3.5.08		15.6.08		लाअरिंग पूर्ण	
6	पत्रकार पुरम गोमतीनगर जोन-5	5.5.08		15.6.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	
7	कमला कपूर पार्क निराला नगर जोन-3	10.5.08		20.6.08		लोअरिंग पूर्ण	
8	पेपर मिल कालोनी नलकूप जोन-3	20.5.08		20.06.08		तदैव	
9	आर्यसमाज मंदिर गणेश गंज जोन-1	20.5.08		20.6.08		कार्य प्रगति पर	
10	मनकामेश्वर मंदिर, जोन-3	21.5.08		20.6.08		तदैव	

परियोजना प्रबन्धक

1093

1002

45

क. री-बोर नलकूप निर्माण से संबंधित विवरण

योजनार्गत प्रस्तावित रीबोर नलकूप - 30 नग नलकूप
लक्ष्य - 30 नग नलकूप
उपलब्धि - 30 नग नलकूप चालू

क्रसं.	नलकूपों का नाम	चालू करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	टिप्पणी
क.	शासनादेश संख्या-590/नौ-5-06-45 बजट/05 दिनांक 29.3.06 एवं 3188/नौ-5-2007-45बजट/05 दिनांक 23.10.07			
1	अलीगंज सेक्टर बी नलकूप	20.5.06	1.00	जल संस्थान लखनऊ द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है।
2	अलीगंज सेक्टर-एफ नलकूप	14.4.06	1.00	तदैव
3	अलीगंज सेक्टर-जी नलकूप	15.4.06	1.00	तदैव
4	इन्दलोक नलकूप	14.6.06	1.00	तदैव
5	गणेश गंज नलकूप	25.6.06	1.00	तदैव
6	विकास नगर सैक्टर-6 नलकूप	15.6.06	1.00	तदैव
7	न्यूहैदर गंज नलकूप	4.7.06	1.00	तदैव
8	चन्दरनगर-7 नलकूप	11.7.06	1.00	तदैव
9	राजाजी पुरम नलकूप	30.8.06	1.00	तदैव
10	इदिरा नगर न.-7 नलकूप	7.8.06	1.00	तदैव
11	चौपटिया नलकूप	15.10.06	0.80	तदैव
12	कक्कड पार्क नलकूप	18.12.06	0.80	तदैव
	वित्तीय वर्ष - 2006-07 में कुलः-	एम.एल.डी	11.6	
13	विकास नगर सेक्टर-2 नलकूप -1	13.6.07	1.00	तदैव
14	इंदिरा नगर नलकूप सं.47 नलकूप	25.8.07	1.00	तदैव
15	अलीगंज सेक्टर-ओ नलकूप	16.9.07	1.00	तदैव
16	सुभाष पार्क नलकूप	3.2.08	1.00	तदैव
17	अलीगंज वाटर वर्क्स नलकूप	18.3.08	1.00	तदैव
18	बटलर पैलेश नलकूप	30.3.08	1.00	तदैव
19	हैवलक रोड	30.3.08	1.00	तदैव
	वित्तीय वर्ष - 2007-08 में कुलः-	एम.एल.डी	7.00	
20.	प्रेमनगर नलकूप	4.4.08	1.00	तदैव
21	तिकोनिया पार्क महानगर नलकूप	9.4.08	0.80	तदैव
22	विकासनगर सेक्टर-14 नलकूप	8.4.08	1.00	तदैव
23	अलीगंज सेक्टर-क्यू नलकूप	10.4.08	1.00	तदैव
24	हिन्द नगर संख्या-4 नलकूप	10.4.08	1.00	तदैव
25	हिन्द नगर संख्या-2 नलकूप	15.4.08	1.00	तदैव
26	राजाजी पुरम सेक्टर-ई नलकूप	25.4.08	1.00	तदैव
27	साउथ सिटी बी ब्लाक न.2 नलकूप	29.4.08	1.00	तदैव
28	जुबली कालेज	29.4.08	0.8	तदैव
29.	इंदिरानगर सेक्टर-एस नलकूप सं-6	19.5.08	1.00	तदैव
30	एल्डको आलमबाग नलकूप	19.5.08	1.00	तदैव
	वित्तीय वर्ष - 2008-09 में कुलः-	एम.एल.डी	10.60	

परियोजना प्रबन्धक

Oath Commissioner LUCKNOW

क्रमं.	नलकूपो का नाम	चालू करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	टिप्पणी
ख.	शासनादेश संख्या-3240/नौ-5-07 सा0/07 दिनांक 2.11.07 लक्ष्य - 8 नग उपलब्धि - 8 नग			
1	टिकैतराय कालोनी नलकूप	15.2.07	1.00	जल संस्थान लखनऊ द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है।
2	भोला खेडा नललकूप	1.2.07	1.00	तदैव
	वित्तीय वर्ष - 2006-07 में कुलः-	एम.एल.डी	2.00	
3	कुण्डरी रकाबगंज नलकूप	5.6.07	0.80	तदैव
4	गोमती नगर विनय खण्ड नलकूप	13.6.07	1.00	तदैव
5	बीबीगंज नलकूप	26.12.07	1.00	तदैव
6	नौवस्ता नलकूप	1.9.07	0.80	तदैव
7	विकास नगर सेक्टर-5 नलकूप न.16	11.9.07	1.00	तदैव
8	कलियन टोला	3.2.08	0.80	तदैव
	वित्तीय वर्ष - 2007-08 में कुलः-	एम.एल.डी	5.40	
ग.	शासनादेश संख्या-1801/नौ-5-07-7बजट 07 दिनांक 11.06.07 लक्ष्य - 1 नग उपलब्धि - 1 नग			
1	विनय खण्ड-4, रिसार नलकूप	19.6.07	1.00	जल संस्थान लखनऊ द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है।
	कुलः-	एम.एल.डी	1.00	
घ.	नये नलकूपों के निर्माण से संबंधित विवरण -: लक्ष्य - 3 नग नलकूप उपलब्धि - 3 नग चालू			
1	फैजुल्लागंज	10.6.07	1.00	जल संस्थान लखनऊ को दिनांक 31.3.08 को हस्तान्तरित
2	विनय खण्ड -4	20.6.07	1.00	पूर्ण एवं जल संस्थान लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाना है
3	राजाजी पुरम ,लक्ष्मीबाई पार्क नलकूप	10.5.08	1.00	दिनांक 12.5.08 से जलापूर्ति प्रारम्भ
ड.	राजाजी पुरम ई. एवं एफ ब्लाक शासनादेश संख्या - 02/नौ-5-2008-45 बजट/ 05 दिनांक 20.2.08 लक्ष्य - 2 नग दिनांक 31.7.08 उपलब्धि -			
	1. नलकूप न.-1	-	-	पिन-पाइन्ट उपलब्ध नहीं है।
	2. नलकूप न.-2	-	-	तदैव
च.	अम्बेडकर मैदान- डिपाजिट कार्य लक्ष्य -2 नग उपलब्धि - 2 नग			
	1. नलकूप न.-1	1.5.08	0.80	नलकूप चालू
	2. नलकूप न.-2	6.4.08	0.80	तदैव
	वित्तीय वर्ष - 2007-08 में कुलः-	एम.एल.डी	1.60	
छ.	जल संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि के विरूद्ध मिनी नलकूपों का निर्माण एवं नलकूपों का पुनर्विकास -:			
1	सज्जादबाग नलकूप	-	0.40	जल संस्थान लखनऊ द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है।
2	रामगंज नलकूप	-	0.40	-
3	फूलबाग नलकूप-1	-	0.10	-
4	फूलबाग नलकूप-2	-	0.10	-
5	20 नलकूपों का पुनर्विकास कार्य पूर्ण	-	8.00	-
वित्तीय वर्ष - 2007-08 में कुलः-एम.एल.डी			9.00	

परियोजना प्रबन्धक

Office Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

ANNEXURE NO. A-2

47

संख्या- 2278/नौ-5-2008-11(162)/2000टीसी

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2008

विषयः- वित्तीय वर्ष 2007-08 में गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी-27/022-0302/08, दिनांक 07.02.08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु जनपद लखनऊ के ग्राम भखारा, लोनापुर एवं भैंसोरा की कुल 106.866 हेक्टेयर भूमि के अर्जन के फलस्वरूप प्रतिकर के भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 3287.2897 लाख की धनराशि के सापेक्ष रू0 31,59,42,000/- (रू0 इक्तीस करोड़ उन्सठ लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2007-08 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. उक्त धनराशि में रू0 3,51,45,800/- (रू0 तीन करोड़ इक्यावन लाख पैतालीस हजार आठ सौ मात्र) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा विशेष सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बिल प्रस्तुत करके लखनऊ कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी तथा शेष धनराशि रू0 28,07,96,200/- (रू0 अट्ठाइस करोड़ सात लाख छियान्नवे हजार मात्र) की धनराशि उ0प्र0 जल निगम के पी0एल0ए0 में रखी जायेगी तथा यथासमय वित्त विभाग की सहमति से आहरित कर व्यय की जायेगी।
2. भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर अनुमोदित योजनाओं पर धनराशि व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है। उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है तथा इस स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक में नहीं रखा जायेगा।
3. विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्तें निर्धारित की गयी थीं, उन्हीं शर्तों के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4. प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मल-जल तथा सफाई-106-वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-03-नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम (70 प्रतिशत केन्द्र सहायतित)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8-1530-दस/08 दिनांक 31 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकर (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग।
8. नियोजन अनुभाग-3, 4।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

ANNEXURE NO. A-3

1097 ~~1066~~

संख्या- 3933/नौ-5-2008-11(162)/2000टीसी

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 21 मई, 2008

विषयः गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 2278/नौ-5-2008-11(162)/2000टीसी, दिनांक 31 मार्च, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु जनपद लखनऊ के ग्राम भखारा, लोनापुर एवं भैंसोरा की कुल 106.866 हेक्टेयर भूमि के अर्जन के फलस्वरूप प्रतिकर के भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 3287.2897 लाख की धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0 1,27,86,970/- (रू0 एक करोड़ सत्ताईस लाख छियासी हजार नौ सौ सत्तर मात्र)** की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2008-09 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा विशेष सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बिल प्रस्तुत करके लखनऊ कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
2. भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर अनुमोदित योजनाओं पर धनराशि व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है। उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक में नहीं रखा जायेगा।
4. विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्तें निर्धारित की गयी थीं, उन्हीं शर्तों के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
5. प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

Addl. Commissioner LUCKNOW

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मल-जल तथा सफाई-106-वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-03-नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम (70 प्रतिशत केन्द्र सहायतित)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8- 2057(ए)-दस/08, दिनांक 21 मई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकर (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग।
8. नियोजन अनुभाग-3, 4।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

1099 ~~1088~~

ANNEXURE NO. A-4

51

संलग्नक-2

No.M-14014/3/2003-NRCD-II
Government of India
Ministry of Environment & Forests
NATIONAL RIVER CONSERVATION DIRECTORATE

"Paryavaran Bhavan"
CGO Complex,Lodi Road.
New Delhi-110003
Dated:- 28th March,2008

To

The Pay and Accounts Officer,
Ministry of Environment & Forests,
' Paryavaran Bhawan',
CGO Complex Lodhi Road,
NEW DELHI

Subject:- Release of Grant-in-Aid of Rs. 4,65,00,000/- (Rupees Four crore and sixty five lakhs only) in favour of Managing Director, UP Jal Nigam, Lucknow for implementation of sanctioned schemes under Gomti Action Plan Phase-II at Lucknow (UP) during the 4th quarter of the financial year 2007-08 (Plan).

Sir,

I am directed to convey the sanction of the President to the release for the payment of Grant-in-Aid of **Rs.4,65,00,000/- (Rupees Four crore and sixty five lakhs only)** in favour of Managing Director, UP Jal Nigam, Lucknow for implementation of the sanctioned schemes under Gomti Action Plan, Phase – II at Lucknow (UP) during 4th quarter of the financial year 2007-08 (Plan).

2. The following points are also to be noted :-

i) Close monitoring of implementation is done so as to ensure that the sanctioned schemes are completed within the sanctioned cost and time. Any increase in cost due to cost or time over run, or for any other reason, shall be borne by the State Government themselves.

ii) The State Government of U.P. also contributes their corresponding share for the scheme, and confirms the same to NRCD.

iii) Further release of funds will be considered only after receipt of Utilization Certificate and Expenditure Statement showing clearly the progress of implementation in terms of percentages.

3. The release of funds is subject to the following terms and conditions:

Financial Aspects:

i) The terms and conditions as stipulated in the orders conveying Administrative Approval & Expenditure Sanctions (AA&ES) in respect of the schemes under the Plan issued from time to time shall be adhered to during implementation of the projects.

Commissioner LUCKNOW

ii) Any escalation over and above the sanctioned cost in respect of individual projects shall be borne by the State Government. The Implementing Agency has to take this into account while incurring expenditure on the approved projects.

iii) Funds shall be made available to the implementing agencies without delay or diversion.

iv) The State Govt. shall take all necessary legal and executive measures to ensure that local bodies augment their resources for Operation & Maintenance of the assets created under the River/Lake Conservation Plan.

v) Appropriate policy initiatives will be taken by State Govt. to tackle non-point sources of pollution including agricultural run-off, industrial pollution and solid waste management.

vi) On receipt of the grant, the grantee/State Government shall make available its share in the cost of the project. Further installments of grants of the Central Government would be released only after the such contribution is released by the State.

vii) The funds released for the projects should be operated through a separate interest earning bank account. The interest thus earned should be credited to the project and reflected in the Utilisation Certificates from time to time and shall be adjusted towards future funds release for the project. For any diversion of funds, the signatory of the bank account shall be held responsible.

viii) The Government of India reserves the right to withdraw the sanction at any stage if it is convinced that the amount released has not been properly utilized or appropriate progress is not being made.

ix) The Implementing Agency is not permitted to seek or utilize funds for the same purpose from any other organization (Government, semi-Government, autonomous or private).

x) The implementing agency shall furnish monthly expenditure statements in the prescribed forms from the commencement of the project. These should be submitted by the 20th of the following month for the preceding month.

xi) The implementing agency shall furnish to the NRCD a utilization certificate in respect of grants-in-aid received during the various quarters as under:-

(a) For the 1st, 2nd and 3rd quarters in the prescribed form 'A' to be provided by NRCD.
(b) For the 4th Quarter in the prescribed form 'B' to be provided by NRCD.
(c) Utilisation certificates will be furnished to NRCD in respect of grants received in various quarters by the dates indicated as follows:

1st Quarter	April – June	15th August
2nd Quarter	July- September	15th November
3rd Quarter	October- December	15th February
4th Quarter	January- March	15th May

(xii) The cost of the project is to be shared on 70:30 basis between Centre and States. Of 30% share of state, a minimum of 1/3rd is to be in the form of share of public/local body. The sanctioned amount should be spent exclusively thereon as per the guidelines of the scheme and within the stipulated time. The liability of NRCD will not exceed the amount sanctioned for the project

scheme project/scheme and within the stipulated time. The liability of NRCD will not exceed the amount sanctioned for the project/scheme. Any unspent amount(s) should be surrendered to the Directorate. For carrying forward any unutilized amounts beyond the specified time limit prior approval of NRCD should be obtained. Centage will be payable @ 8%.

xiii) It is the responsibility of the implementing agency to ensure that the assets are exclusively used for the purpose for which the grant is sanctioned and to maintain the assets and their records properly.

xiv) All the assets acquired/created out of the grants shall not be disposed of, encumbered, or utilized for any purpose other than that for which sanctioned.

3.1 Audit:

a) The Comptroller & Auditor General of India at his discretion shall have the right of access to the books and accounts of the Implementing Agency receiving the funds from the Government of India for the purpose of Audit.
b) The books of accounts of the grantee, relating to this grant, shall be open to Audit by the Internal Audit Wing of this Ministry.
c) The implementing agency shall furnish to the Government annually a report of its work within three months, and its audited statement of accounts within nine months of the financial year.

3.2 Electronic Remittance of Funds:

The fund releases by this Ministry would be remitted by Electronic transfer. The following details may be kept updated from time to time to enable electronic remittance.

(a) Bank account details both in figures and words to NRCD.
(b) MICR Code and IFSC Code of the Bank's Branch.
(c) Necessary authorization by the grantee organization to its bank to receive the remittances on its behalf and to issue necessary bank receipt to the Ministry's bank for receipt of funds.

Changes if any in the bank details shall be communicated without delay to this Ministry.

3.3 Submission of Monthly Physical & Financial Progress Reports (PFPR):

(a) Monthly Physical and Financial Progress Reports (PFPR) in the prescribed format shall be signed by at least two designated officers of the Implementing Agency, one of whom will be Chief Engineer/ Head of the Department.

(b)The signing officer will indicate his name and designation in full in capital letters and affix official seal under the signature. While fax PPRs will be accepted for commencement of the processing of the case, ink-signed PPRs must follow by Speed Post.

© Consistency between physical progress and expenditure shall be maintained and reasons for substantial variations i.e., more than 10% shall be appropriately explained against each item.

Chief Engineer LUCKNOW

3.4 Submission of Utilisation Certificates (UCs):

The Utilisation Certificates (UCs) in the prescribed format shall be signed and stamped by the Head of the Organisation, Head of the Accounts Department and field level functionary at Executive Engineer level/ Principal Investigator, as applicable. The name and designation of the officers signing the UCs shall be clearly mentioned in full and in capital letters.

3.5 Project Management & Monitoring:

(a) Time and cost overrun leading to delay in implementation of projects is viewed with serious concern by the Government and as per instructions contained in Cabinet Secretary's D.O. letter No.261/1/10/2000-Cab. Dated June 4, 2001 read with Planning Commission's D.O letter No.O-14015/2/98-PAMD dated 19.8.1998, mandatory Review of the Schemes must be carried out from time to time so as to assess the expenditure trend and time schedule of the schemes and appropriate action against those responsible delay shall be taken in accordance with the instructions.

(b) Inter-Departmental Monitoring Committee shall be set up at the State/UT and Divisional/District levels. The State level Committee will be chaired by Principal Secretary of the Department concerned and a balanced and representative composition of representatives of all Departments and agencies concerned for ensuring timely and, qualitatively sound execution of works.

(c) The Urban Local Body level Committee will be constituted under the Chairmanship of the Chief Executive Officer of the Municipal Corporation/Committee and have representatives from all executing agencies concerned. The intervention of District Magistrate/ Collector shall be sought for resolution of inter-Departmental issues.

(d) Citizens Monitoring Committees shall be constituted in the towns where the NRCP works are proposed to be taken up.

3.6 Inspection:

(a) The Government of India may depute any person to visit the implementing agency for the purpose of monitoring its work. Full facilities shall be provided by the implementing agency to the persons deputed for inspection by the Government of India.

(b) The implementing agency shall maintain separate audited accounts for the project. If it is found expedient to keep a part or the whole amount in a bank account earning interest, the interest thus earned has to be reported as a credit to the grantee adjustable towards further installments of grant.

3.7 Operation & Maintenance:

(a) Assets created under the GAP/ NRCP shall be handed over to the local body after completion and construction agency shall continue to maintain assets on contract basis till such time the local body acquires the necessary technical expertise for this purpose.

(b) Local communities shall be involved in the operation and maintenance of non-core schemes.

LUCKNOW

3.8 Miscellaneous:

Any staff that may be employed for preparation, execution or operation of the project by the implementing agency are not to be treated as employees of the Government of India. They shall be governed solely by the rules of the grantee with respect to all matters including terms and tenure of service. The deployment of such staff at the time of completion or termination of the project will not be the concern or responsibility of the Government of India.

4. The Drawing and Disbursing Officer, National River Conservation Directorate, Ministry of Environment & Forests is hereby authorized to prepare and submit bill for Rs. 4,65,00,000/-(Rupees **Four crore and Sixty five lakhs only**) to Pay and Accounts Officer, Ministry of Environment & Forests, New Delhi to make payment electronically i.e. through CBs/RTGS to Managing Director, U.P. Jal Nigam, Lucknow (U.P.) whose bank details are given below:-

Name of the Impleme nting Agency	Address of Implementing Agency	Name of Bank where Account of Agency held	Name & Complete Address of the Bank Branch	MICR Code & IFSC Code	Type of Account	Account No.
U.P. Jal Nigam, Lucknow -226001	Managing Director, U.P. Jal Nigam, 6, Rana Pratap Marg, Lucknow-226001	Union Bank of India	Union Bank of India, Hazaratganj Branch, 29-Hazaratganj, Lucknow	MICR Code-226026002 IFSC Code – UBIN0530221	Saving Bank	30220201070112 2

5. This is a recurring grant and the unspent balance of Rs.175.25 lakh as on 1.1.2008 has been taken into consideration while releasing the current instalment of funds. A copy of the Utilization Certificates for the year 2007-08 (quarters ending June, September & December, 2007) alongwith the previous earlier sanction order dated 4th May, 2007 is enclosed. The grantee institution is a State Government Body.

6. The funds for expenditure on the scheme would be debitable to the Major Head '3435', 04. 101. 06. 02. 31- Grants-in-Aid (Other Schemes)- National River Conservation Plan under Demand No. 30-Ministry of Environment & Forests for the financial year 2007-08 (Plan).

7. In case of violation of any of these conditions of the grant or in case of closure or dissolution of the grantee organization, the Government shall take possession of all the assets of the organization acquired out of the Government grants and use them in any manner deemed appropriate or to recover from the organization the value of such assets at its discretion.

29

8. This issues under the powers delegated to the Ministry of Environment & Forests and with the approval of Minister of State (Environment) in the Ministry of Environment & Forests as well as with the concurrence of IFD vide their Dy. No.430/SS(FA)/F/08 dated 10-3-2008

Yours faithfully,

(M.L. Parashar)
Under Secretary to the Govt. of India

Copy for information and necessary action to :-

1. DDO, NRCD- 2 copies.
2. Jt.Director of Audit-II, Commercial, Scientific & Misc.Works AGCR Building I.P.Estate, New Delhi
3. Chief Secretary, Govt.of U.P., Sachivalaya, "Annex", Lucknow(UP).
4. Prinicipal Secretary, Department of Urban Development, Govt. of Uttar Pradesh, Sachivalaya, "Bapu Bhavan" Lucknow (UP)
5. Managing Director, U.P. Jal Nigam, 6, Rana Pratap Marg, Lucknow (UP).
6. Chief Engineer (Ganga), U.P. Jal Nigam, 6, Rana Pratap Marg, Lucknow.
7. General Manager, Gomti Pollution Control Unit U.P. Jal Nigam, River Bank Colonies, Near Suraj Kund, Lucknow (U.P)
8. The District Magistrate, Lucknow (U.P)
9. Dir(HA)/Dir(BS)/DD(SS)/US(Fin)/US(P)/Computer Cell
10. Sanction Folder/Guard File.

(M.L.Parashar).
Under Secretary to the Govt. of India.

ANNEXURE NO. A-5 1105 57

~~1014~~

संख्या- 3932-सीजीए/नौ-5-2008-11(162)/2000

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 21 मई, 2008

विषयः गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत लखनऊ नगर हेतु राज्यांश स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 664सीजीए/नौ-5-07-11(162)/2000, दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत लखनऊ नगर हेतु रू0 263.04 करोड़ की अनुमोदित योजना के सापेक्ष भारत सरकार के आदेश संख्या- एम-14014/3/2003-एनआरसीडी-।।, दिनांक 28 मार्च, 2008 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश रू0 465.00 लाख के सापेक्ष राज्यांश (30 प्रतिशत) **रू0 1,99,28,600/- (रू0 एक करोड़ निन्नान्वे लाख अट्ठाईस हजार छः सौ मात्र)** की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2008-09 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है :-

1. उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा विशेष सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बिल प्रस्तुत करके लखनऊ कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
2. प्रश्नगत धनराशि भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है। उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक में नहीं रखा जायेगा।
4. विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्तें निर्धारित की गयी थीं, उन्हीं शर्तो के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
5. प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। अन्य कार्यों पर नहीं किया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

Oath Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-800-अन्य व्यय-03-आदर्श नगर विकास योजना-48-पूंजीगत व्यय के लिये सहायक अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8-2057-दस/08 दिनांक 21 मई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकर (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग।
8. नियोजन अनुभाग-3, 4।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

Oath Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

Phone : (Office) 0522-2287068
(Office) 0522-2286471
Fax : (Office) 0522-2287233
E-mail : upgwd@rediffmail.com
Website : http://gwd.up.nic.in

प्रेषक,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश
9वॉ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

विशेष सचिव,
नगर विकास अनुभाग–5,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

पत्रॉक– 2529 /भू0ज0वि0/एस–26 दिनॉक/लखनऊ/मई 21 2008

विषय– जनहित याचिका संख्या : 4436(एम/बी)/2003 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाम, उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ ब्रेंच लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक30–4–2008 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–3661/9–5–2008–4रिट/2007, दिनांक–14–5–2008 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक–19–5–2008 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–30–4–2008 में विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की जो सूचना पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या–65जी/भू0ज0वि0/एस–26, दिनांक–23–4–2008 द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई है के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं हे। उक्त सूचना ही अद्यतन है।सुलभ संदर्भ हेतु पुनः उक्त प्रेषित पत्र दिनांक–23–4–2008 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एम0एम0 अंसारी)
निदेशक ।

संख्या– /भू0ज0वि0/तादिनांक।

21/05/08

प्रतिलिपि अनु सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग,अनुभाग–1,उ0प्र0 शासन, लखनऊ को नगर विकास अनुभाग–5 के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक–19–5–2008 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

(एम0एम0 अंसारी)
निदेशक ।

-30- 1108 1017 60

Phone: (Office) 0522-2287068
(Office) 0522- 2286471
Fax : (Office) 0522- 2287233
E-mail: up.gwd@rediffmail.com
Website:http://gwd.up.nic.in

प्रेषक,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश
नवां तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

विशेष सचिव,
नगर विकास अनुभाग–5
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

पत्रांक– 65 जी /भू0ज0वि0/ एस0-26, दिनांक/लखनऊ/अप्रैल 23, 2008

विषय– जनहित याचिका संख्या–4436(एम0/बी0)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, द्वारा पारित आदेश दिनांक–27–3–2008 का अनुपालन कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक नगर विकास अनुभाग–5,उ0प्र0 शासन के पत्रांक–21रिट /9–5–2008–4 रिट /2007, दिनांक–11–4–08 के संदर्भ में जनहित याचिका संख्या–4436(एम0/बी0)/2003 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–27–3–08 में उल्लिखित विषयों में से भूगर्भ जल विभाग द्वारा विभाग से सम्बन्धित विषय पर कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति तैयार कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एम0एम0 असीम)
निदेशक।

संख्या– /भू0ज0वि0/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु अद्यतन स्थिति के साथ प्रेषित है।

1– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय,लखनऊ खण्डपीठ को कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति के साथ प्रेषित ।

2– अनु सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग,अनुभाग–1उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(एम0एम0 असीम)
निदेशक।

Civil Secretariat

जनहित याचिका संख्या – 4436(एमबी)/2003 में दिनांक 27–3–08 को पारित मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विभाग से सम्बन्धित बिन्दु पर आख्या :

1 भूगर्भ जल विभाग द्वारा लखनऊ नगर में भूजल स्तर के नियमित अनुश्रवण/मापन हेतु 59 पीजोमीटर की स्थापना वित्तीय वर्ष 2005–06 में की गयी है। इस भूजल स्तर अनुश्रवण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जल स्तर गिरावट सम्बन्धी परिणाम/निष्कर्ष का आंकलन 3–4 वर्षों के सतत अनुश्रवण के पश्चात् ही किया जा सकेगा। (छाया प्रति संलग्नक–1)

2– इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भूमि जल परिषद द्वारा भी लखनऊ नगर में पीजोमीटर के माध्यम से वर्ष 2003 से भूजल स्तर का सतत् अनुश्रवण किया जा रहा है, जिससे प्राप्त सूचना/आंकड़ों के अनुसार लखनऊ नगर में मई 2003 से मई 2007 के मध्य विभिन्न स्थलों पर 0.31 मी0 से 1.52 मी0 तक की वार्षिक औसत भूजल स्तर गिरावट दर्ज की गयी है।(छाया प्रति संलग्नक–2)

3– नगरीय क्षेत्रों में भूजल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु वर्षा जल संचयन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली को अपनाये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा पूर्व में समय–समय पर विभिन्न शासनादेश निर्गत किये गये हैं, जिनके प्राविधानों में कतिपय आवश्यक संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या–यू0ओ0 35/आठ–1–2005, दिनांक 25–4–2006 (छायाप्रति संलग्नक–3) निर्गत किया गया है, जिसमें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अपनाये जाने हेतु विभिन्न प्राविधान/व्यवस्थाएं लागू की गयी हैं। इस शासनादेश के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक तालाबों, पोखरों, जलाशयों आदि का संरक्षण किये जाने के निर्देश दिये जाने के साथ विभिन्न व्यवस्थाएं लागू की गयी हैं। इसके अतिरिक्त नवनिर्मित होने वाले समस्त उपयोगों के भवनों में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित किये जाने के निर्देश विभिन्न प्राविधानों के साथ दिये गये हैं। इसके अन्तर्गत 200 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल के नव निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 200 वर्ग मी0 से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों में ग्रुप रिचार्ज स्कीम स्थापित कराने का प्राविधान भी किया गया है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में निर्मित होने वाली आवासीय योजनाओं में जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवेज नेटवर्क के साथ–साथ रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूजल रिचार्ज हेतु पृथक

नेटवर्क का प्राविधान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में भी आवश्यक संशोधन किये जा चुके हैं तथा इसके कियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश समस्त विकास प्राधिकरणों व अन्य सम्बन्धित को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के स्तर से दिये जा चुके हैं।

4— शासनादेश के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत लखनऊ नगर में संकलित सूचना के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा अभी तक 62 शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा चुकी है।(छाया प्रति संलग्नक–4)

5— उत्तर प्रदेश में गिरते भूजल स्तर की समस्या के परिपेक्ष्य में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं भूजल रिचार्ज सम्बन्धी कार्यकमों को गति प्रदान करने व नियमित समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। समिति से संबंधित कतिपय बैठकों के कार्यवृत्तों की छाया प्रति संलग्न है। (छाया प्रति संलग्नक–5)

6— प्रदेश में सिंचाई, पेयजल व उद्योगों हेतु भूगर्भ जल के दोहन के कारण गिरते भूजल स्तर को रोकने तथा वॉटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाये जाने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।(छाया प्रति संलग्नक–6)

(एम० एम० अंसारी)
निदेशक
भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०
चतुर्थ तल, इन्दिरा भवन
लखनऊ

Civil Commissioner LUCKNOW

WATER LEVEL DATA AND LIST OF PIEZOMETER IN LUCKNOW CITY

	Location of Piezometer	R.L OF PIEZOMETER	Premonsoon Water level 2006 bgl in mts	Post Monsoon Water level 2006 bgl in mts	Premonsoon Water level 2007 bgl in mts	Comperative Water leveldecline Between Premonsoon06-07
1	MATIYARI	118.200	-	6.45	8.650	
2	MAHANAGAR P.O	112.050	-	24.62	26.270	
3	INDIRA NAGAR	118.265	-		CHOKE	
4	KUKRAIL FOREST	117.660	-	18.65	19.600	
5	P.M S CHINHAT	115.730	-	9.35	9.600	
6	PRIMARY KHURAM NAGAR	115.490	-		CHOKE	
7	PRIMARY ISMAILGANJ	116.010	-	18.07	20.320	
8	PRIMARYSCHOOLTAKROHI	120.390	-	13.40	15.550	
9	AMRAIGAON	117.235	-	7.85	11.150	
10	RAHIM NAGAR	114.234	-	26.80	28.330	
11	GOMATI NAGAR	108.160	-	14.82	17.070	
12	K.B.A GOMATI NAGAR	108.115	-	18.12	19.870	
13	MAKDUMPUR	111.895	-	13.95	16.250	
14	H.A.L CAMPUS	117.565	-	30.25	31.350	
15	MARGAPURGOMATINAGAR	114.310	-	12.90	14.750	
16	[illegible]ESI MAU	114.210	-	13.62	15.570	
17	CHA[illegible]AMLHAUR	116.905	-	12.00	13.200	
18	PRIMARY BHARWARA	106.030	-	13.50	14.750	
19	I.E.T SITAPUR RD	117.640	-	15.20	15.900	
20	K.V.A KURSIROAD	118.510	-	12.00	16.050	
21	R.S.C ALIGANJ	116.820	-	16.00	16.650	
22	H.L.S.PURNIA SITAPUR	116.855	-	22.36	23.550	
23	SHIA COLLEGE	117.745	-	18.15	CHOKE	
24	TRIVENI NAGAR	110.320	-	16.55	17.850	
25	SEMARA GARHI	118.330	-	12.90	13.900	
26	SUGAMAU	118.875	-	13.00	14.100	
27	FAIJULLAH GANJ	111.965	-	10.40	11.200	
28	GAZIPUR BALRAM	109.405	-	3.90	4.800	
29	SPORTS COLLEGE	116.560	-	9.00	9.700	
30	DINDAYAL NAGAR	113.060	-	14.95	15.650	
31	L.D.A LALBAGH	114.166	30.29	24.90	30.660	-0.37
32	CANTOMENT SADAR	121.060	38.34	39.10	39.500	-1.16
33	NILMATHA	118.781	18.15	16.50	17.500	0.65
34	LALKURTI	121.451	25.00	24.30	25.350	-0.35
35	SULTANPURRDMOHANGANJ	111.821	11.36	12.20	13.100	-1.74
36	TELIBAGH PASIYANA	121.161	18.63	18.35	19.700	-1.07
37	P.G.I UTERATHIYA	121.456	12.58	10.20	12.070	0.51
38	ASHBAGH	115.731	26.14		CHOKE	
39	TURIAGANJ	116.971	25.16	25.50	27.000	-1.84
40	NAUBASTA	116.366	25.06	20.00	26.700	-1.64
41	LAWMART COLLEGE	110.796	21.16	20.60	21.400	-0.24
42	[illegible]ARHI	112.466	30.38	31.35	31.850	-1.47
43	VIJALIPASI KILA	121.711	20.16	19.97	CHOKE	
44	ALAMBAGH MAUNIBABA	120.216	36.35	35.75	36.700	-0.35
45	[illegible].S ALAMBAGH	122.711	29.56	29.20	30.050	-0.49
46	CHAUK VICTORIAPARK	116.451	18.19	17.34	18.150	0.04
47	THAKURGANJHAYATNAGAR	105.266	6.89	6.15	6.200	0.69
48	BARAKALAN PEERNAGAR	114.546	18.40	17.67	17.500	0.90
49	MADHOPUR	115.756	22.15	21.25	21.750	0.40
50	PARA THAKURGANJ	117.151	22.48	21.82	22.750	-0.27
51	JALALPUR CROSSING	117.582	31.54	30.30	31.450	0.09
52	MAKKAKHERA	121.056	11.83	10.76	11.100	0.73
53	RAHIMABAD	120.011	14.15	13.87	13.000	1.15
54	AMAUSI INDIAN OIL	122.851	14.46	13.95	13.150	1.31
55	AIRPORT AMAUSI	123.556	14.85	14.01	14.550	0.30
56	AURANGABAD BIJNOR	120.336	9.52	9.00	10.850	-1.33
57	SALEH NAGAR BIJNOR	121.986	24.16	20.90	21.450	2.71
58	DURGA MANDIR JAILRD	121.811	24	22.95	21.250	2.33
59	SUNHARA ALINAGAR	123.361	18.25	17.88	19.400	-1.15

संलग्नक (2)

Depth of Ground Water Level & Declining Trend in Lucknow City

S. No.	Location of Peizometer	Depth to Ground Water Level (M.bgl)		Comparative Ground Water Level Decline (M)	Average Annual GW Level Decline (M.)
		May 2003	May 2007		
1	2	3	4	5	6
	Cis Gomti Area				
1	Arya Nagar	20.13	21.40	1.27	0.31
2	Diskusha	29.60	30.90	1.30	0.32
3	Gulista Colony	28.82	31.30	2.48	0.62
4	PQS Phase Cantooment	17.99	21.08	3.09	0.77
5	Rajajipuram	25.55	28.60	3.05	0.76
6	Narhi	27.05	31.00	3.95	0.98
8	Sarojini Nagar	10.07	12.10	2.03	0.50
9	River Bank Colony	19.63	22.12	2.49	0.62
10	Ganesh Ganj	15.00	--	--	--
11	Mahila College	13.00	15.80	2.80	0.70
12	Victoria Park	15.98	--	--	--
	Trans Gomti Area				
13	Lucknow University (Old Campus)	24.94	27.51	2.56	0.64
14	Gomti Nagar	15.47	21.35	6.08	1.52
15	Indira Nagar	21.49	26.13	4.64	1.15
16	Nirala Nagar	26.30	29.55	3.25	0.81
17	Vikas Nagar	22.06	25.73	3.67	0.91
18	Maha Nagar	24.05	27.30	3.25	0.81
19	Lucknow University (New Campus)	11.17	13.20	2.03	0.50
20	New Hyderabad	19.21	21.90	2.69	0.67
21	Bhujal Bhawan	16.06	18.42	2.36	0.59

(स्रोत: सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड)

Oath Comm. Amin LUCKNOW

संलग्नक-4

क्र0 सं0	जनपद का नाम	शासनादेश सं0 1730ए, दिनॉक 12 अप्रैल 2001 से पूर्व निर्मित भवन			शासनादेश सं0 1730ए, दिनॉक 12 अप्रैल 2001 के उपरान्त निर्मित भवन			वर्तमान में निर्माणाधीन भवन				अभ्युक्ति
		विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है	विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है	विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की जा रही है/ प्रस्तावित है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	लखनऊ मण्डल											
1	लखनऊ	लोक निर्माण विभाग	6	—				राज्य हज समिति (हज हाऊस)	सी0एण्ड डी0 एस0, जल निगम	1	1	
		राज्य सम्पत्ति विभाग	38	6				पी0जी0आई0 (आवासीय भवन, टेलीमेडिसिन एवं हिमेटोलाजी भवन)	सी0एण्ड डी0 एस0, जल निगम	4	4	
		सिंचाई विभाग	5	—				स्वास्थ्य विभाग (रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय)	सी0एण्ड डी0 एस0, जल निगम	1	1	
		वाल्मी	1	—				के0जी0 डेन्टल यूनिवर्सिटी (कर्मचारी क्वाटर)	सी0एण्ड डी0 एस0, जल निगम	1	1	
		नगर निगम	1	1								
		कलेक्ट्रेट	1	1								
		मण्डलायुक्त	1	1								
		जल निगम	5	2								
		कृषि विभाग	1	—								
		राज्य कृषि प्रबंध संस्थान (रहमानखेड़ा)	3	—								
		कल्याण मण्डप (नगर निगम)	1	1								
		प्राविधिक शिक्षा विभाग (पालीटेक्निक)	25	8				प्राविधिक शिक्षा विभाग (आई0ई0टी0)	राजकीय निर्माण निगम	2	—	
		लखनऊ विकास प्राधिकरण	12	8	लखनऊ विकास प्राधिकरण	3	3					
		आवास विकास परिषद	8	6								
		खेल विभाग	6	2—चौक एवं राजाजीपुरम स्टेडियम								

क्र0 सं0	जनपद का नाम	शासनादेश सं0 1730ए दिनॉक 12 अप्रैल 2001 से पूर्व निर्मित भवन			शासनादेश सं0 1730ए, दिनॉक 12 अप्रैल 2001 के उपरान्त निर्मित भवन			वर्तमान में निर्माणाधीन भवन				अवधि
		विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है	विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है	विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की जा रही है/ प्रस्तावित है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		कारागार विभाग (जिला व सेन्ट्रल जेल एवं मुख्यालय)	3	—								
		चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	12	—								
		पुलिस विभाग	12	—				होमगार्ड्स विभाग (जेल रोड)	राजकीय निर्माण निगम	2	—	
		राजस्व विभाग	1	—								
		भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	1	—								
		वन विभाग	13	—								
					पर्यटन विभाग	2	—					
		जनपद न्यायालय	4	—								
		उच्च न्यायालय	1	—								
					भूमि सुधार निगम (भूमित्व भवन)	1	—					
					मण्डी परिषद	3	—					
		सहकारिता विभाग	2	—								
		गन्ना विभाग	2	—								
		व्यापार कर विभाग	4	—								
		पशुपालन विभाग	7	—	पशुपालन विभाग	1	—	पशुपालन विभाग	राजकीय निर्माण निगम	2	2	
		चिकित्सा शिक्षा विभाग	14	—	चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल यूनिवर्सिटी)	1	—					
		संस्कृति विभाग	2	—	संस्कृति विभाग	2	—					
		पर्यावरण विभाग	1	—								
		समाज कल्याण विभाग	1	—								
		उद्यान विभाग	4	—				उद्यान विभाग	—	4	4	
		ऊर्जा विभाग	8	—								

क्र0 सं0	जनपद का नाम	शासनादेश सं0 1730ए दिनांक 12 अप्रैल 2001 से पूर्व निर्मित भवन			शासनादेश सं0 1730ए, दिनांक 12 अप्रैल 2001 के उपरान्त निर्मित भवन			वर्तमान में निर्माणाधीन भवन				अधिशेष
		विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है	विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है	विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की जा रही है/ प्रस्तावित है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		लखनऊ विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग)	15	1 ऑशिक								
		पिकप भवन	1	—								
		केन्द्रीय भूजल बोर्ड	1	1								
		एनबीआरआई	2	1								
		सीडीआरआई	2	—								
		आईटीआरसी	1	—								
		सिमैप	1	—								
		दूरदर्शन	2	—	दूरदर्शन	1	1					
					यूपीआईएल	2	2					
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	3	1								
		भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण	4	1								
		उ0प्र0 लोक सेवा आयोग	1	—								
		प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी	1	—								
					रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन	1	—					
		रेलवे विभाग	8	—				आंचलिक विज्ञान केन्द्र	—	1	—	
		राजकीय निर्माण निगम	1	—								
		पोस्ट एवं टेलीग्राफ विभाग	8	—								
					ललित कला अकादमी	1	—					
		विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग	3	1	विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग	1	1					
		आयकर विभाग	2	—				उ0प्र0 सहकारी आवास संघलि0	जल निगम	1	1	
		सहकारी ग्राम्य विकास बैंक	1	—								

क्र0 सं0	जनपद का नाम	शासनादेश सं0 1730ए दिनॉक 12 अप्रैल 2001 से पूर्व निर्मित भवन			शासनादेश सं0 1730ए, दिनॉक 12 अप्रैल 2001 के उपरान्त निर्मित भवन			वर्तमान में निर्माणाधीन भवन				अस्थिकित
		विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है	विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है	विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की जा रही है/ प्रस्तावित है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		एकल श्रमजीवी महिला आवास योजना (महिला कल्याण सीतापुर रोड)	1	—								
		लघु सिंचाई विभाग (बक्शी का तालाब)	1	1								
		उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0	1	—								
		निरालानगर पोस्ट आफिस	1	1								
		अलीगंज पोस्ट आफिस	1	1								
		उद्योग विभाग	1	1								
		प्राथमिक विद्यालय निरालानगर(शिक्षा विभाग)	1	1								
		प्राथमिक विद्यालय निषातगंज(शिक्षा विभाग)	1	1								
		राजकीय मुद्रणालय	1	—								
					वन निगम	2	—					
		राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन, श्रम विभाग)	4	—								
		राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	1	—								
		उ0प्र0 वन निगम मुख्यालय	2	—								
		उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय	24	—								
		खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (ग्रामोद्योग भवन)	1	—								
					एस0पी0एल0एम0	1	1					
		योग	302	45		22	8			19	14	

संलग्नक (4)

उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–1

संख्या – 1140 (1)/62.1.2004, दिनांक : 12 जुलाई, 2004

कार्यालय–ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में 'एक्सनोरा इन्नोवेटर्स क्लब' लखनऊ द्वारा दाखिल की गयी जनहित रिट याचिका संख्या–2409ध्2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.05.04 के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.04 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रदेश में गिरते भू–जल स्तर की समस्या पर सम्यक विचारोपरान्त रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों को गति प्रदान करने एवं उनकी नियमित समीक्षा करने के उद्देश्य से एक 'कार्यकारी कमेटी' का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके सदस्य सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव होंगे।

उपर्युक्त लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त प्रयोजनार्थ निम्न प्रकार 'कार्यकारी कमेटी' का गठन किया जाता है–

1.	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
3.	औद्योगिक विकास आयुक्त	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रा0अभि0सेवा	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन	सदस्य
14.	प्रमुख सचिव/सचिव, वन, उ0प्र0 शासन	सदस्य
15.	प्रमुख सचिव/सचिव, मत्स्य, उ0प्र0 शासन	सदस्य

चूँकि भूगर्भ जल से सम्बन्धित कार्यों हेतु लघु सिंचाई विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 को नोडल विभाग बनाया गया है। अतः बैठक आहूत करने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वयय करने का कार्य प्रमुख सचिव/सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा किया जायेगा।

Oath Commissioner LUCKNOW

सक्त 'कार्यकारी कमेटी' की बैठक प्रत्येक माह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उनके सभाकक्ष में आयोजित की ी। यदि किन्हीं कारणों से मुख्य सचिव, उपलब्ध न हों, तो वरिष्ठतम् सदस्य/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बैठक न होगी।

सभी सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि प्रतिमाह आयोजित होने वाली समिति की बैठकों में निर्धारित समय पर लेने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वी0के0 मित्तल)
मुख्य सचिव।

या- 1140 (2)/(62-1-2004 तद्दिनांक-

लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, सिंचाई, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव, वन, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव/सचिव, मत्स्य, उ0प्र0 शासन।
14. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।

आज्ञा से,

ह0/-

(प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी)

प्रमुख सचिव

Oath Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

1119 1028 71

(166)

A-7AR. Comm Land

07/03/06

प्रदेश में वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु गठित कार्यकारी समिति की कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 24–2–2006 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थिति :–

बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की सूची संलग्न है।

प्रमुख सचिव,लघु सिंचाई द्वारा कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक–31–5–2005 में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या से समिति को विस्तार से अवगत कराया गया। साथ ही बैठक हेतु निर्धारित अन्य एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा हुई तथा चर्चा के उपरान्त निम्न निर्णय लिए गए :–

1– अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज का न्याय पंचायतवार एक्शन प्लान :

यह निर्देश दिए गए कि 50 अतिदोहित/क्रिटिकल विकासखण्डों से सम्बन्धित 20 जनपदों के जिलाधिकारियों को उक्त सम्बन्ध में पूर्व में भेजे गए पत्र के क्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त के हस्ताक्षर से तत्काल अनुस्मरण पत्र भेजा जाय जिसका प्रभावी अनुश्रवण भी किया जाय।

(कार्यवाही–लघु सिंचाई विभाग)

2– रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्ज कार्यक्रमों की वित्तीय/भौतिक प्रगति:

यह निर्देश दिए गए कि सभी विभाग 28–2–2006 तक की रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्ज कार्यक्रमों की वित्तीय/भौतिक प्रगति निर्धारित रूप पत्र पर शासन के लघु सिंचाई एवं निदेशक,भूगर्भ जल विभाग को उपलब्ध करा दें; निर्धारित रूप पत्र पुनः संलग्न है।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित विभाग)

3– रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्ज कार्यक्रमों की वर्ष 2006–07 की कार्य योजना:

यह निर्देश दिए गए कि सभी सम्बन्धित विभाग अगले वित्तीय वर्ष 2006–07 की रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय कार्य योजना निर्धारित रूप पत्र पर शासन के लघु सिंचाई विभाग तथा निदेशक,भूगर्भ जल विभाग को दिनांक–20–3–2006 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दें। कार्ययोजना प्रेषण से सम्बन्धित रूप पत्र पुनः संलग्न है।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित विभाग)

4– रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर,उ0प्र0 द्वारा वाटर शेड एवं वाटर बाडीज से सम्बन्धित सूचनायें एवं मानचित्र उपलब्ध कराया जाना :

यह निर्देश दिए गए कि विज्ञान एवं प्रोद्यौगिक विभाग उक्त सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक धनराशि का विवरण तत्काल निदेशक,भूगर्भ जल विभाग को उपलब्ध करा दें । इसके अतिरिक्त निदेशक,भूगर्भ जल विभाग जलसंसाधन मंत्रालय,भारत सरकार से दूरभाष पर सम्पर्क कर यह ज्ञात करें कि उपरोक्त के

सम्बन्ध में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कोई बुकलेट विकासखण्डवार तैयार की है । यदि इस प्रकार की कोई बुकलेट जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तैयार की तो किसी अधिकारी को भेजकर उसे प्राप्त कर उसकी उपयोगिता देख ली जाय। इसी भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी वेस्ट लैण्ड डेटा बुकलेट भी भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग से प्राप्त कर निदेशक,भूगर्भ जल विभाग उसकी भी उपयोगिता देख लें ।

(कार्यवाही –सचिव,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
निदेशक,भूगर्भ जल विभाग)

5–औद्योगिक परिसरों में भूजल स्तर एवं भूजल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग :

उ0प्र0 प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया कि बड़े उद्योगों में उक्त हेतु 25 पीजोमीटर स्थापित हो गये हैं । यह संख्या बहुत कम है । यह निर्देश दिए गए कि जो उद्योग पीजोमीटर स्थापित नहीं कर रहे हैं उन्हें वाटर एक्ट के अन्तर्गत नोटिस देकर अग्रिम कार्यवाही की जाय । साथ ही स्थापित पीजोमीटर से जल के नमूने लेकर उनका रसायनिक विश्लेषण भी कराया जाय ताकि जल की गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण हो सके । उ0प्र0 प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाय तथा दिनांक–28–2–2006 तक वर्ष 2005–06में किए गए कार्यो की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित रूप पत्र पर शासन के लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग को उपलब्ध करायी जाय। इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त स्थापित किये गये पीजोमीटर की लोकेशन निर्देशक , भूगर्भ जल विभाग को भी उपलब्ध कराई जाय ताकि भूगर्भ जल विभाग द्वारा भूजल स्तर एवं गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण किया जा सके।

(कार्यवाही–सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

6– राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज विधा के विशेषज्ञों की सूची प्रचालित कराया जाना :

यह निर्देश दिए गए कि उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित अभियन्त्रण विभाग/ निर्माण एजेंसीज के सहायक अभियन्ता एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को नामित करने हेतु सम्बन्धित विभागों से उनकी सूची प्राप्त कर ली जाये।

(कार्यवाही– प्रमुख सचिव,लघु सिंचाई
,निदेशक,भूगर्भ जल विभाग,समस्त
अभियंत्रण विभाग/निर्माण एजेन्सी)

7–जिला स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति की बैठक एवं वर्षा जल संचयन तथा भूगर्भ जल रिचार्ज का जनपद स्तरीय दीर्घकालीन एक्शन प्लान :

कई जनपदों में जनपद स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति की बैठकें नियमित रूप से प्रत्येक माह में नहीं हो रही हैं और किसी भी जनपद का दीर्घकालीन एक्शन प्लान अभी तक नहीं बना है। इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिए गए कि इसका सघन अनुश्रवण किया जाय । तकनीकी समन्वय समिति के संयोजक अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई हैं । इसलिए मुख्य अभियन्ता,लघु सिंचाई विभाग द्वारा इसका प्रत्येक माह सघन अनुश्रवण किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि आवश्यकतानुसार

LUCKNOW

प्रत्येक जनपद का दीर्घकालीन एक्शन प्लान प्रत्येक दशा में 30–4–2006 तक तैयार कर लिया जाय ।

(कार्यवाही– मुख्य अभियन्ता,लघु सिंचाई विभाग,
निदेशक,भूगर्भ जल विभाग)

इसके अतिरिक्त यह निर्देश भी दिए गए कि आगरा जनपद के लिए रू0 231.00 करोड. की जो एकीकृत योजना तैयार कर भारत सरकार को वित्त पोषण हेतु भेजी गयी है,में चिन्हित कार्यो का कियान्वयन विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध धनराशि की डवटेलिंग करके किया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव/मा0 मुख्य मंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासनादेश निर्गत किया जाय ।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव,लघु सिंचाई विभाग)

8– लखनऊ/कानपुर/आगरा तथा गाजियाबाद के शहरी क्षेत्रों तथा अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में न्याय पंचायतवार रेन वाटर हार्वेस्टिंग /रिचार्जिंग योजनाओं की संरचना :

उक्त सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि उक्त हेतु योजनाओं की संरचना,आगरा जनपद की तैयार की गई योजना की भॉति लघु सिंचाई विभाग एवं भूगर्भ जल विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से तैयार की जाये। मुख्य अभियंता लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल उक्त हेतु संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगें और माह–अप्रैल,2006 के अन्त तक योजनायें बनवाकर प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही– मुख्य अभियंता,लघु सिंचाई,
निदेशक, भूगर्भ जल विभाग)

9–शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना :

(1) उपलब्ध प्रगति विवरण के अनुसार सभी शासकीय भवनों में अभी भी उक्त पद्धति की स्थापना नहीं हुई है। वर्तमान में निर्माणाधीन सभी शासकीय भवनों में यह पद्धति प्रस्तावित नहीं है। इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि सभी सम्बन्धित विभागों एवं निर्माण एजेन्सीज को पत्र भेजे जायें तथा प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई, मार्च,2006 में दिनांक–13–3–2006 से पूर्व सभी सम्बन्धित विभागों एवं निर्माण एजेन्सीज के साथ समीक्षा बैठक कर स्थिति से अवगत करायें।

(2) उक्त सम्बन्ध में यह निदेश भी दिए गये कि जिन नवनिर्मित हो रहे शासकीय भवनों में उक्त पद्धति प्रस्तावित नहीं है उनमें विद्युत संयोजन तब तक न दिया जाय जब तक उक्त पद्धति की स्थापना नहीं कर दी जाती है। उक्त सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग उच्चादेश प्राप्त कर शासनादेश निर्गत करें। शासनादेश निर्गत करने से पूर्व उसका ड्राफ्ट लघु सिंचाई विभाग को भी दिखा दिया जाये।

(कार्यवाही– ऊर्जा विभाग)

(3) यह निदेश भी दिए गये हैं कि सभी विभाग अपने अधीन शासकीय भवनों में नगरवार एवं भवनवार रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की

Oath Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से शासन के लघु सिंचाई एवं निदेशक,भूगर्भ जल विभाग को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही–सम्बन्धित विभाग)

(4) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, अधिशासी अभियंता, बरेली को निर्देशित करें कि वे मुरादाबाद में वर्तमान में निर्मित किये जा रहे नव निर्मित कुल 141 भवनों जिनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित की गई/प्रस्तावित है में से 10 प्रतिशत भवनों का निरीक्षण कर यह रिपोर्ट दिनांक–01–3–2006 तक दें कि उक्त पद्धति स्थापित की जा रही है/ की गई है अथवा नहीं और भली भॉति कार्य कर रही है अथवा नहीं।

(कार्यवाही –निदेशक, भूगर्भ जल विभाग)

(5) यह निर्देश भी दिये गये कि लखनऊ में जिन भवनों में उक्त पद्धति स्थापित की गई है, उसका निदेशक, भूगर्भ जल विभाग द्वारा सूचना निदेशालय,के माध्यम से मुख्य समाचार पत्र के संवाददाताओं एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के संवाददाताओं को दिखाकर इसका समुचित प्रचार प्रसार किया जाय। यह कार्य दिनांक–10–3–2006 से पूर्व कर लिया जाय। इसके अतिरिक्त निदेशक भूगर्भ जल विभाग को यह भी निर्देश दिये गये कि वे श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन (सचिवालय,एनेक्सी) में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना का कार्य 31–5–2006 तक अवश्य पूर्ण करा दें तथा इसका उद्घाटन आगामी 10,जून,2006 को आयोजित होने वाले भूजल दिवस के अवसर पर मा0 मुख्य मंत्री जी से कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– निदेशक, भूगर्भ जल विभाग,
सूचना निदेशक)

10–ग्रुप रिचार्ज स्कीमः

यह निर्देश दिये गये कि नई आवासीय योजनाओं में वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज हेतु ग्रुप रिचार्ज स्कीम के सम्बन्ध में आवास तथा शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्गत किया जाने वाला शासनादेश यथाशीघ्र निर्गत किया जाय।

(कार्यवाही– आवास विभाग एवं
शहरी नियोजन विकास)

11–स्कूल कालेज के पाठ्यक्रमों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक विषय/अध्याय के रूप में सम्मिलित किया जानाः

उक्त सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि बेसिक शिक्षा विभाग से निम्न सूचना प्राप्त कर अवगत कराया जाये–

1–उक्त से सम्बन्धित पुस्तक की मास्टर कापी कब तक तैयार होगी?
2–मास्टर कापी प्रेस में छपने कब जायेगी ?
3–सम्बन्धित पुस्तक कब प्रिन्ट होकर प्राप्त होगी ?

(कार्यवाही– लघु सिंचाई विभाग,
बेसिक शिक्षा विभाग)

12—वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु सम्ब विभागों द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाना :

यह निर्देश दिये गये कि सभी सम्बन्धित वि शासन स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर तथा निगमों, विकास प्राधिकरणों, औद्यो विकास प्राधिकरणों के मुख्यालय स्तर पर एक—एक नोडल अधि दिनांक—27—2—2006 तक नामित कर दें और उनके नाम,पदनाम,पता व दू नम्बर प्रमुख सचिव,लघु सिंचाई तथा निदेशक, भूगर्भ जल विभाग को उपलब्ध दें। नामित नोडल अधिकारियों को यह भी निर्देश दे दिये जाये कि सम्ब सूचनाओं का संकलित विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से प्रेषित करें ।

(कार्यवाही—समस्त सम्बन्धित विभा

13—ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं में वर्षा संचयन हेतु मात्राकृत धनराशि को अतिदोहित /क्रिटिकल विकास खण्डों प्राथमिकता पर आवंटित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किया जाना।

उक्त सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये ग्राम्य विकास विभाग दिन 28—2—2006 तक शासनादेश निर्गत कर अवगत करायें।

(कार्यवाही—ग्राम्य विकास विभा

अनुमोदित।

(कृषि उत्पादन आयुक्त)

LUCKNOW

-54- 1124 1235 76

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–1
उत्तर प्रदेश शासन,
संख्या–467 /62–1–2006–76WP/2006
लखनऊ/दिनांक 03 मार्च, 2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– औद्योगिक विकास आयुक्त।
2– प्रमुख सचिव,वित्त,उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव,पर्यावरण,उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव/सचिव,लघु सिंचाई एवं ग्रा0अभि0सेवा।
5– प्रमुख सचिव/सचिव,सिंचाई ,उ0प्र0 शासन।
6– प्रमुख सचिव/सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन।
7– प्रमुख सचिव/सचिव,राजस्व,उ0प्र0 शासन।
8– प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास,उ0प्र0।
9– प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन।
10– सचिव,ग्राम्य विकास,उ0प्र0 शासन।
11– प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा,उ0प्र0 शासन।
12– प्रमुख सचिव/सचिव, वन,उ0प्र0 शासन।
13– प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 शासन।
14– प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज,उ0प्र0 शासन।
15– प्रमुख सचिव/सचिव,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,उ0प्र0 शासन।
16– प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि,उ0प्र0 शासन।
17– प्रमुख सचिव ,नियोजन,उ0प्र0 शासन।
18– प्रमुख सचिव/सचिव, मत्स्य,उ0प्र0 शासन।
19– सचिव, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0 शासन।
20– क्षेत्रीय निदेशक,केन्द्रीय भूजल बोर्ड,उत्तरी क्षेत्र,लखनऊ।
21– अध्यक्ष,जल निगम,उ0प्र0 लखनऊ।
22– आयुक्त,आवास एवं विकास प्राधिकरण,लखनऊ।
23– उपाध्यक्ष,लखनऊ विकास प्राधिकरण,लखनऊ।
24– निदेशक, भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0।
25– निदेशक, भारतीय विष अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
26– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग,उ0प्र0।
27– निदेशक, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0।
28– निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
29– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन।
30– स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त ,उ0प्र0 शासन।
31– सूचना निदेशक,उ0प्र0 ।

(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव ।

7 P.D.3

Oath Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं भूगर्भ जल रिचार्ज कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु गठित कार्यकारी समिति की दिनांक–24–2–2006 को कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आहूत बैठक में उपस्थिति ।

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	2	3
1	श्री अजय कुमार जोशी	प्रमुख सचित, लघु सिंचाई
2	श्री पी0एल0 लोई	प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
3	श्री जे0एस0 मिश्र	सचिव,भूमि विकास एवं जल संसाधन
4	श्री जे0एस0 दीपक	सचिव, बेसिक शिक्षा
5	श्री देवेन्द्र चौधरी	सचिव, मत्स्य
6	श्री राम शरण सिंह	सचिव, सिंचाई
7	श्री चन्द्र प्रकाश	विशेष सचिव,ग्राम्य विकास
8	श्री जी0पी0 मिश्र	विशेष सचिव, आवास
9	श्री एल0 वेंकटेश्वर लू	विशेष सचिव ,राजस्व
10	वीरेन्द्र कुमार	प्रमुख सचिव,(या0)सिंचाई विभाग
11	श्री वी0के0 अरोड़ा	अधीक्षण अभियंता,लोक निर्माण विभाग
12	श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण) उ0प्र0 जल निगम
13	प्रतिमा सिंह	ओ0एस0डी0 वन
14	डा0 जी0एन0 पाण्डेय	प्रमुख समन्वय अधिकारी,नियोजन विभाग
15	श्रीएल0वी0 सिंह श्री राधाकृष्ण सिंह	संयुक्त कृषि निदेशक विशेष सचिव, उद्योग विभाग
16	श्री सगाजीत तिवारी	अपर कृषि निदेशक, भू0स0 कृषि भवन,उ0प्र0,लखनऊ।
17	श्री बी0एल0 मीणा	वि0स0 (कृषि)
18	श्री देवेन्द्र मिश्र	वैज्ञानिक ,आर0एस0ए0सी0,उ0प्र0
19	निखत शगीम	अनुसचिव,वित्त
20	श्री पी0एन0 टण्डन	यू0पी0पी0सी0बी0
21	श्री आर0एस0 जुरैल	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई
22	श्री एम0एम0 अंसारी	निदेशक, भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0
23	श्री ए0के0 सिंह	उप निदेशक, पंचायती राज
24	श्री त्रिभुवन	वरिष्ठ जियोफिजीसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग
25	श्री पी0आर0 चौररिया	परियोजना निदेशक,लघु सिंचाई विभाग
26	श्री पी0के0 जौहरी	सहायक अभियंता, भूगर्भ जल विभाग।
27	श्री आर0एर।0 रिन्हा	हाईड्रोलाजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग ।

Govt. Control LUCKNOW Civil Secretariat

1126

(2)

(11)

प्रदेश में वर्षा जल संनयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु गठित कार्यकारी समिति की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 27.9.2006 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया (उपस्थिति सूची संलग्न है)।

सर्व प्रथम मुख्य सचिव की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ करते हुए सचिव, भूगर्भ जल एवं लघु सिंचाई द्वारा "उत्तर प्रदेश में वर्षा जल संनयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज (पुनर्भरण)" के लिए तैयार की गयी कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में उठाये गये बिन्दु इस प्रकार हैं–

- जल चक्र (हाइड्रोलाजिकल साइकिल) एवं जल उपलब्धता का "विश्वव्यापी परिदृश्य" प्रस्तुत करते हुए जानकारी दी गयी कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का मात्र 3 प्रतिशत ही शुद्ध जल स्रोत के रूप में पाया जाता है, जिसका केवल 11 प्रतिशत भाग भूगर्भ जल संसाधन के रूप में 800 मीटर की गहराई तक उपलब्ध है।
- "राष्ट्रीय परिदृश्य" के संदर्भ में बताया गया कि देश में विश्व के जल संसाधन के सापेक्ष मात्र 4 प्रतिशत जल सम्पदा ही उपलब्ध है। यह भी दर्शाया गया कि देश में प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता अत्याधिक घटकर वर्तमान में केवल 1800 घन मीटर रह गयी है, जबकि यह जल उपलब्धता 1700 घन मीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष होने की दशा में दबावग्रस्त स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।
- "उत्तर प्रदेश का परिदृश्य" प्रस्तुत करते हुए जानकारी दी गयी कि प्रदेश में वर्षा जल की कुल वार्षिक उपलब्धता 235.40 लाख हे0मी0 आंकी गयी है, जिसमें से 80.27 लाख हे0मी0 अर्थात 37.50 प्रतिशत वर्षा जल प्रतिवर्ष रन–आफ के रूप में व्यर्थ बह जाता है, जबकि कुल वर्षा जल का 15.45 प्रतिशत(31.37 लाख हे0मी0) भाग प्राकृतिक रिचार्ज द्वारा भूगर्भ जल में समाहित हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि प्रस्तावित कार्ययोजना में 'रन–आफ' को कम करके भूगर्भ जल रिचार्ज के प्रतिशत को बढाया जाना मुख्य लक्ष्य होगा।
- प्रदेश में विद्यमान विभिन्न हाइड्रोजियोलाजिकल श्रेणियों को दर्शाते हुए अतिशोषित व क्रिटिकल विकास खण्डों तथा भूजल स्तर की नवीनतम स्थिति प्रस्तुत की गयी। 01 अप्रैल, 2004 के आंकडों पर आधारित आंकलन के अनुसार प्रदेश में भूगर्भ जल विकास दर 69 प्रतिशत बतायी गयी।
- राज्य जल नीति, 1999 व वर्षा जल संनयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर चर्चा करते हुए बताया गया कि 134 विकास खण्डों में 10सी0एम0 प्रतिवर्ष से अधिक की भूजल स्तर गिरावट दर्ज की गयी है।
- प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि कुल 820 विकास खण्डों में से 589 विकास खण्डों में भूजल स्तर भूसतह से 5मी0 अथवा कम गहराई पर अवस्थित है तथा 90 विकास खण्डों में यह भूजल स्तर भूमि सतह से 5 से 8 मीटर की गहराई

पर है। बताया गया कि इन विकास खण्डों में भूजल रिचार्ज की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है।

- प्रदेश में वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु प्राथमिकता वाले 36 जनपदों में अवस्थित 141 समस्याग्रस्त विकासखण्डों को चिन्हित किया गया है, जिनको 04 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

  इस वर्गीकरण के आधार पर 37 अतिदोहित विकास खण्ड, 13 क्रिटिकल विकास खण्ड, बुन्देलखण्ड–विन्ध्य व अरावली पठारी क्षेत्र के 63 विकास खण्ड, 25 विकास खण्ड, जहां वर्षा ऋतु के उपरान्त भूजल स्तर 8 मी0 से अधिक गहरा व वर्षा पूर्व जलस्तर गिरावट 10 से0मी0 प्रतिवर्ष से अधिक है तथा नदी के निकट स्थित 03 विकास खण्ड, जहां भूजल स्तर 15 मी0 से अधिक गहरा है, को वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज कार्यक्रम हेतु चयनित किया गया है। प्रदेश में वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज की समस्त गतिविधियों/योजनाओं को 11वीं पंचवर्षीय योजनाकाल (वर्ष 2007–12) में इन्हीं विकास खण्डों में केन्द्रित किये जाने का प्रस्ताव है।

- प्रदेश में वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों यथा लघु सिंचाई, कृषि, सिंचाई ग्राम्य विकास विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन, जल निगम द्वारा अभी तक जीर्णोद्धार/निर्मित तालाब व चेक डैम निर्माण की प्रगति एवं प्रस्तावित लक्ष्यों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया।

  300 वर्ग मी0 अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित निजी भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना सम्बंधी प्रगति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रस्तुत की गयी, जिसमें बताया गया कि स्वीकृत किये गये मानचित्रों वाले कुल 3378 भवनों में से 1715 भवनों में उक्त व्यवस्था की गई जबकि 1663 भवनों में इस प्रणाली को लागू नहीं किया गया। शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रिचार्जिंग पद्धति स्थापित किये जाने सम्बंधी प्रगति भी प्रस्तुत की गयी।

  शासकीय प्रतिष्ठान के अनुसार उद्योगों में स्थापित पीजोमीटर की अद्यतन स्थिति तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना सम्बंधी जानकारी भी प्रस्तुतिकरण में दी गयी।

- एक्शन प्लान :-

प्रदेश में चिन्हित 141 समस्याग्रस्त विकासखण्डों में वर्षा जल संचयन एंव भूगर्भ जल रिचार्ज के कार्यक्रम की प्रस्तावित कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण करते हुए सचिव, भूगर्भ जल एवं लघु सिंचाई द्वारा बताया गया कि प्रथम चरण हेतु इस पंचवर्षीय कार्ययोजना में कुल रू0 2000 करोड के व्यय की सम्भावना है और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रस्तावित योजनाओं पर कुल रू0 400 करोड के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि की व्यवस्था/वित्त पोषण विभिन्न योजनाओं से अभिसरित करके किया जाना प्रस्तावित है।

(1) ग्रामीण क्षेत्र– कार्य–योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एल्यूवियल क्षेत्र हेतु "रिवर बेसिन अप्रोच" पर आधारित रिचार्ज योजनाओं के लिए रू0.773.47 करोड़ की लागत से चेक डेम निर्माण, तैराज, तालाबों का जीर्णोद्धार /निर्माण, नाला बंध, गेबियन संरचनाएं, आन–फार्म वाटर हार्वेस्टिंग आदि कार्य प्रस्तावित है।

(2) पठारी क्षेत्र– पठारी क्षेत्रों में "वाटरशेड अप्रोच" पर आधारित रिचार्ज योजनान्तर्गत रू0 407.97 करोड़ की लागत से कन्टूर बांध, गली प्लगस, अर्दन बांध, चेकडेम, परकोलेशन टैंक, हार्टीकल्चर व वनीकरण आदि कार्य प्रस्तावित किये गये हैं।

(3) शहरी क्षेत्र– प्रदेश के 40 समस्याग्रस्त जनपदों में अवस्थित कुल 431 नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायतों में रू0 700.05 करोड़ की लागत से कुल 46,670 रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की स्थापना का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

(4) प्रदेश में भूगर्भ जल संरक्षण एवं प्रबन्धन के लिए जन–जागरूकता एवं प्रचार प्रसार हेतु "सूचना–शिक्षा–संचार" पर आधारित कार्यक्रमों हेतु रू0 84.60 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

(5) "प्रशासनिक व्यय" के अन्तर्गत पीजोमीटर निर्माण व अन्य उपकरणों हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर लागत के रूप में रू0 24 करोड़ तथा रिपोर्ट एक्टीविटीज हेतु रू0 10 करोड़ के व्यय की व्यवस्था रखी गयी है।

प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि प्रस्तावित कार्ययोजना के अन्तर्गत विभिन्न रिचार्ज कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व समन्वित ढंग से सभी सम्बंधित विभागों को दिया जायेगा।

❖ प्रस्तुतिकरण के अन्त में सचिव, भूगर्भ जल एवं लघु सिंचाई द्वारा यह आशा व्यक्त की गई कि इस समग्र कार्य योजना को समन्वित ढंग से समस्याग्रस्त क्षेत्रों में क्रियान्वित किये जाने से जहां एल्यूवियल क्षेत्रों में भूजल स्तर गिरावट की वर्तमान दर को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा, वहीं पठारी क्षेत्रों में वाटरशेड अप्रोच के माध्यम से भूगर्भ जल उपलब्धता में वृद्धि की पर्याप्त सम्भावना रहेगी।

❖ **निर्णय :**

बैठक में उक्त प्रस्तुतिकरण पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा के उपरान्त निम्न निर्णय लिए गए:–

1– **समस्याग्रस्त 141 विकास खण्डों में वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज की समन्वित कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किया जाना :**

कार्य–योजना के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए यह निर्देश दिये गये कि समस्याग्रस्त 141 विकास खण्डों एवं चिन्हित शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज कार्यक्रमों को मुख्य रूप से केन्द्रित किये जाने के उद्देश्य से सभी सम्बंधित विभागों के साथ शीघ्र बैठक आयोजित करके दो सप्ताह में प्रस्ताव तैयार कर उच्चस्तरीय सहमति प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत कर दिये जायें।

(कार्यवाही : भूगर्भ जल विभाग)

2— 11वीं पंचवर्षीय योजना में कार्य–योजना को सम्मिलित किया जाना

(i) यह निर्देश दिए गए कि वर्षा जल संचयन की प्रस्तावित कार्ययोजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कराये जाने की कार्यवाही की जाए।

(ii) यह भी निर्देश दिये गये कि कार्य–योजना के प्रस्तावित परिव्यय के वित्तीय पोषण हेतु विभिन्न सम्बंधित विभागों की लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाएं।

(कार्यवाही : भूगर्भ जल विभाग)

3— निजी भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना सुनिश्चित किया जाना :

(i) यह निर्देश दिए गए कि 300 वर्ग गी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित भवनों में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अगस्त,2006 की सूचना के अनुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के पश्चात भी रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था न करने वाले 1136 भवनों में उक्त प्रणाली की स्थापना अगली वर्षा ऋतु के पूर्व कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये।

(ii) यह निर्देश दिए गए कि नये शासनादेश के अनुसार भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली सम्बंधी संशोधित व्यवस्थाओं के समुचित क्रियान्वयन की कार्यवाही भी सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही : आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)

4— पुरानी आवासीय योजनाओं/भवनों में भूगर्भ जल रिचार्जिंग व्यवस्था को लागू कराया जाना :

(i)यह निर्देश दिए गए कि पुराने आवासीय योजनाओं एवं भवनों में भी रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था लागू कराने के लिए गम्भीरता से विचार किया जाए। इस हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उपयुक्त विधियां चिन्हित करके तत्काल एक स्पष्ट नीति निर्धारित करते हुए उच्चादेश प्राप्त कर शीघ्र शासनादेश निर्गत करें।

(ii) इस सम्बंध में यह भी निर्देश दिये गये कि पुरानी आवासीय कालोनियों में "सामूहिक रिचार्ज पद्धति" को प्रोत्साहित कर लागू कराये जाने हेतु भी नीति निर्धारित की जाये। इसके लिए सामुदायिक सहभागिता की भूमिका तय किये जाने के साथ–साथ जनमानस में जागरूकता भी उत्पन्न की जाये।

(iii) निर्मित भवनों के मानचित्रों के उच्चीकरण/विस्तार कार्य कराये जाने के समय भी यह परीक्षण कर लिया जाये कि अमुक भवन में शासकीय

Uttar Pradesh Jal Nigam LUCKNOW

1130

82

सूचनाएं प्राप्त कर ली जाये, जिससे प्रस्तावित कार्य योजना के प
परीक्षण किया जा सके।

(कार्यवाही : सिंचाई विभाग एवं भूगर्भ ज

संलग्नक– यथोक्त।

60–
नवीन चन्द्र
मुख्य सचि
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश शासन,
लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–1,
संख्याः–/ऽ ट//62–1–2006–7 डब्लूपी/2004
लखनऊः दिनांक– 3 अक्टूबर, 2006

उपरोक्त कार्यवृत्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आव
कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4– प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शासन।
5– प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6– प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन,
7– प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन।
8– प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
9– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
10– प्रमुख सचिव, वन, उत्तर प्रदेश शासन।
11– प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश शासन।
12– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, उत्तर प्रदेश शासन।
13– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश शासन।
14– प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
15– सचिव, मत्स्य, उत्तर प्रदेश शासन।
16– सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन।
17– प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
18– निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।
19– निदेशक, आई0टी0आर0सी0, लखनऊ।
20– निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
21– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0।

3/10/06

(अरुण आर्या)
सचिव।

LUCKNOW

1131 ~~1040~~ (9) 83

प्राविधानों के अनुसार रिचार्जिंग की व्यवस्था की गई है अथवा नहीं और तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही : आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)

5— उद्योगों में पीजोमीटर की स्थापना:

यह निर्देश दिये गये कि खनी उद्योगों में मार्च, 2007 तक भूजल स्तर एवं गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु पीजोमीटर की स्थापना सुनिश्चित करायी जाए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिये गये कि अगले वर्ष उद्योगों को 'पर्यावरणीय सहमति' तभी दी जाए जब वह पीजोमीटर स्थापित कर लें।

(कार्यवाही : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

6— आई०सी०सी०ए०आर०टी० में स्थापित रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की सी०डी० प्राप्त किया जाना :

यह निर्देश दिये गये कि आई०सी०सी०ए०आर०टी०, इन्दिरा नगर, लखनऊ में स्थापित रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की सी०डी० प्रचार-प्रसार हेतु सेन्टर फार इन्वायरमेन्ट एजूकेशन से प्राप्त कर ली जाये।

(कार्यवाही : भूगर्भ जल विभाग)

7— तालाबों में रिचार्ज शाफ्ट निर्माण के पूर्व जल गुणवत्ता परीक्षण एवं प्रदूषण की सम्भावनाओं का आंकलन किया जाना :

यह निर्देश दिये गये कि तालाबों में रिचार्ज शाफ्ट की व्यवस्था /निर्माण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण से प्रदूषण की कोई सम्भावना तो नहीं है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर सतही जल एवं भूगर्भ जल की गुणवत्ता का नियमित परीक्षण निर्माण के पूर्व एवं पश्चात् किया जाये।

(कार्यवाही : भूगर्भ जल विभाग)

8— जनपद बदायूँ हेतु पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना :

जनपद बदायूँ के अधिकांश्य विकास खण्डों में अतिदोहन की स्थिति को देखते हुए यह निर्देश दिये गये कि भूगर्भ जल के समग्र प्रबन्धन एवं नियोजन हेतु जनपद बदायूँ का विस्तृत प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जाये। इस सम्बंध में भूगर्भ जल के विकास एवं जलकूपों के निर्माण के परिपेक्ष्य में सिंचाई विभाग एवं कृषि विभाग से अभिमत प्राप्त कर लिया जाये।

(कार्यवाही : लघु सिंचाई, कृषि एवं सिंचाई विभाग)

9— सिंचाई विभाग को 141 विकास खण्डों की सूची उपलब्ध कराया जाना :

यह निर्देश दिये गये कि सिंचाई विभाग को 141 विकास खण्डों की सूची उपलब्ध कराकर सिंचाई सम्बंधी वर्तमान एवं प्रस्तावित योजनाओं पर

उपस्थिति

क्रम सं०	नाम	पदनाम
1–	श्री अनीस अंसारी	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2–	श्री रवीन्द्र सिंह	प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास
3–	श्री शेखर अग्रवाल	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
4–	श्री अरूण आर्या	सचिव,लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0 शासन
5–	श्री तुलसी गौड़	सचिव, नियोजन विभाग
6–	श्री देवेश चतुर्वेदी	सचिव, वन विभाग
7–	श्री ए0ए0एम0 श्रीवास्तव	सचिव,विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी,उ0प्र0
8–	श्री डी0एस0 शर्मा	विशेष सचिव, राजस्व विभाग
9–	श्री यू0पी0 सिंह	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन
10–	श्री बी0एल0 मीणा	विशेष सचिव, सिंचाई
11–	श्री बी0एन0 अग्रवाल	विशेष सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन
12–	सुश्री श्रद्धा मिश्रा	विशेष सचिव,ग्राम्य विकास विभाग
13–	श्री अली मंजहर रिजवी	विशेष सचिव,लोक निर्माण विभाग
14–	श्री जी0पी0 मिश्र	विशेष सचिव, पंचायती राज
15–	श्री पन्ना लाल	मुख्य अभियंता,जल निगम
16–	डा0 यशपाल सिंह	निदेशक, पर्यावरण
17–	श्री एम0एम0 अंसारी	निदेशक,भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0
18–	श्री आर0एस0 जुरैल	मुख्य अभियंता,लघु सिंचाई विभाग,उ0प्र0
19–	श्री एन0आर0 वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक
20–	श्री आनन्द प्रकाश	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग
21–	श्री सी0एस0 भट्ट	सदस्य सचिव,प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
22–	श्री ए0के0 गार्गव	वैज्ञानिक केन्द्रीय भू–जल परिषद
23–	श्री बिहारी स्वरूप	निदेशक, सदस्य विभाग
24–	सुश्री अनिता गुप्ता	अतिरिक्त जल भू विज्ञ
25–	श्री देवेन्द्र मिश्र	वैज्ञानिक,रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
26–	श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	मुख्य अभियंता, सेक्टर–1,उ0प्र0 जल निगम
27–	श्री त्रिभुवन	सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल निदेशालय, लखनऊ।
28–	श्री पी0के0 जौहरी	सहायक अभियंता, भूगर्भ जल निदेशालय, लखनऊ।
29–	श्री आर0एस0 सिन्हा	हाईड्रोलाजिस्ट ,भूगर्भ जल निदेशालय, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन,
लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–1
संख्या– /62–1–2007–8डब्लूपी/2007
लखनऊः दिनांक– 05 अक्टूबर,2007

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश में विभिन्न प्रकार से सिंचाई, पेयजल एवं उद्योगों हेतु भूगर्भ जल के दोहन के कारण गिरते भूगर्भ जल स्तर को रोकने तथा वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाये जाने की दृष्टि से रिट याचिका संख्या–3599(एम./बी)/2007 राजीव तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–15 जून, 2007 के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य सचिव
(3) प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
(4) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
(5) प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
(6) प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
(7) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
(8) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
(9) प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य

(10) प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
(11) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य
(12) मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।	आमंत्रित सदस्य
(13) क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड,लखनऊ।	आमंत्रित सदस्य

2— चूँकि भूगर्भ जल से सम्बन्धित कार्यो हेतु लघु सिंचाई विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0 को नोडल विभाग बनाया गया है, अतः बैठक आहूत करने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करने का कार्य प्रमुख सचिव/सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग द्वारा किया जायेगा।

उक्त विशेषज्ञ समिति की बैठक प्रत्येक माह कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में उनके सभा कक्ष में आहूत की जायेगी। यदि किन्ही कारणों से कृषि उत्पादन आयुक्त उपलब्ध न हों, तो प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न होगी।

चन्द्र प्रकाश
प्रमुख सचिव।

संख्या—2177(1)/62—1—2007,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास विभाग,उ0प्र0शासन।
(2) प्रमुख सचिव,कृषि विभाग,उ0प्र0शासन।
(3) प्रमुख सचिव,भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0शासन।
(4) प्रमुख सचिव,आवास विभाग,उ0प्र0शासन।
(5) प्रमुख सचिव,नगर विकास विभाग,उ0प्र0शासन।
(6) प्रमुख सचिव,राजस्व विभाग,उ0प्र0शासन।
(7) प्रमुख सचिव,वन विभाग,उ0प्र0शासन।
(8) प्रमुख सचिव,सिंचाई विभाग,उ0प्र0शासन।
(9) स्टाफ आफिसर,कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0शासन।
(10) निदेशक,भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
(11) मुख्य अभियन्ता,लघु सिंचाई विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
(12) क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भूजल भवन, सेक्टर—बी, सीतापुर रोड योजना, लखनऊ।

आज्ञा से,
(डा0 सुधाकर अदीब)
संयुक्त सचिव।

C:\Documents and Settings\ANUBHAV\Desktop\Samples

Commissioner LUCKNOW

संख्या : 0035/आठ-1-2005

प्रेषक,

नवीन चन्द्र बाजपेई,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन,
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 25 अप्रैल, 2006

विषय: **भूजल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली को अपनाए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग गंगा-यमुना के दोआब में स्थित है, जहाँ विश्व का विशालतम भू-जल-भण्डार उपलब्ध है, किन्तु पेय जल, सिंचाई तथा उद्योगों हेतु जल की बढ़ती मांग के कारण भू-जल स्रोतों का अनियंत्रित दोहन अनवरत रूप से जारी है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के अधिकांश भागों में धीरे-धीरे गिरते हुए जल स्तर, नलकूपों की असफलता एवं पारिस्थितिकीय असंतुलन के रूप में परिलक्षित हो रहा है। भू-जल स्रोतों के साथ-साथ सतही जल स्रोत विशेष रूप से तालाब, पोखर एवं जलाशय आदि भी सूख रहे हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकीय संरक्षण एवं संचयन वर्तमान में एक चुनौती बन चुका है। अतः समय रहते इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही किए जानें की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में जल संकट का सामना न करना पड़े।

2. उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष लाखों गैलन वर्षा जल व्यर्थ बहकर समुद्र में चला जाता है, जिसे अन्यथा भू-जल संचयन की विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से भूमि के अन्दर प्रवेश करा कर भविष्य में सम्भावित जल संकट का समाधान सुनिश्चित हो सकता है। इस प्रकार वर्षा जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्जिंग विधा एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभरी है, जिसे व्यापक रूप से अपनाए जाने पर दबावग्रस्त भूगर्भीय जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित हो सकता है एवं उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निम्नांकित शासनादेश जारी किए गए हैं :-

(i) शासनादेश संख्या : 1703ए/9-आ-1-29 विविध/98, दिनांक 12.4.2001
(ii) शासनादेश संख्या : 3771/9-आ-1-17 विविध/2003, दिनांक 16.6.2001
(iii) शासनादेश संख्या : 3887/9-आ-1-रेन वा0 हार्वे0/2002 दिनांक 02.09.02
(iv) शासनादेश संख्या : 1760/9-आ-1-04-17विविध/2003 दिनांक 29.07.04

3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना को सुगम, सुरक्षित, लागत प्रभावी एवं लोकप्रिय बनाए जाने हेतु

उपर्युक्त शासनादेशों के विभिन्न प्राविधानों पर इस विधा में विशेषज्ञ विभागों/संस्थाओं से शासन स्तर पर व्यापक विमर्श किया गया जिसके क्रम में कतिपय संशोधन आवश्यक पाए गए हैं। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भू–जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को अपनाए जाने के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा पूर्व में जारी उपरिलिखित शासनादेशों के गहन परीक्षण एवं सम्यक विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से निम्न संशोधन एवं व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है :–

3.1 नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक तालाबों, पोखरों, जलाशयों, आदि का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु ऐसे समस्त तालाबों, पोखरों, जलाशयों को महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान में चिन्हित कर उनके वर्तमान उपयोग हेतु आरक्षित किया जाए तथा उनमें केवल वर्षा जल का सरफेस रन ऑफ व सम्बन्धित क्षेत्र से गुजर रहे प्राकृतिक ड्रेनेज (जिनमें प्रदूषित जल न आता हो), को ही मिलाने की व्यवस्था रखी जाए। ऐसे तालाबों/पोखरों/जलाशयों, आदि में **भू–जल रिचार्जिंग हेतु रिचार्ज शैफ्ट किसी भी दशा में नहीं बनाए जायंगे**, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूषित जल–प्रवाह आता हो अथवा प्रदूषित जल आने की सम्भावना हो। रिचार्ज शैफ्ट स्थल विशेष की परिस्थितियों का विश्लेषण करने के उपरान्त ही बनाए जाएं। इसके अतिरिक्त तालाबों, पोखरों, जलाशयों, आदि को अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण/कब्जे से मुक्त रखा जाए तथा सम्बन्धित अभिकरण द्वारा उनका जीर्णोद्धार किया जाए।

3.2 नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का जियोलॉजिकल/हाइड्रोलॉजिकल/हाइड्रोजियोलॉजीकल सर्वेक्षण कराया जाए एवं भू–जल की रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पंद्धति को अपनाया जाए।

3.3 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले–आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत कुल योजना क्षेत्र की लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भू–जल की रिचार्जिंग हेतु जलाशय का निर्माण किया जाए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलॉजिकल, टोपोग्राफी, लीथॉलाजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के सम्भावित ठहराव (रिटेशन्स) व "स्टेगनेशन का अध्ययन एवं तत्सम्बन्धी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाए और उसके अनुसार ही जलाशय की गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु **जलाशय की गहराई किसी भी दशा में 03 मीटर से अधिक न रखी जाए।** इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के सरफेस–रन–ऑफ को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए तथा प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए।

3.4 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भी उपरोक्तानुसार जलाशय बनाए जाए एवं पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट बनाए जाए। ऐसे रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू–जल के ढलान की दिशा में किया जाए।

3.5 पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ एवं ट्रैक्स यथा सम्भव 'परमीएबिल' या ऐसी परिमीएबिल परफोरेटैड–ब्लाक्स के प्रयोग से ही बनाए जाए। वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।

3.6 **नव निर्मित होने वाले समस्त उपयोगों के भवनों में 'रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग' प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित करायी जाए।** इस हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाए :–

(क) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले–आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज के नेटवर्क के साथ–साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू–जल की सामूहिक रिचार्जिंग हेतु अन्य पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जाए, जिसमें व्यक्तिगत भूखण्डों/भवनों हेतु रिचार्जिंग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था हो जाए। उक्त व्यवस्था पर आने वाले व्यय को योजना की विक्रय–योग्य भूमि पर भारित करते हुए लाभार्थियों से भूखण्डों/भवनों के विक्रय मूल्य में जोड़कर वसूली की जाए।

(ख) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं में 100 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्डों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में मात्र यह बाध्यता होगी कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबकि 200 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

3.7 भू–जल संसाधनों की सुरक्षा के दृष्टिगत केवल छतों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को ही भू–जल स्रोतों में रिचार्ज कराया जाए। खुले क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल को कदापि रिचार्जिंग के उपयोग में न लाया जाए क्योंकि रिचार्जिंग वैल विधा से वर्षा जल सीधे स्ट्रेटा (एक्यूफर) में प्रवेश करेगा, जिससे भू–जल प्रदूषित हो सकता है। इसके अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण मानक तकनीक के अनुसार सुनिश्चित किया जाए तथा वर्षा जल को न्यूनतम आवश्यक गहराई तक ही भूमि के अन्दर प्रवेश कराया जाए, ताकि भू–जल स्रोतों के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो।

3.8 सड़कों के किनारे यथासंभव कच्चे रखे जाएं, जिसमें ब्रिक आन एज/लूज स्टोन पेवमेन्ट का प्राविधान किया जाए, ताकि भू–जल की अधिकतम रिचार्जिंग सम्भव हो सके।

3.9 सड़कों, पार्कों तथा खुले क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पेड़–पौधों की प्रजातियों का चयन किया जाए, जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके भी ग्रीष्म में हरे–भरे रह सकें।

3.10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु स्थापित रिचार्ज स्ट्रक्चर्स के अनुरक्षण एवं रख–रखाव का कार्य सम्बन्धित विभाग/संस्था/लाभार्थी द्वारा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए।

3.11 जलरोध (वाटर लॉगिंग) की समस्या वाले क्षेत्रों में भू–जल रिचार्जिंग प्रणाली न अपनायी जाए. परन्तु भवनों की छतों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल के संग्रहण हेतु व्यवस्था कराई जा सकती है।

3.12 रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञता जैसे कि क्षेत्र का जियोलॉजीकल, हाइड्रोलॉजिकल एवं हाइड्राजियोलॉजिकल सर्वेक्षण फिजीबिलिटी के आंकलन, रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का संरचनात्मक डिजाइन एवं निर्माण उपलब्ध टैक्नॉलाजी एवं इक्विपमेन्ट, निर्माण एवं रख–रखाव की लागत, आदि के सम्बन्ध में निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश तथा क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–जल परिषद, लखनऊ क्षेत्र से तकनीकी परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में भू–जल संचयन एवं रिचार्जिंग की विभिन्न योजनाओं के समन्वय एवं अनुश्रवण तथा भू–जल अनुसंधान, अन्वेषण, दीर्घकालीन प्रबन्धन एवं नियोजन हेतु भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश को **'नोडल एजेन्सी'** घोषित किया गया हैं। अतः रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं भू–जल रिचार्जिंग की विभिन्न पद्धतियों में प्रयुक्त की जा रही तकनीकों एवं रिचार्ज स्ट्रक्चर्स से प्राप्त होने वाले भू–जल रिचार्ज एवं **भू–जल स्तर पर सम्भावित प्रभाव के आंकलन तथा 'इम्पेक्ट असेसमेन्ट' की व्यवस्था** 'नोडल एजेन्सी' द्वारा सुनिश्चित की जाए।

5. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीन कार्यरत विभागों/संस्थाओं के अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लोकप्रिय बनाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र बाजपेई)
मुख्य सचिव

संख्या 0035 (1)/आठ–1–2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि0, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–जल परिषद, लखनऊ।
5. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
7. सचिव/सदस्य, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
8. अध्यक्ष, यूपीरेडको, लखनऊ।
   अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(के0एल0 मीना)
सचिव

22-5-08
(डा० जटाशंकर त्रिपाठी)
संयुक्त आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
अनुभाग–5 (फौजदारी)
उ० प्र० शासन

1139 ~~1148~~ 91

IN THE HON'BE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
IN RE:
WRIT PETITION 4436 (M/B) of 2003



Sewage Treatment Plant ---------- Petitioner

VERSUS

State of U.P. and others --- opposite parties

Affidavit on behalf of Nagar Nigam, Lucknow in Compliance of the order dated 22.05.2008 passed by this Hon'ble Court

I, Shailesh Kumar Singh, aged about 52 years, S/o Late Subedar Singh presently working as Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow; the deponent do hereby solemnly affirms and state on oath as under:-

1. That the deponent is impleaded in the aforesaid writ petition as opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed herein.

2. That this writ petition was last listed on 22.05.2008 wherby this Hon'ble Court was pleased to pass following order;-

"We therefore, direct and request the NEERI to co-opearte in the matter and submit report in consultation and cooperation with the officers of U.P. Pollution Control Board not only for removal of garbage, but also the manner in which it can be removed and also with respect to cleaning of Gomti river and the steps which they suggest to be taken. Report may be submitted by the next date of listing. Steps, if any suggested, may be taken by the authorities concerned without waiting for an order of this Court. Whatever charges are asked for by NEERI may be paid by the State Government after negotiation.

On the next date of listing the respondents shall submit updated status report of the work done".

3. That in compliance of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 22.05.2008 the present affidavit is being filed thereby mentioning the steps taken at the end of Nagar Nigam, Lucknow in compliance of the said order.

4. That in compliance of the said order the Nagar Nigam Lucknow took all relevant steps for cleaning of river Gomti between 15.06.2008 to 08.07.2008.It is further relevant to mention over here that the cleaning of said river which started on 15.06.2008 and was carried on with full efficiency and on war footing which involved

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

8311 man days of labour ,supervisor and 237 number of boatman for the said job.

Further it is pertinent to mention that the area between Kudia Ghat to Gomti Beraj which extends upto 12 kms was divided into three sectors for cleaning the said river and thus 2024 tons of shrubs, weeds and water hyacinth was taken out from the river and thus disposed off. For the said job the detail of vehicles involved by the department itself are as follows.

- 10 three wheelers, 2 JCB, 3 Tata Tipper ,3 Tata DI Tipper ,2 Van Mounted Hydraulic Excevator (EX-70), 2 Van Mounted Hydraulic Excevator (TMX-70).

Thus for the entire cleaning work of river Gomti a total amount of Rs.10,85,200.00 was paid to the Labour involved in the said job .Hence the said job was efficiently completed by the Nagar Nigam Lucknow on 08.07.2008. A detail extract of chart showing the above mentioned figures for cleaning of river Gomti between the said period and relevant news items published in almost all the leading newspaper are being filed cumulatively annexed herewith as **Annexure Nos. 1 & 2** respectively to this affidavit.

5. That thereafter the deponent vide its order dated 16.07.2008 numbered as D-294/NA/AMCCD/08 issued detail instructions to all Zonal Officers of concerned zones for maintaining the river stretch and its sight cleaning on regular basis. A photocopy of the said order

dated 16.07.2008 is being annexed herewith as **Annexure No. 3** to this affidavit.

6. That it won't be out of way to mention over here that the Nagar Nigam Lucknow fully cooperated and assisted with the officials of National Environment Engineering and Research Institute, (hereinafter referred to as NEERI) when they inspected the site in question on 08.07.2008 and 09.07.2008 at Lucknow. The said team of NEERI consisted of four officials i.e.

i. Dr. T. Nandy,

ii. Dr. A.N. Vaidya,

iii. Mr. J.K. Bhattacharaya,

iv. Dr. S.Y. Bodkh,

who visited the said site in question. Thereafter NEERI raised its bill which was duly cleared by Nagar Nigam, Lucknow immediately.

7. That further in compliance of the said order passed in the said petition the Nagar Nigam, Lucknow has till date installed 190 Handpumps within the city of Lucknow and the work is still in progress .

8. That it would be relevant to mention over here that the Nagar Nigam Lucknow has purchased 10 water tanks (five large tanks and five small tanks) to cater the basic

needs of supply of pure and clean drinking water to the citizens of Lucknow .

9. That so far as cleaning of river Gomti is concerned , it is submitted that the land for construction of 345 MLD STP has been acquired by the Nagar Nigam ,Lucknow on 16.07.2008 and the same has been handed over to Jal Nigam, Lucknow who has started the work on the same.

10. That from the narration made hereinabove it is established that the Nagar Nigam, Lucknow has taken all relevant steps in compliance of order dated 22.05.2008 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will carry out every direction that is issued by this Hon'ble Court from time to time.

Lucknow
Dated: 21.07.2008

Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of paragraph 1 to 10 of the affidavit are true to the best of our personal knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed by me.

So help me God

Lucknow
Dated : 21.07.2008

Deponent

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

I, identify the deponent who has signed before me

Advocate

1144 ~~1055~~ (6) 96

Solemnly affirmed before me on 21/5/08 at 11:15 A.M./P.M by the deponent who is identified by Shri. Namit Sharma, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him by me.

RAVINDRA K. VERMA
OATH COMMISSIONER
High Court, Allahabad
Lucknow Bench, Lucknow
S. No. 21504 Date 21/5/08

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

1145 1059 (7) 97

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
W.P. NO. 4486(M/B) OF 2003
Sewage Treating Plant ... PETITIONER
Vs.
State of U.P. & Ors. ... OPP. PARTIES
ANNEXURE NO. 1

नगर निगम लखनऊ

गोमती नदी की सफाई दिनाँक 15-06-2008 से दिनाँक 08-07-2008 तक

1. कार्य प्रारम्भ करने की तिथि — 15-06-2008

2. कार्य पर लगायें गये श्रमिको का विवरण

क.	श्रमिक	7648	मानव	दिवस
ख.	सुपरवाइजर	0663	मानव	दिवस
ग.	नाविक (नाव सहित)	0237	मानव	दिवस
	कुल	8548	मानव दिवस	

3. कुड़िया घाट से गोमती बैराज तक लगभग 12 कि0मी0 के क्षेत्रफल को 03 सैक्टर में विभाजित करते हुये गोमती नदी की सफाई के उपरान्त निकाली गयी जल कुम्भी इत्यादि — 2024 टन

4. उपरोक्त दर्शाये गये स्थल से जलकुम्भी आदि को हटाये जाने निमित्त लगाये गये वाहनों की संख्या

क.	10 थ्री- व्हीलर वाहन
ख.	02 जे0सी0बी0
ग.	03 टाटा टिपर
घ.	03 टाटा डी0आई0 टिपर
छ.	02 वेन माउण्टेड हाईड्रोलिक एक्सीवेटर (ई0एक्स0-70)
घ.	02 वेन माउण्टेड हाईड्रोलिक एक्सीवेटर (टी0एम0एक्स0-70)

(उपरोक्त दर्शाये गये समस्त वाहन विभागीय है)

5. कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से दिनाँक 08-07-2008 तक श्रमिको को देय पारिश्रमिक — रु0 10,85,200.00

6. कार्य का प्रतिशत — लगभग 100%

विशेष,

उल्लेखनीय है कि माँह जनवरी, 2003 में जल निगम द्वारा गोमती नदी की 12 कि0मी0 क्षेत्र की सफाई हेतु रु0 24.12 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया था। जल निगम के द्वारा मे0 ड्रेजिंग एण्ड डिस्लिटेशन कम्पनी प्रा0 लि0, कोलकत्ता को गोमती नदी की ड्रेजिंग का कार्य सौपा गया।

उक्त कम्पनी ने 04 कि0मी0 की सफाई की, जिस पर रु0 2.44 करोड़ का व्यय हुआ।

1146 Loss

(8) 98

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
W.P. NO. 436 (M/B) OF 2003
Sewage Treatment Plant ... PETITIONER
Vs
State of U.P. & Ors ... OPP. PARTIES
ANNEXURE NO. 2

हिन्दुस्तान

वर्ष 13, अंक 175, 20 पेज +4 पेज रीमिक्स, मूल्य 3.50 रुपए

नगर संस्करण

लखनऊ, शुक्रवार 27 जून 2008

हम होंगे कामयाब

गोमती सफाई अभियान गुरुवार को न केवल नदी का कूड़ा-कचरा बल्कि लोगों के दिलों का संकोच साफ करने का भी सबब बना। हर तबके और मजहब के लोगों ने सुबह से शाम तक नदी की सफाई में हाथ बँटाया। एक तरफ महापौर दिनेश शर्मा जलकुंभी समेट कर ट्राली में भर रहे थे तो दूसरी ओर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, नवाब मीर अब्दुल्ला अपने साथियों के साथ आस्तीनें समेटे सफाई में हाथ बँटा रहे थे। देखते ही देखते गोमती किनारे का बड़ा हिस्सा चमकने लगा। खबर पेज 5 पर

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

16 जून 2008 हिन्दी दैनिक virajpra@sancharnet.in

गोमती की सफाई कार्य का नगर विकास मंत्री ने किया शुभारम्भ

■ बेहतर सफाई करने वाले समूह को मिलेगी प्रोत्साहन राशि ■ कुड़ियाघाट, शहीद स्मारक, बैराज एवं अम्बेडकर स्मारक की हो रही सफाई

कार्यालय संवाददाता

लखनऊ। नगर निगम गोमती सफाई कार्य का आज कुड़ियाघाट पर नगर विकास मंत्री नकुल दुबे ने शुभारम्भ किया। उन्होंने घोषणा की जो समूह अच्छा कार्य करेगा उसे प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। गोमती सफाई का कार्य कुड़ियाघाट, शहीद स्मारक, बैराज बैकुण्ठधाम एवं अम्बेडकर स्मारक के पास एक साथ शुरु किया गया।

नगर विकास मंत्री के साथ मौके पर डीएम चन्द्रभानु एवं नगर निगम शैलेश कुमार सिंह के अलावा नगर निगम के अन्य अधिकारी मौजूद थे। नगर विकास मंत्री नकुल दुबे ने गोमती सफाई का शुभारम्भ करने के बाद सफाई किये जा रहे चारों स्थल का मुआयना किया। श्री दुबे स्वयं गोमती सफाई की निगरानी करेंगे उन्होंने नगर आयुक्त को निर्दशित किया कि प्रत्येक स्थल के लिए अधिकारियों की लगाना सुनिश्चित करें। इसके तहत सहायक नगर आयुक्त जोन छह आरके गुप्ता को शहीद स्मारक, सहायक नगर आयुक्त जोन-दो अरुण गुप्ता बैकुण्ठधाम, सहायक नगर आयुक्त प्रमोद गुप्ता जोन एक को बैराज एवं सहायक नगर आयुक्त अनुपम शुक्ला व कर अधीक्षक नीलेश रमन को सफाई के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

इस मौके पर जिलाधिकारी कल्पना ने आग्रह किया कि जलकुम्भी एवं घास के साथ जो कचरा साथ निकल रहा है उसको तत्काल उठान किया जाय। नगर आयुक्त ने आरआर प्रभारी दीपक यादव को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। नगर निगम ने चारों स्थल पर गोमती सफाई के लिए 350 कर्मचारियों को लगाया है।

कार्यक्रम में नगर निगम के अपर नगर आयुक्त मनी सिन्हा सहित कई सहायक नगर आयुक्त अभियन्ता आशीष कुमार के अलावा बड़ी संख्या में नगर निगम कर्मचारी मौजूद थे।

1148 1057

(10) 100

मारपीट का मुकदमा दर्ज कराने की मांग

लखनऊ। पैसे के विवाद को लेकर हुई मारपीट का मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर दुबैसगंज स्थित हाता ख्वाजा गौहर निवासी मोहम्मद शमीम ने रविवार को विधान भवन के समक्ष धरना दिया। मो.शमीम ने बताया कि उनके ससुर व ठाकुरगंज निवासी अब्दुल मजीद खान ने उनसे ढाई लाख रुपये लिये थे तथा जब उन्होंने पैसे की मांग की तो उक्त लोगों ने मेरी बूढ़ी मां तथा घर के लोगों से मारपीट की। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी की लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

कुड़ियाघाट पर गोमती सफाई अभियान का शुभारम्भ करते नगर विकास मंत्री नकुल दुबे, साथ में हैं जिलाधिकारी चन्द्रभानु। फोटो : एसएनबी

गोमती की सफाई में लगाये गये 350 मजदूर

जलकुंभी निकाल नगर विकास मंत्री ने किया अभियान का शुभारम्भ

सहारा न्यूज ब्यूरो
लखनऊ, 15 जून।

नगर निगम ने आज से गोमती नदी की सफाई का अभियान शुरू किया। इसका शुभारम्भ नगर विकास मंत्री नकुल दुबे ने नदी से जलकुम्भी निकाल कर किया। कुड़ियाघाट पर सुबह रिमझिम बारिश के बीच आयोजित समारोह के दौरान 350 मजदूर नदी की सफाई के लिए लगाये गये। सफाई का यह अभियान पूरे एक माह चलेगा।

श्री दुबे ने कहा कि यह अभियान चार स्थानों कुड़ियाघाट, अमीर स्मारक बैराज, बक्शी का तालाब और अम्बेडकर पैराक के पास नदी की सफाई एक साथ शुरू कराई जाए। उन्होंने प्रत्येक स्थान पर तीन टीमें गोमती सफाई के लिए लगाने के आदेश दिये। [illegible] करेंगे और जो भी टीम अच्छा कार्य करेगी उसे प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

जिलाधिकारी चन्द्रभानु ने नगर निगम अफसरों को निर्देश दिया कि अभियान के दौरान गोमती से निकाली जाने वाली जलकुम्भी व घास का उठान तत्काल सुनिश्चित कराया जाए। नगर आयुक्त शैलेश कुमार सिंह ने मौके पर ही सहायक नगर आयुक्त आरके गुप्त को कुड़ियाघाट से गोमती की सफाई कराने की जिम्मेदारी सौंपी। इसी प्रकार जोन-दो के जोनल प्रभारी अनुज कुमार गुप्त को शहीद स्मारक, सहायक नगर आयुक्त [illegible] को पैराक धाम तथा अनुपम शुक्ल को गोमती सेतु स्थल से नदी की सफाई कराने का जिम्मा सौंपा। आर.आर. विभाग के प्रभारी दीपक वशिष्ठ को नदी की सफाई के दौरान निकलने वाली जलकुम्भी व घास उठवाने की [illegible]

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

1149 ~~1058~~ (11) 101

स्वतंत्र भारत 20 June

राजधानी

गोमती की सफाई करते मजदूर

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

COMMISSIONER FOR OATHS
Court, Allahabad

16/6/08

मौसम

राजधानी में मंगलवार को बादल छाये रहेंगे और बारिश होने की संभावना है।

तापमान अधिकतम 30.4 डि.से. न्यूनतम 25.4 डि.से.
नमी अधिकतम 97% न्यूनतम 78%
सूर्योदय मंगलवार - 7.02 बजे सूर्यास्त बुधवार - 5.13 बजे

लखनऊ जागरण

90 वर्षों से नालों की गंदगी समेटे है गोमती

लखनऊ, 16 जून (जागरण संवाददाता) : पिछले करीब 90 वर्षों से शहर भर के नालों की गन्दगी को अपने गर्भ में समेटे गोमती सिसक रही है। उच्च न्यायालय के कड़े रूख के बावजूद आज तक इसकी सफाई एक मृगमरीचिका बनी हुई है।

वर्ष 1920 में जब सीवेज सिस्टम बना था तब इसे वहां ले जाने की योजना थी जहां आज गोमतीनगर बसा है। मगर बाद में नालों को सीधा गोमती में गिरा दिया गया। तब से आज तक इसमें हर दिन 22 नालों से निकल रहा 400 एमएलडी सीवेज सीधे डाला जाता है। लखनऊ ही नहीं गोमती पांच शहरों का मैला ढो रही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार गंगा से निकली गोमती में लखीमपुर, सीतापुर, सुलतानपुर व जौनपुर सहित लखनऊ का सीवेज सीधे गिराया जाता है जो गोमती की गंदगी का प्रमुख कारण है। गोमती को साफ करने की योजनायें तो बहुत बनी लेकिन यह सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गयीं।

प्रतिदिन 22 नालों की गंदगी गिरती है गोमती में

सरकारी प्रयास : मुख्यमंत्री की पहल के बाद इन दिनों चल रहा गोमती की सफाई का काम

सन् 1992 में गंगा एक्शन प्लान में गोमती सफाई योजना को शामिल करते हुए इस काम के लिए केन्द्र सरकार ने 131.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किये और ब्रिटिश बिल्ली थेम्स कम्पनी द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट का काम शुरू तो हुआ लेकिन वर्ष 1999 में इसे अधर में छोड़ दिया गया। शेष बची सौ करोड़ की रकम जल निगम ने शहर के नौ नालों के डायवर्जन पर खर्च करने की खानापूरी की। गंगा एक्शन प्लान के दूसरे चरण में 375 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एसटीपी) के लिए 263 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। इसमें से 47 करोड़ रुपये से 42 एमएलडी क्षमता का दौलतगंज एसटीपी लगा। शेष 345 एमएलडी के लिए 120 हैक्टेयर भूमि ककरहा गांव में दी जानी थी। भूमि अधिग्रहण के लिए जल निगम ने वर्ष 2003-04 में तत्कालीन डीएम को तीन करोड़ छह लाख रुपये भी सौंपे। बाद में नगर विकास प्राधिकरण ने उसे आवासीय करार दे दिया। अब एक बार फिर इसे ककरहा से लगभग पांच किलोमीटर आगे लोनापुर, भरवारा और भैंसोरा गांव में 119.557 हैक्टेयर भूमि दिये जाने की बात कही जा रही है। कोलकाता से स्वाती ड्रेजर मंगा कर नदी की तलहटी की सफाई की 2.5 करोड़ रुपये की योजना का तोहफा पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी ने दिया। तलहटी से निकाली सिल्ट नदी के किनारे ही छोड़ दी गई। नगर निगम ने इस काम के लिए धन नहीं उपलब्ध होने की बात कहकर हाथ झाड़ लिये। यह सिल्ट बरसात के साथ वापस नदी में बह गई। नालों की गन्दगी नदी में सीधे गिराये जाने से जलीय व मलीय कोलीफार्म की संख्या में बेहिसाब वृद्धि, नदी में कम होती घुलित आक्सीजन की मात्रा और जैविक आक्सीजन की मांग में बढ़ोत्तरी ने गोमती को तहस-नहस कर दिया है। इसमें मलीय कोलीफार्म की मात्रा लाखों की संख्या पार कर चुकी है। नदी के जल में घुलित आक्सीजन की मात्रा 2.3 से 1.2 मिग्रा प्रतिलीटर ही रह गई है।

ढाई करोड़ के खर्च पर तलहटी से निकाली गई सिल्ट वापस नदी में पहुंची

150

12
102

1151 1060

13 103

लखनऊ

जनाना पार्क में सेमिनार
बेटियों की इच्छाओं को नजरंदाज न करें 7

हिन्दुस्तान, सोमवार 16 जून 2008 लखनऊ

हिन्दुस्तान

सम्पादकीय विभाग
का नया पता

हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, विभूति खण्ड, प्लॉट-2 (पिकप भवन के पास) गोमती नगर, लखनऊ
फोन- 2306209, 2306215
फैक्स-2721120, 2306212

मौसम

अधिकतमः 28.0 (-1) डि.सें.
न्यूनतमः 25.0 (-2) डि.सें.
आर्द्रताः 98 प्रतिशत
सूर्यास्तः19.02
सूर्योदयः 05.12
पूर्वानुमानः घनी बदली छाई रहेगी। वर्षा होने की सम्भावना है।

लखनऊ में आज

विमोचनः 'द पाजटिव थिंकिंग' पुस्तक का विमोचन, रायल कैफे, शाम सात बजे।
गोष्ठीः संस्कृति कारवाँ की ओर से हास्य कवि गोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, बली प्रेक्षागृह, सात बजे, नाबार्ड की ओर से आर्थिक विकास पर चर्चा, क्षेत्रीय कार्यालय गोमती नगर, दोपहर तीन बजे।
स्वागत उत्सवः सागर जी महाराज का स्वागत उत्सव, श्री चन्द्राप्रभु दिगम्बर जैन मंदिर, गोमती नगर, सुबह 7:30 बजे।
शहीद पर्वः श्री गुरु अरजन देव का 402 वाँ शहीद पर्व, नाका गुरुद्वारा, सुबह पाँच बजे।
कार्यशालाः उड़ान एवं प्रेस क्लब की ओर से लोककला कार्यशाला का समापन, प्रेस क्लब, चार बजे।
सांस्कृतिकः बाल नाट्य कला की प्रस्तुति 'भूत का डर' बाल्मीकि रंगशाला, गोमतीनगर, छह बजे, संस्कृति सेवा संस्थान की ओर से अविष्कार नाटक का मंचन, बीएमशाह प्रेक्षागृह गोमतीनगर, शाम सात बजे।
प्रशिक्षणः राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की ओर से तीन दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन योजना भवन, 11:30 बजे।
चिकित्सा शिविरः प्राकृतिक चिकित्सा पर 15 दिवसीय दर्द प्रबंधन चिकित्सा शिविर. विवेकानंद पॉलीक्लीनिक एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आईटी चौराहा

साथी हाथ बढ़ाना रे

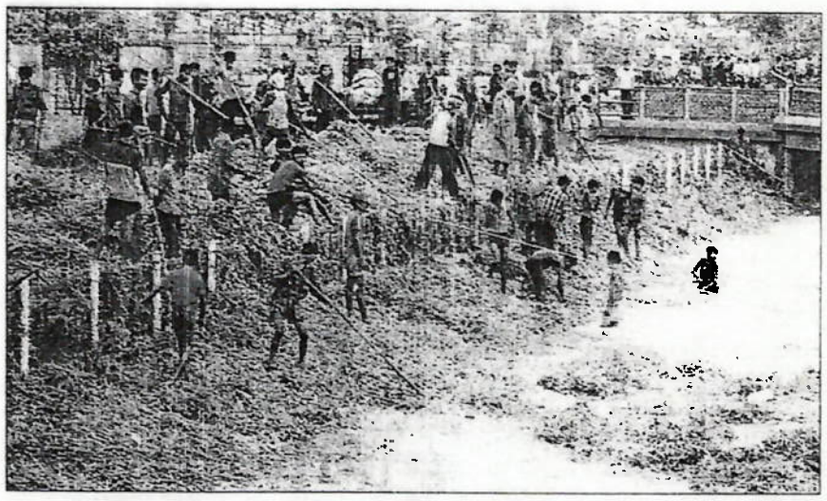

नगर विकास मंत्री नकुल दुबे ने रविवार को कुड़िया घाट पर गोमती सफाई अभियान शुरू किया

गोमती की तस्वीर बदलने में जुटे साढ़े तीन सौ मजदूर

वरिष्ठ संवाददाता लखनऊ

गोमती सफाई का अभियान रविवार से शुरू हो गया। नगर विकास मंत्री नकुल दुबे ने अपनी देखरेख में अभियान की शुरुआत कराई। कुड़ियाघाट पर सफाई अभियान शुरू होने के बाद रविवार को ही इस काम में 350 मजदूर जुटा दिए गए। यह मजदूर 50-50 की टुकड़ियों में गोमती से जलकुम्भी और कनिया घास साफ करेंगे। नगर विकास मंत्री ने यह घोषणा की कि जो टुकड़ी अच्छा काम करेगी उसे पुरस्कृत किया जाएगा। सफाई पूरी करने के लिए 30 जून की तारीख तय की गई है।

प्रदेश सरकार के निर्देश पर गोमती सफाई की कार्ययोजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत नगर निगम को जलकुम्भी और घास की सफाई करानी है। सिंचाई विभाग जलकुम्भी को ड्रेजिंग कराएगा। आगे से नदी के पानी में घास न उगे इसके लिए आई आईटी कानपुर से वैज्ञानिकों की मदद ली जाएगी। गोमती के किनारे के गांव

अभियान

- 50-50 की टोलियाँ बनाकर नदी साफ करेंगे मजदूर
- अच्छा काम करने वाली टोली होगी पुरस्कृत
- जलकुम्भी साफ करेगा नगर निगम और ड्रेजिंग कराएगा सिंचाई विभाग

सिंचाई विभाग सफाई कराएगा। अभियान के शुभारम्भ के अवसर पर ही नगर निगम के अधिकारियों सहायक नगर आयुक्त आर. के. गुप्ता, जोन दो के प्रभारी अरुण कुमार गुप्ता, सहायक नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, सहायक नगर आयुक्त अनुपम शुक्ला और कर निरीक्षक नीलेश रमन को शहीद स्मारक, वैकुण्ठधाम और गांधी सेतु के पास तैनात कर उन्हें जिम्मा सौंप दिया गया।

कुछ भी कुछ कहना है
इस कूपन पर अपना विचार भेजें MBKUH स्पेस के बाद अपना मैसेज 54242 पर एयरसेल पर

गोमती को स्थायी [illegible]

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

1152 ~~1061~~ (14) 104

नऊ जागरण

पांच वर्ष में नहीं बन सका ककरहा एसटीपी

गोमती नदी की सफाई के क्रम में बुधवार को बैराज के पास जलकुम्भी निकालते श्रमिक

लखनऊ, 18 जून (जासं) : पांच वर्ष से नहीं बन सका ककरहा शोधन संयत्र संयत्र (एसटीपी) धन उपलब्ध होने के बावजूद नहीं बन सका। इसके अभाव में नालों की गन्दगी इसमें सीधे डाली जा रही है। गौरतलब है कि गंगा एक्शन प्लान में गोमती सफाई योजना को शामिल करते हुए वर्ष 2003 में इसके दूसरे चरण में 375 मिलियन लीटर पानी प्रति दिन (एमएलडी) क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एसटीपी) की योजना को स्वीकृत हुए पांच वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। इसके लिए केन्द्र सरकार से 263 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। इसमें से 47 करोड़ रुपये से 42 एमएलडी क्षमता का दौलतगंज एसटीपी लगा। शेष 345 एमएलडी के लिए 120 हैक्टेयर भूमि ककरहा गांव में दी जानी थी। भूमि अधिग्रहण के लिए जल निगम ने वर्ष 2003-04 में तत्कालीन डीएम को तीन करोड़ छह लाख रुपये सौंपे। बाद में 7 सितम्बर 2006 में हुई लविप्रा बोर्ड की बैठक में इस जमीन को आवासीय घोषित कर दिया। दिसम्बर 2006 में लविप्रा ने आउटर रिंग रोड के बाहर लौलाई व देवरिया गांव के बीच इन्दिरा नहर नाले के पास एसटीपी के 520 बीघा भूमि चिन्हित की। अब एक बार फिर इसे ककरहा से लगभग पांच किलोमीटर आगे लोनापुर, भरवारा और भैसोरा गांव में 119.557 हैक्टेयर भूमि दिये जाने की बात है। इसमें से 113 हैक्टेयर कृषि भूमि और शेष अर्बन सीलिंग की जमीन है। लविप्रा, नगर निगम, प्रशासन, जल निगम आदि जिम्मेदार महकमों के लापरवाह रवैये से पांच वर्ष से गोमती को गन्दगी से मुक्ति नहीं मिली।

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

GIVING LUCKNOW'S LIFELINE A BREATHER

123 tonnes of waterweeds removed, NGO to pitch in

Anupam Srivastava

LUCKNOW Municipal Corporation has claimed to have removed 123 tonnes of waterweeds in five days, since the start of the cleaning drive by urban development minister on Sunday. After watching the serious efforts of river cleaning by LMC a city based NGO Pankhuri Foundation has also offered its hands to clean the river.

According to municipal authorities, this is the biggest drive on Gomti manually. "We are trying to remove the filth from the river is the lifeline of Lucknow as it is the main source of water for the residents here. Once the river is cleaned from Kudia Ghat, Shaheed Smarak, Gandhi Setu and Baikunth Dhaam we can start cleaning drive in other areas too," said additional municipal commissioner AC Sinha. He claimed that 123 tonnes of waterweeds had been removed from Gomti.

However urban development Nakul Dubey has already said that the drive will be remembered for its low cost and its effect on the river.

Dubey said, "We will show that without spending a huge amount we can clean the river. People will feel the difference between the drives organised by others and the present drive."

According to environmentalists the (Jal Kumbhi) waterweeds soak up a lot of water, which reduces the water level in the river. With the cleaning of these weeds from the river, the water level would rise.

According to environmentalist Anuradha Gupta if the weeds are fully wiped out from the river then water level would surely rise and at the same time the removal of filth from the river would help raise the oxygen level.

However, Charu Mishra of Pankhuri Foundation said, "Our organisation has decided to clean Gomti with the LMC. We want to play our role in cleaning of river. We will be present at Kudia Ghat on Friday with around 60 volunteers."

Meanwhile, former urban development minister Lalji Tandon is least impressed by the drive attending a function at mayor's house on Tuesday he said, " People participation during the Gomti cleaning drive was there to be seen, during my tenure. But, today people are not associated with the drive, we brought dredging machines to increase the depth of river, but this time nothing is being done. It's just a show off."

artanupam@gmail.com

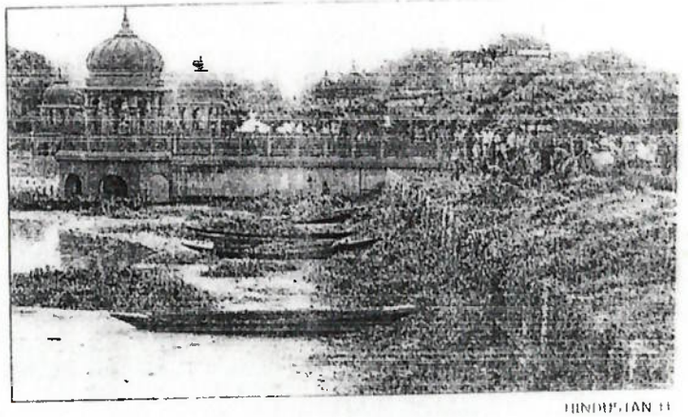

HINDUSTAN H

The Gomti cleaning drive underway at Kudia Ghat.

HIGH COURT COMMISSIONER FOR OATHS

राजभाषा का प्रसार

सिंडिकेट बैंक ने हिन्दी कार्यशाला आयोजित की 7

पुष्पांजलि :

बलिदान दिवस डॉ. श्यामाप्रसाद

www.

अब सियासी पार्टियाँ भी साफ करेंगी गोमती

लखनऊ। गोमती की सफाई शुरू हुए दस दिन बीत चुके हैं। नगर निगम के मजदूर कड़ी मेहनत के बाद भी अभी कुड़ियाघाट से जलकुंभी नहीं हटा सके हैं। शहीद स्मारक से डालीगंज पुल, निशातगंज से भैसाकुण्ड और बैराज से गांधी सेतु तक फैले जलकुंभी, काई, पॉलीथिन व कूड़ा-कचरा वगैरह के जाल से जीवनदायिनी गोमती अब भी मुक्त नहीं हो सकी है। पिछले सप्ताह शुक्रवार व रविवार को कुछ स्वैच्छिक संगठनों के आह्वान पर गोमती की सफाई के लिए कई लोग आगे आए मगर जीवनदायिनी अभी कई और लोगों का सहयोग मॉग रही है। इस महा अभियान से राजनीतिक दल अब तक दूर रहे हैं। 'हिन्दुस्तान' ने सोमवार को प्रमुख दलों के नेताओं को इस मुद्दे पर कुरेदा तो सभी ने एक राय व्यक्त की। सभी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गोमती की सफाई के लिए जुट जाने का वादा किया।

सिराज वली खॉ
जिलाध्यक्ष, कांग्रेस

जो हमें जीवन दे रही हो उसके लिए थकट हमने अब तक कुछ नहीं किया। करीब-करीब आधा शहर गोमती का पानी पी रहा है मगर हमने नदी को साफ रखने के लिए न तो सरकार पर दबाव बनाया और न ही जनांदोलन छेड़ा। हम नहीं चाहते कि गोमती पर राजनीति हो। संभव हुआ तो अगले ही सप्ताह डालीगंज के पास जलकुंभी, पॉलीथिन व काई हटाने के लिए जुटेंगे। हमारा अभियान एक दिन का नहीं बल्कि जब तक नगर निगम की जरूरत होगी तब तक हमारे कार्यकर्ता श्रमदान करते रहेंगे।

मो.खालिक
जिला सचिव, भाकपा

यह बात सही है कि अभी तक हमारी तरफ से कोई पहल नहीं हुई। अब और देरी नहीं होगी। स्वैच्छिक संगठनों को देख हमारे कार्यकर्ता भी नदी की सफाई के लिए उत्साहित है। हमने उनके साथ चलकर जल्दी ही श्रमदान करने की योजना बना ली है। हम तो गोमती की सफाई को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। हमारी तो सरकार से मांग है कि गोमती को प्रदूषित कर रहे नाले का पानी ट्रेंच बनाकर किसानों को सिंचाई के लिए दे दिया जाए। बनारस में ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता?

अशोक यादव
जिलाध्यक्ष, सपा

सपा ने सदैव जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष किया है। फिर जीवनदायिनी के लिए श्रमदान करने और उसका अस्तित्व बचाने के लिए पार्टी क्यों पीछे रहेगी? हमारा योगदान मात्र श्रमदान तक नहीं रहेगा बल्कि हम नदी को मैला कर रहे तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए रैली, प्रदर्शन भी करेंगे। मीडिया ने नदी के प्रति जो जनजागरण अभियान शुरू किया है उसे आगे बढ़ाने के लिए हम लखनऊ में ही नहीं गोमती के किनारे बसे गाँवों के लोगों को भी श्रमदान करने के लिए प्रेरित करेंगे।

मान सिंह
महामंत्री, भाजपा
महानगर इकाई

गोमती की सफाई के लिए तो हमारे ही दल ने पहली बार सोचा। पूर्व नगर विकास मंत्री लालजी टंडन के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता एक बार फिर नदी की सफाई अभियान से जुड़ना चाहते हैं। 27 जून के बाद पार्टी रेजाना श्रमदान करने के लिए अपना कार्यक्रम ऐलान करेगी। इतना ही नहीं नाली-नाले में कूड़ा-करकट, पॉलीथिन डाल रहे लोगों को अब और ऐसा न करने के लिए भी प्रेरित करेगी। पार्टी सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना-प्रदर्शन भी करेगी।

गीता शुक्ला
महासचिव, राजद

हमारी पार्टी जल्द ही गोमती ही नहीं बल्कि सूख रही सभी नदियों का प्राण रक्षा के लिए अभियान शुरू करेगी। इस अभियान सबसे बड़ा जोर पॉलीथिन पर रोक लगाने का रहेगा। इसके अलावा नदी में फूल समेत अन्य कचरा डालने वालों के खिलाफ भी जनांदोलन चलाया जाएगा। अल्द ही दल के कार्यकर्ता मकबाट के पास नदी में आ रही गंदगी को रोकने के लिए सरकार से पुख्ता प्रबंध करने की मॉग करेंगे। अगले सप्ताह ही हमारे कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष कैलाशनाथ यादव के नेतृत्व में श्रमदान के लिए भी जुटेंगे।

गुझे भी कुछ कहनी है

इस मुद्दे पर अपने विचार भेजें MBKKH स्पेस के बाद अपना मैसेज 54242 पर एसएमएस करें

गोमती को साफ करने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

1155 ~~1064~~ 17 107

गुलजार होने लगा चमन

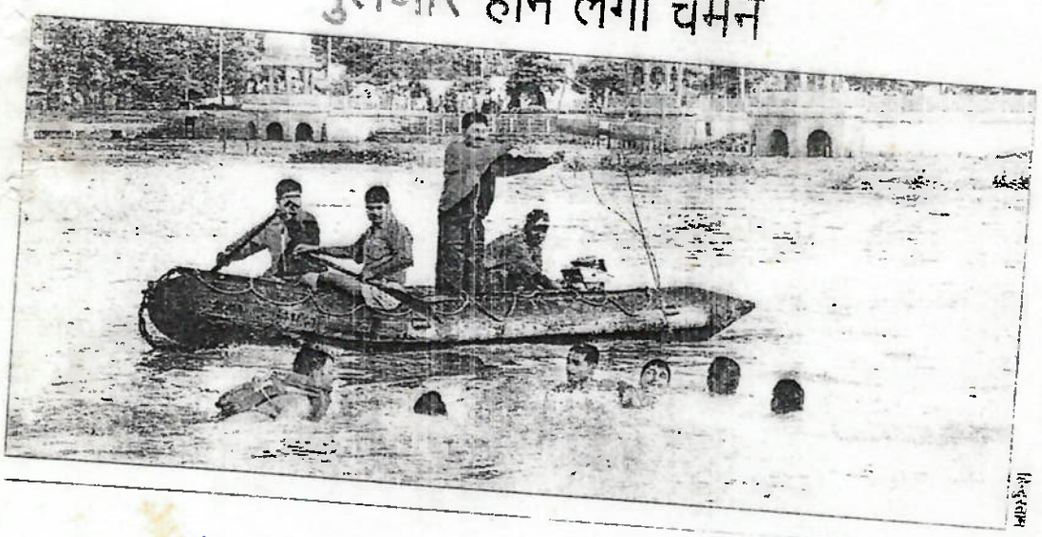

गोमती साफ दिखी तो बाढ़ राहत कार्य का प्रशिक्षण लेने वाले पीएसी जवान फिर कुड़ियाघाट के सामने पहुँच गए। अभी तक ये लोग सीतापुर, लखीमपुर और अन्य जिलों में ही प्रशिक्षण कार्य पूरा करते थे

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

1156 ~~1065~~ (18) 108

Tonnes of filth scooped out of Gomti, experts say not enough

Workers clean up the Gomti river. *Express photo by Vishal Srivastav*

LALMANI VERMA
LUCKNOW, JUNE 22

DURING the last one week, in which the Lucknow Municipal Corporation (LMC) has been cleaning river Gomti, it has manually removed 180 tonnes of filth — including waterweeds, plastic bags, glasses and other non-biodegradable waste.

The LMC had started this drive recently after Chief Minister Mayawati expressed concern over the condition of the river. As many as 350 men are working at Kuriya Ghat, Shaheed Smarak, Gandhi Setu and Baikunth Dham to clean the river. Additional Municipal Commissioner A C Sinha said: "We will continue until the river surface is cleaned up." The drive is costing LMC Rs 30,000 every day.

Environment experts, however, believe that the drive is not sufficient to save this highly polluted river — the source of the city's drinking water. "The biggest problem is the 26 major drains which discharge waste into the river. There is a need to first divert these drains and treat their effluents before discharge," said Dr Anshumali Sharma, an ecologist.

Chief Scientific Officer of Uttar Pradesh Pollution Control Board, D C Gupta, said: "Weeds on the surface of the river decrease the oxygen level in water. By removing them, only the oxygen level could be increased. But if the river has to made pollution-free, the waste has to be treated before being discharged in the river." He added that the pollution level in Gomti was the highest at Pipraghat and Gomti Barrage, as the water stagnates at these sites.

"Decreased oxygen level in water proves fatal for the fish. In the last three years, incidents of death of fishes have increased in the Gomti. Thus, there is a need to clean the river on a regular basis," said another UPPCB official.

To this, Sinha said that though it is the duty of the LMC to clean the river, the Jal Nigam is responsible for diverting drains and treating waste.

A source said drains discharge 358 MLD of untreated effluents into the river every day. To divert all the 26 existing drains to a sewage treatment plant (STP), the Centre had started the Gomti Action Plan (GAP) in 1995. In the first phase, started in 2001, seven major drains were supposed to be diverted to a STP in Dulatganj. At present, however, effluents of only four drains — Pata Nala, Sarkata, Gaughat and Nagaria — are being treated in the STP having a capacity of 42 MLD.

The second phase of the project, worth Rs 263.26 crore, was launched in 2003 to divert the remaining drains. To treat the discharge, a 343 MLD-capacity STP was proposed to be developed by March. It has, however, still not come up due to frequent changes in its location.

GAP Project Manager A K Mittal said, "Land for the STP has now been finalised in Bharwara. An amount of Rs 40.4 core has been provided for land acquisition. It will be another two years before the completion of the project." Until then, the least LMC can do is to install grills at the drains so that no solid waste can enter the river, and crack down on those who are using the sewage system to dispose garbage.

COMMISSION FOR CIVIL

उम्मीद जगी साफ हो सकेगी गोमती

युनाइटेड समाचार सेवा

लखनऊ, २२ जून। मायावती सरकार के गठन के बाद गोमती में बढ़ रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्तर पर नदियों के सफाई का अभियान यदि जोर पकड़ सका तो सम्भवतः इस बार गोमती साफ हो सकेगी। ऐसे इसलिए क्योंकि सत्ता इस समय बसपा के पास और उसकी लगाम मायावती के हाथों में है जो अपनी घोषणाओं के सम्बन्ध में न नही सुनना चाहती हैं। गोमती एक्शन प्लान को एक बार भाजपा के शासन काल में तत्कालीन नगर विकास मंत्री लालजी टण्डन ने भी लागू करने की कोशिश की थी। उनकी तमाम सद्इच्छाओं के बावजूद गोमती को साफ सुथरा न किया जा सका। इसके लिए काफी हद तक राजधानी के पढ़े लिखे लोग भी जिम्मेदार है।

हालात यह है कि आज २६ छोटे बड़े नाले गोमती में गिर रहे है। इनके जरिये प्रतिदिन लगभग तीन सौ सत्तर एमएलडी (सैंतीस करोड़ लीटर) मल मूत्र युक्त पानी गोमती में गिरता है। जब गोमती जैसी नदी में जिसका अपस्ट्रीम कमजोर है इतना मल मूत्र का प्रवाह रोज हो रहा हो तब कहां से उसमें सफाई की उम्मीद की जा सकती है। जब तक इसे बंद नही किया जाता गोमती को स्वच्छ रखने की कोई भी कवायद महज राजनैतिक नारेबाजी साबित होगी। गोमती पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रदूषित और जहरीली होती चली जायेंगी। और लोगों के पास सिवाय गाल बजाने के कुछ खास नहीं रह जायेगा।

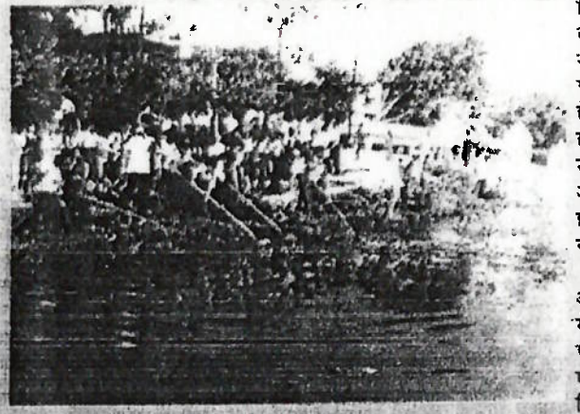

यह हर्ष की बात कि पंखुडी जैसी समाजिक संस्था ने गोमती सफाई अभियान में अपना योगदान निभाना शुरू कर दिया ह किन्तु अभी इस प्रयास को और तेज किये जाने की जरूरत है। जब हम अपने घर आस पड़ोस की सफाई कर सकते है। तो सबको जीवन प्रदान करने वाली गोमती को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान क्यों नहीं निभा सकते यह काम सिर्फ राज्य सरकार की मंशा से पूरा नही होने वाला है यह तभी सफल हो सकेगा जब समाज के सभी वर्ग आगे आये और इसमें अपना योगदान निभाये।

गोमती सफाई अभियान के सन्दर्भ में गंगा एक्शन प्लान और गोमती एक्शन प्लान की विफलता पर ध्यान देना होगा गौरतलब है कि जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे गंगा की सफाई के लिये देश व्यापी गंगा एक्शन प्लान और इस तर्ज पर गोमती एक्शन प्लान की रूपरेखा तैयार की गयी थी। केन्द्र और राज्य सरकार के बीच आपसी समन्वय के अभाव बेहतर तालमेल के चलते यह योजना बहेतर ढंग से क्रियान्वित न हो सकी। तब १९९३ में केन्द्र सरकार द्वारा १३१ करोड़ रुपये की गोमती प्रदूषण नियंत्रण योजना स्वीकृत की गयी थी जिसके तहत आज से छह वर्ष पूर्व नगरिया सरकटा, पाटा, वजीरगंज, एवं घसियारी मण्डी, नालों का पानी रोक कर दौलतगंज के पास ४२ एम एल डी क्षमता का जल शोधन संयत्र लगाया गया था उसके बाद यह काम इसलिए आगे नही बढ़ा कि दूसरा संयत्र लगाने के लिए जमीन भी नही मिली परिणाम स्वरूप आज भी गोमती में ३७० एमएलडी गंदा पानी मिल रहा है। २००२ के बाद यह काम एक तरह से रूक गया इसके लिए जहां भी जमीन तलाशी गयी कुछ न कुछ बाधा आती गयी कुकरैल नाला सवीरेज प्लान्ट लगाने की योजना जरूरी बनी लेकिन रक्षा विभाग के अड़ेगे बाजी के चलते काम आगे न बढ़ सका। मौजूदा परिस्थितियों में गोमती में प्रदूषण दूर करने के लिए नये सिरे से एक्शन प्लान बनाने की न सिर्फ ज़रूरत है बल्कि इस पर अमल भी होना चाहिए।

MK

1158 ~~1067~~ (20) 110

सेवा में -

श्रेष्ठ कटिंग नगर आयुक्त महोदय 19/6/08

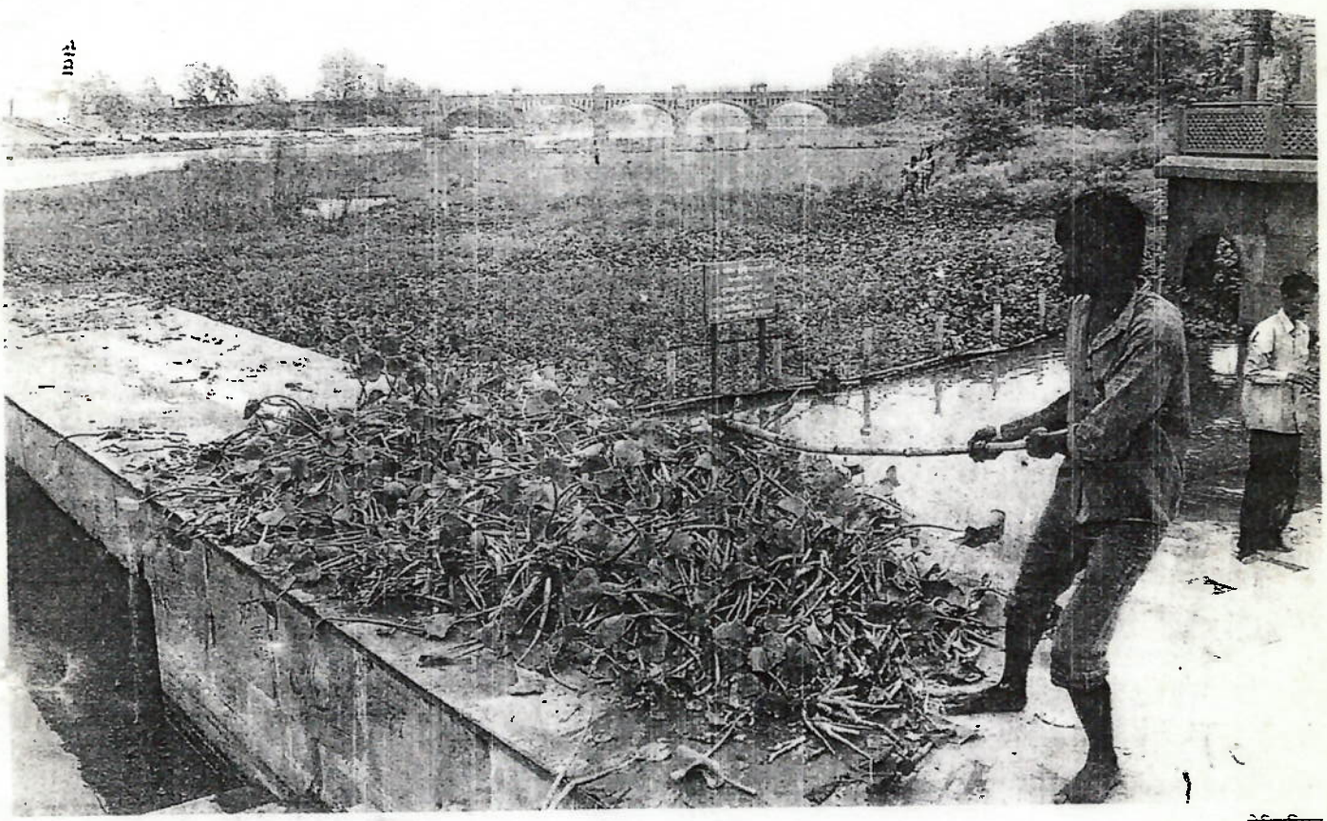

कुड़ियाघाट पर गोमती नदी की सफाई करता श्रमिक ऐक्टिविस्ट

2465/PRO
20-6-08
जन सम्पर्क अधिकारी
नगर निगम
लखनऊ

~~P.S~~ Adm (A)

कृते नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

P.S

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

COMMISSIONER FOR OATH
High Court, ALLAHABAD

212

1159 1068 (21) 11

ई० जागरण 19/6/08

बेपर कटिंग नहर बापुरा गोरखपुर

पांच वर्ष में नहीं बन सका ककरहा एसटीपी

गोमती नदी की सफाई के क्रम में बुधवार को बैराज के पास जलकुम्भी निकालते श्रमिक

लखनऊ, 18 जून (जासं) : पांच वर्ष से नहीं बन सका ककरहा शोधन संयत्र संयत्र (एसटीपी) धन उपलब्ध होने के बावजूद नहीं बन सका। इसके अभाव में नालों की गन्दगी इसमें सीधे डाली जा रही है। गौरतलब है कि गंगा एक्शन प्लान में गोमती सफाई योजना को शामिल करते हुए वर्ष 2003 में इसके दूसरे चरण में 375 मिलियन लीटर पानी प्रति दिन (एमएलडी) क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एसटीपी) की योजना को स्वीकृत हुए पांच वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। इसके लिए केन्द्र सरकार से 263 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। इसमें से 47 करोड़ रुपये से 42 एमएलडी क्षमता का दौलतगंज एसटीपी लगा। शेष 345 एमएलडी के लिए 120 हैक्टेयर भूमि ककरहा गांव में दी जानी थी। भूमि अधिग्रहण के लिए जल निगम ने वर्ष 2003-04 में तत्कालीन डीएम को तीन करोड़ छह लाख रुपये सौंपे। बाद में 7 सितम्बर 2006 में हुई लविप्रा बोर्ड की बैठक में इस जमीन को आवासीय घोषित कर दिया। दिसम्बर 2006 में लविप्रा ने आउटर रिंग रोड के बाहर लौलाई व देवरिया गांव के बीच इन्दिरा नहर नाले के पास एसटीपी के 520 बीघा भूमि चिन्हित की। अब एक बार फिर इसे ककरहा से लगभग पांच किलोमीटर आगे लोनापुर, भरवारा और भैसोरा गांव में 119.557 हैक्टेयर भूमि दिये जाने की बात है। इसमें से 113 हैक्टेयर कृषि भूमि और शेष अर्बन सीलिंग की जमीन है। लविप्रा, नगर निगम, प्रशासन, जल निगम [illegible] जिम्मेदार महकमों के लापरवाह रवैये से पांच वर्ष से गोमती को गन्दगी से मुक्ति नहीं मिली

19/6/08

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

1160 ~~1067~~ (22) 112

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

W. P. NO. 486 (M/B) OF 200

Sewage Treatment ... PETITIONER

Vs.

Gomti Nadi ... 200 ... OPP. PARTIES

ANNEXURE NO. 3

5 19/6/10-3

कार्यालय :— नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ।

संख्या 1-294/N.N/2008-11/08 दिनांक 16.07.08

कार्यालय ज्ञाप

गोमती नदी की सफाई कार्य दिनांक 15.06.2008 से आरम्भ होकर 09.07.2008 को सम्पन्न हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद की दिनांक 08.07.08 की आयोजित बैठक में माननीय अध्यक्ष द्वारा यह निर्देशित किया गया कि गोमती नदी की सफाई का कार्य जारी रखा जाए। गोमती नदी की सफाई का कार्य पुनः निम्नवत् आरम्भ किया जाये:—

सेक्टर—1 का क्षेत्र गऊघाट से डालीगंज पुल तक होगा। इस सेक्टर की सफाई का कार्य जोनल प्रभारी, जोन—2 व 6, अधिशासी अभियन्ता, जोन—2 व 6 द्वारा अपनी देखरेख में कराया जायेगा।

सेक्टर—2 का क्षेत्र डालीगंज से गोमती बैराज होगा। इस सेक्टर की सफाई का कार्य जोनल प्रभारी, जोन—1 व 3, अधिशासी अभियन्ता, जोन—1 व 3 द्वारा अपनी देखरेख में कराया जायेगा।

सेक्टर—3 का क्षेत्र गोमती बैराज से पिपराघाट तक होगा। इस सेक्टर की सफाई का कार्य जोनल प्रभारी, जोन—4 व अधिशासी अभियन्ता, जोन—4 द्वारा अपनी देख रेख में कराया जायेगा।

प्रत्येक सेक्टर में 30—30 मजदूर लगाये जायेगे जिसमें 15 आसामी/देनदारी मजदूर हो जो कि नदी की सफाई में एक्सपर्ट माने जाते है। प्रत्येक सेक्टर में एक नाव भी उपलब्ध रहेगी। अधिशासी अभियन्ता आर.आर. द्वारा वांछित संख्या में नेट—जाल उपलब्ध करायी जायेगी। निकाली गयी जलकुम्भी/सिल्ट तथा अन्य आकड़ो का रखरखाव व्यवस्थित ढंग से किया जायेगा। कार्य का शुभारम्भ सेक्टर—1 में जोनल प्रभारी

अभियन्ता (1)
स्वास्थ्य अधिकारी (3)
लिये हेतु आवश्यक कार्यवाही करने
कष्ट करें।
21/7/08

1161 ~~1070~~ (23) 113

जोन–6 सेक्टर–2 में जोनल प्रभारी जोन–1 तथा सेक्टर–3 में जोनल प्रभारी जोन–4 द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 15 जून, 2008 से 9 जुलाई 2008 तक गोमती नदी की सफाई मे आने वाले व्यय का बजट हेड स्वास्थ्य विभाग से अंकित किया जायेगा।

वित्त एवं लेखाधिकारी पुनरीक्षित बजट में गोमती नदी की सफाई हेतु एक सब–हेड बनाएंगी जिसमें कि शासन से आने वाली धनराशि जमा की जायेगी और इसी सब–हेड से व्यय किया जायेगा।

(शैलेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

प्रतिलिपि –

1. समस्त अपर नगर आयुक्त
2. समस्त जोनल प्रभारी
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता
4. अधिशासी अभियन्ता आर.आर

(शैलेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD
2/7/08

1162 1071 114

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW.

C. M. Application No. of 2008

State of U. P. ----------Applicant

In re

Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

APPLICATION FOR TAKING ON RECORD

The applicant – respondent above named, most respectfully submit as under:

The applicant is filing the affidavit in the above noted writ petition in compliance of the order dated 22.5.2008 passed by this Hon'ble Court, which is expedient in the interest of justice. Hence the same be taken up on the record of the writ petition.

P R A Y E R

Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow the accompanying affidavit to be taken on the record.

Such other and further order which this Hon'ble Court may deem just, fit and proper under the circumstances of the case may also be passed.

Lucknow

Dated: 21-07-2008

H Srivastava

ADDL.CHIEF STANDING COUNSEL

(COUNSEL FOR APPLICANT)

1163
1072

115

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW .

Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

AFFIDAVIT OF DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF U.P., IN COMPLINACE OF THIS HON'BLE COURT'S ORDER DATED 22.5.2008.

I, S. P. Mishra aged about 50 years, son of Late Sri R. P. Mishra, presently posted as Special Secretary , Department of Urban Development , Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as Special Secretary , Department of Urban Development , Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, and as such he is fully conversant with the facts of the case deposed to hereinafter.

2 .That the deponent has read over the writ petition filed by the petitioner and has understood the contents thereof and is submitting some necessary facts, which are expedient in the interest of justice to be submitted before the Hon'ble Court herein under:

1164 ~~1173~~ 116

3. That the subject matter of the present writ petition relates to improvement of drinking water situation and sewage disposal system in Lucknow city.

4. That it is submitted that instant matter was listed on 22.5.2008 and on the day this Hon'ble Court pleased to pass an order , and directed to the respondents to submit the up-dated status report. This Hon'ble Court also directed to list the matter on 21.7.2008.

5. That in compliance of the order dated 22.5.2008 passed by this Hon'ble Court, instant affidavit is being filed narrating the facts and records relating to the matter in question.

6. That it is submitted that the U. P. Jal Nigam is an implementing agency on behalf of Nagar Nigam Lucknow and Jal Sansthan , Lucknow for execution, planning and design for drinking water supply, river pollution control work as well as the sewage disposal work. Therefore, the separate affidavit is being filed by the Nagar Nigam, Lucknow, U. P. Jal Nigam and Jal Sansthan , Lucknow in compliance of orders passed by this Hon'ble Court. However, the deponent is filing Zone-wise progress report submitted by the U. P. Jal Nigam. The true photostat copy of the progress details relating to the work performed by the U. P. Jal Nigam in different Zones of the Lucknow City till 19.7.2008 are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 1** to this affidavit.

It is submitted that under the Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme an amount of Rs. 40.00 Crores have been released out of which till date Rs. 36.00 Crores have been spent; the details of work done, under the Jawahar Lal

Oath Commissioner LUCKNOW

1165 ~~1074~~ 117

Nehru Urban Renewal Mission Programme are being mentioned as under:

(i). The Jal Nigam is also preparing detail project report under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme under which total 40 + 21 new Tube-Wells were proposed to install, out of which till 19.7.2008, 22 + 3 new Tube-Wells have been installed and they are working, and the installation work with regard to 18 + 12 new Tube-Wells are in progress.

Under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme total 43 old Tube-Wells were proposed for ~~repairing~~ reboring, out of which till 19.7.2008, 7 old Tube-Wells have been repaired and they are working, and the ~~repairing~~ reboring work with regard to 22 Tube-Wells are in progress.

The Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme covers about 133.31 Km. of distribution system, out of which the work within 17.0 Km have been completed till 19.7.2008.

The Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme covers about 14.40 Km. of work relating to rising main, out of which the work relating to 22 numbers of Tube-Wells have been completed till 19.7.2008, and rising main work relating to 8 numbers of Tube-Wells are in progress.

(ii). It is significant to submit that in different Zones of Lucknow City, under the Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme total 25 numbers of new tube-wells have been installed and work relating to installation of 30 number of new tube-wells are under progress till 19.7.2008.

Commissioner LUCKNOW

1166 ~~1075~~ 118

In different Zones, under the Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme total 7 number of old tube-wells have been rebored and work relating to reboring of 22 number of old tube-wells are under progress.

(iii). It is significant to submit that under the "Drinking Water Scheme" the works relating to installation of 409 numbers of hand-pumps were proposed, all of them have been installed and they are under working.

Under the "Drinking Water Scheme" the works relating to special repairing / rebore of 670 numbers of hand-pumps were proposed, all of them have been repaired / rebored and they are under working.

Out of aforesaid hand-pumps, under the "Drinking Water Scheme" the works relating to installation of 5 numbers of new Tube-Wells, and rebore of 39 other Tube-Wells were proposed, out of them 3 have been installed and all 39 Tube-Wells have been rebored till 19.7.2008.

7. That it is submitted that under Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow during the Financial Year 2008 – 09, in reference to the acquisition of 106.866 Hectare land at village Bharawara, Lonapur and Bhaisora for construction of Sewage Treatment Plant of 370 MLD capacity. For granting compensation, the amount has been sanctioned by the State Government to the U.P. Jal Nigam, Lucknow vide Government Order No. 3933 / Nine – 5 – 2008 – 11 (162) / 2000 TC dated 21st May 2008. It is submitted that for construction of Sewage Treatment Plant at village Bharawara, Lonapur and Bhaisora total 106.866 Hectare land has been acquired, and the possession on the said land for construction of Sewage Treatment Plant of 370 MLD capacity has been taken by the Nagar Nigam, on 16.7.2008,

Commissioner

1167 ~~1076~~ 119

and the compensation is being disbursed to the persons concerned.

For implementation of the sanctioned schemes under Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow during the 4th Quarter of the Financial Year 2007 – 08 , the National River Conservation Directorate, Ministry of Environment and Forests, Government of India released grant-in-aid in favour of Managing Director, U.P. Jal Nigam, Lucknow vide Government Order No. M – 14014 / 3 / 2003 – NRCD – II dated 28th March 2008.

It is significant to submit that from the aforesaid amount, the construction work relating to sanctioned schemes under Gomti Action Plan Phase – I have been completed except to two schemes , which are under progress. It is submitted that several works relating to Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow have been completed and remaining are in progress.

It is significant to submit that work relating to Branch Sewer, and Trunk Sewer under the Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme (in Lucknow Sewerage District – I) has been completed in 20 Km. and 3.0 Km against the proposed work of 289 Km. of Branch Sewer, and 48.0 Km. of Trunk Sewer.

For Sewage Pumping Station (56 MLD capacity) and Sewage Treatment Plant (14 MLD capacity), the works have been awarded under the Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme (in Lucknow Sewerage District – I).

The true photostat copies of the progress details relating to the work performed by the U. P. Jal Nigam under the Gomti Action Plan Phase – I ; Gomti Action Plan Phase – II and under the Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme (in Lucknow Sewerage District – I) till 19.7.2008

1168 ~~1077~~ 120

with latest physical / financial progress report are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 2** to this affidavit.

8. That in view of facts and circumstances stated herein above, it is significant to submit that the Urban Development Department, State of U.P. is taking all necessary steps in the matter in question.

Lucknow

Dated : 21-07-2008 Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of the paragraphs 1, 2 of this affidavit are true to my personal knowledge those of paragraphs 3 to 7 are true to my information which derived from the records and those of paragraphs 8 are based on legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God.

Lucknow

Dated : 21.7.08 Deponent

I , identify the deponent who has signed before me.

(ओम प्रकाश चौहान)
सहायक आयुक्त
नगर विकास अनुभाग-5
उ.प्र. शासन, लखनऊ

Commissioner Lucknow
21/7

वाद सं० 0208103
हाजिर किया गया श्री के. पी. मिश्र
जिनका परिचय है ओम प्रकाश चौहान
दिनांक 21.7.08 समय 11.00 बजे पूर्वाह्न
बाद संख्या 4536 सन् 2007
पक्षकार Urban Infrastructure Development Corp. U.P. & Ors.
न्यायालय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ पीठ.
शपथ की फीस वसूली गई

मैं साक्षी ने शपथ – पत्र पढ़ लिया है,
और इसकी विषय वस्तु समझता हूँ।

21/7/08
(डा० जटाशंकर त्रिपाठी)
शपथ आयुक्त एवं अतिरिक्त जिला

ANNEXURE A-1

~~1078~~ 1169

121

जनहित याचिका संख्या 4436(एम.बी.)/2003 पर दिनांक 21.5.2008 को मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के सम्बन्ध में आख्या (पेयजल)

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत लखनऊ नगर पेयजल योजना प्रथमचरण, भाग–1, अनुमानित लागत रू. 388.61 करोड़ के अन्तर्गत तृतीय जलकल गोमतीनगर का कार्य प्रस्तावित है। उक्त जलकल से गोमती नदी के पार स्थित गोमती नगर, इन्दिरा नगर एवं उससे सटी हुई अन्य आवासीय कालोनियों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाना है। उक्त जलकल हेतु कच्चे जल के स्रोत के रूप में शारदा सहायक फीडर कैनाल से कच्चा जल उपलब्ध होना है, जिसके लिये सिंचाई विभाग द्वारा रू. 19.01 करोड़ का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजना के विरूद्ध लखनऊ नगर निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई गई धनराशि से रू. 5.00 करोड़ का भुगतान सिंचाई विभाग को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के विरूद्ध किया जा चुका है।

तृतीय जलकल के निर्माण कार्य आदेशित किया जा चुका है। फर्म द्वारा तकनीकी ड्राइंग एवं डिजाइन प्रस्तुत की जानी है एवं माह जुलाई 2008 के अन्त में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। मूल प्राक्कलन के अनुसार द्वितीय जलकल का कार्यवर्ष 2010 तक पूर्ण कया जाना निर्धारित है। परन्तु इस कार्य को और कम समय में पूर्ण किये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

लखनऊ नगर के विभिन्न समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु जे.एन.एन.यू. आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत 40 नग नये नलकूप एवं 43 नग रिबोर नलकूपों का कार्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त योजना में सम्मिलित पांच पाइप पेयजल योजनाओं में 21 नग अतिरिक्त नलकूपों का कार्य भी प्रस्तावित है। योजना में सम्मिलित 40 नग नलकूपों, जिनको पूर्ण करने के उपरान्त केवल राइजिंग मेन बिछाकर वर्तमान में पड़ी हुई वितरण प्रणाली/उच्च जलाशय के माध्यम से चालू किया जाना है, के अन्तर्गत 22 नग नलकूपों की राइजिंग मेन बिछाकर चालू किया जा चुका है, शेष 18 नग नलकूपों का कार्य प्रगति पर है जिसमें से 8 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर है जिन्हें अतिशीघ्र पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित हैं

शेष 21 नग नलकूप, जो विभिन्न पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित है, उन नलकूपों का उपयोग नलकूप के पूर्ण होने के उपरान्त राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली आदि बिछाकर ही किया जा सकेगा। इनमें से 3 नग नलकूपों को चालू कर जलापूर्ति की जा रही है एवं 12 नग नलकूपों का कार्यप्रगति पर है शेष नलकूपों के उपयोग हेतु वितरण प्रणाली बिछाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

19.7.08

Addl. Commissioner LUCKNOW 217 Secretariat

~~1079~~ 1170 122

योजना में सम्मिलित 43 नग रिबोर नलकूपों में से 7 नग नलकूप चालू किये जा चुके हैं एवं 22 नग पर कार्य प्रगति पर है। नलकूप के यंत्र–संयंत्र की कमी एवं राइजिंग मेन हेतु पाइप की अनुपलब्धता के कारण प्रगति प्रभावित हो रही है। इसको दूर करने हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

पेयजल योजना सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 5 नग नये नलकूपों का कार्य प्रस्तावित था, जिसमें से 3 नग नलकूप क्रमशः फैजुल्लागंज, विनय खण्ड, गोमतीनगर एवं बी–ब्लाक, राजाजीपुरम, रानी लक्ष्मीबाई पार्क चालू किया जा चुका है एवं राज़ाजीपुरम ब्लाक–ई एण्ड एफ में 2 नग नलकूप का कार्य प्रारम्भ किया जाना है जिसके लिए निर्विवादित कार्य स्थल प्राप्त होना शेष है। निविर्वादित भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही नलकूपों का निर्माण कार्य किया जा सकेगा। प्रस्तावित 39 नग रिबोर नलकूपों में से समस्त 39 नग रिबोर नलकूपों को चालू किया जा चुका है जिनसे जलापूर्ति की जा रही है।

लखनऊ नगर में नगरीय पेयजल सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 409 नग नये हैण्डपम्प एवं 670 नग हैण्डपम्पों को रिबोर/विशेष मरम्मत द्वारा चालू किया जाना प्रस्तावित था। उक्त के विरूद्ध समस्त 409 नग नये हैण्डपम्प का अधिष्ठापन कार्य किया जा चुका है एवं 670 नग हैण्डपम्पों को रिबोर/विशेष मरम्मत द्वारा चालू किया जा चुका है।

19.7.08

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक

Commissioner LUCKNOW 417

पेयजल योजना

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 16.07.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

जे.एन.एन.एयू.आर.एम. कार्यक्रम

(रू. लाख में)

क्रमांक	कार्य प्रगति	प्रस्तावित कार्य	दि. 21.5.2008 तक की प्रगति	दिनांक 19.7.08 तक कुल प्रगति	दिनांक 21.5.08 के उपरान्त प्रगति
1.	नया नलकूप	40 नग	5 नग चालू 27 नग प्रगति पर	22 नग चालू 18 नग प्रगति पर	17 नग चालू, 8 नग कार्य प्रारम्भ। कुल 18 नग पर कार्य प्रगति पर
		21 नग	1 नग चालू 10 नग प्रगति पर	3 नग चालू 12 नग प्रगति पर	2 नग चालू, 04 नग पर कार्य प्रारम्भ। कुल 12 नग पर कार्य प्रगति पर।
2.	रिबोर नलकूप	43 नग	3 नग चालू 7 नग प्रगति पर	7 नग चालू 22 नग प्रगति पर	4 नग चालू, 19 नग पर कार्य प्रारम्भ। कुल 22 नग पर कार्य प्रगति पर।
3.	वितरण प्रणाली	133.31 कि.मी.	12.00 कि.मी.	17.00 कि.मी.	5.00 कि.मी. का कार्य पूर्ण।
4.	राइजिंग मेन	14.40 कि.मी.	6 नग नलकूपो की राजिंग मेन पूर्ण एवं चालू 3 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रारम्भ	22 नग नलकूपों की राजिंग मेन पूर्ण एवं चालू 8 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रारम्भ	16 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू 8 नग नलकूप की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर।

योजना पर अवमुक्त धनराशि : रू. 40.00 करोड़
योजना पर अब तक व्यय : रू. 36.00 करोड़

19.7.08

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक

Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

~~1081~~ 124

लखनऊ नगर में जल सस्थान के विभिन्न जोनों में जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराषि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण 1172

दिनांक 19.7.2008 तक

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	अद्यतन प्रगति
1.	जोन–1, लालबाग	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	2 नग चालू, 1 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	3 नग चालू, 6 नग प्रगति पर।
2.	जोन–2, ऐषबाग	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	4 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	–
3.	जोन–3, अलीगंज	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	10 नग चालू, 5 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	4 नग चालू, 7 नग प्रगति पर।
4.	जोन–4, आलमबाग	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	5 नग चालू, 10नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	2 नग प्रगति पर।
5.	जोन–5, इन्दिरानगर	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	8 नग चालू, 5 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	3 नग प्रगति पर।
6.	जोन–6, राजाजीपुरम	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	5 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	4 नग प्रगति पर।
	योग :	**नया नलकूप**	**25 नग चालू 30 नग प्रगति पर**
		रीबोर नलकूप	**7 नग चालू 22 नग प्रगति पर**

19.7.08

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक

Civil Commissioner LUCKNOW

2117

1173

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई तृतीय(वि0/यॉ0), उ0प्र0,जल निगम , लखनऊ ~~1082~~ 125

दिनांक 19.7.2008 तक की प्रगति

अ. जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित किये जाने वाले 40 नलकूपों का निर्माण-:
कुल- 40 नग नये नलकूप
उपलब्धि 21 नग (जलापूर्ति प्रारम्भ)

क्र. सं.	नलकूप का नाम और जल स्राव ली. प्रति मिनट	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जलापूर्ति प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि	जलापूर्ति प्रारम्भ करने की निर्धारित तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम. एल.डी	वर्तमान की प्रगति	टिप्पणी
			संभावित	वास्तविक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अलीगंज सेक्टर-एच जोन-3 (1500 ली.प्र. मि.)	1.1.07		6.5.08	16.5.08		1.5		
2	इंदिरानगर डी ब्लाक, जोन-5 (1000 ली..प्र.मि.)	15.12.07		1.5.08	12.5.08		1.00		
3	विजय खण्ड, जोन-5 (1000 ली.प्र.मि)	5.3.08		12.5.08	17.5.08		1.00		
4	अलीगंज सेक्टर -सी/डी, जोन-3 (1000 ली.प्र.मि.)	17.3.08		7.5.08	17.5.08		1.00		
5	गुलिस्ता कालोनी, जोन-1 (1000 ली.प्र.मि.)	18.3.08		18.5.08	18.5.08		1.00		
6	अहिंसा पुरम जोन-3 (1000 ली .मि)	30.3.08		8.5.08	31.5.08		1.00		
7	त्रिवेणी नग, जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	17.3.08		8.5.08	7.6.08		1.00		
8	स नगर, सेक्टर-9 (1000 ली.प्र.मि)	19.4.08		19.5.08	11.6.08		1.00		
9	सहयोग पार्क, महानगर जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	29.4.08		21.5.08	20.6.08		1.00		
10	जानकीपुरम सेक्टर-एच ,अलीगंज जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	15.4.08		2.6.08	17.6.08		1.00		
11	हिन्द नगर नलकूप जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	11.3.08		10.6.08	17.6.08		1.00		
12	तातारपुर सेक्टर-ई अलीगंज जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	13.4.08		29.5.08	18.6.08		1.00		
13	मेहदी टोला,विष्णुपुरी कालोनी जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	9.5.08		7.6.08	18.6.08		1.00		
14	शिवपुरी पार्क गणेश गंज, जोन-1 (1000 ली.प्र.मि)	15.4.08		16.6.08	22.6.08		1.00		
15	कानपुर रोड योजना सेक्टर-जे, जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	10.4.08		20.6.08	23.6.08		1.00		
16	विनीत खण्ड, जोन-5 (1000 ली.प्र.मि)	24.3.08		15.6.08	28.6.08		1.00		
17	पश्चिम [illegible] सेक्टर-सी-1 जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	21.4.08		26.6.08	4.7.08		1.00		
18	दामोदर नगर,आलमनगर, जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	13.4.08		30.6.08	4.7.08		1.00		
19	इंदिरा नगर बी- ब्लाक जोन-5 (1000 ली.प्र.मि)	15.3.08		16.6.08	8.7.08		1.00		
20	[illegible]री निशातगंज , जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	5.5.08		15.6.08	10.7.08		1.00		
21	पंचवटी कालोनी, रहीम नगरोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	19.5.08		15.6.08	11.7.08		1.00		तदैव

Jal Sanstha Zone

Chief Commissioner LUCKNOW

217

1174 ~~1085~~

126

क्र0	नलकूपों का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जलापूर्ति प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि	जलापूर्ति प्रारम्भ करने की निर्धारित तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी	वर्तमान की प्रगति	टिप्पणी
			सम्भावित	वास्तविक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	जानकी पुरम सेक्टर-सी, जोन-3	9.5.08		17.6.08		23.6.08		पम्प सेट चालू	राइजिंग मेन जोड़ा जाना है।
23	विवेक खण्ड -4 गोमती नगर जोन-5	15.4.08		21.6.08		23.6.08		तदैव	तदैव
24	सोसाइटी पार्क नरही, जोन-1	9.5.08		26.6.08		11.7.08		तदैव	तदैव
25	साउथ सिटी रश्मि खण्ड, जोन-4	9.5.08		30.6.08	17.7.08			जलापूर्ति प्रारम्भ	
26	सेक्टर-आई, एल.डी.ए. कालोनी आलमबाग, जोन -4	29.4.08		3.7.08		6.7.08		पम्प सेट चालू	तदैव
27	अलीनगर राजाजीपुरम जोन-6	29.4.08	7.7.08			8.7.08		पम्प सेट अधिष्ठापित वि.स. आपेक्षित	तदैव
28	खुडा बरहा, आनन्दनगर, जोन-4	8.5.08	7.7.08			9.7.08		ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य पूर्ण	
29	इंदिरानगर सेक्टर-14, जोन-5	5.5.08	15.7.08			17.7.08		ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	
30	ब्रहम नगर, जोन-4	8.5.08	8.7.08			10.7.08		तदैव	
?	मातादीन [illegible] कोठी,सहादतगंज जोन-6	13.4.08	5.7.08			7.7.08		ओ.पी. यूनिट की शिफ्टिंग प्रगति पर	
32	विशाल खण्ड गोमतीनगर, जोन-5	6.6.08	19.7.08			19.7.08		तदैव	
33	हुसैनाबाद शिवपुरी , जोन-2	19.5.08	16.7.08			18.7.08		कम्प्रेसर से विकास क्रार्य प्रगति पर	
34	आनन्द नगर वरहा रोड , जोन-4	10.6.08	25.7.08			27.7.08		तदैव	
35	विनय खण्ड-1, गोमतीनगर , जोन-5	6.6.08	18.7.08			18.7.08		कम्प्रेसर से विकास हेतु ट्रेंस्टालेशन प्रगति पर	
36	स्टार कालोनी सेक्टर-9 इंदिरा नगर , जोन-5	20.5.08	15.7.08			17.7.08		कम्प्रेसर से विकास कार्य पानी भरा होने के कारण नहीं किया जा सका।	
37	सरी पुरा, आलमनगर जोन-6	30.5.08	17.7.08			19.7.08		पाइप लाइन डालने के लिए की गयी खुदाई के कारण कम्प्रेसर कार्यस्थल तक नहीं पहुँच सकी।	
38	वजीरबाग बदरअली तकिया शाह जोन-6	30.5.08	20.7.08			20.7.08		लीओरिंग पूर्ण	
[illegible]	[illegible] जोन-6	1.7.08	29.7.08			31.7.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	
40	अहमदगंज पजाबा जोन-2	5.7.08	29.7.08			8.8.08		कार्य प्रगति पर	

सार-:

1. चालू नलकूपों की संख्या - 22 नग , जलावृद्धि - 21.5 एम.एल.डी.
2. निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या - 10 नग
3. नलकूपों की संख्या जिनके पम्प सेट चालू है राइजिंग मेन जोडा जाना है। - 6 नग, सम्भावित जलावृद्धि - 6 एम.एल.डी.

परियोजना प्रबंधक

Jal Samiti Zone

Jan Commissioner LUCKNOW

2/17

दिनांक 19.7.2008 तक की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ शहर के विभिन्न पेयजल योजनाओं के विरूद्ध प्रस्तावित 21 नलकूप का वितरण

लक्ष्य - 21नग नये नलकूप

उपलब्धि - 2 नग नलकूप

क्र सं.	नलकूपों का नाम स्त्राव लीटर प्रति मिनट	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जलापूर्ति प्रारम्भ करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम. एल.डी.	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			संम्भावित	वास्तविक				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	लिबर्टी कालोनी कुर्मान्चल नगर पेय जल योजना -: 2 नग , जोन-3							
	1.कुर्मान्चल नगर(मानसविहार)नलकूप-1 1000 ली.प्र.मि.	10.2.08		8.5.08	18.5.08	1.00		
	2.कुर्मान्चल नगर(लिबर्टी कालोनी) नलकूप-2	17.3.08		22.6.08		1.00	-	जलापूर्ति प्रारम्भ
2	शिवनगर पेयजल योजना :- 4 नलकूप जोन-3							
	3. नलकूप सं.-1 1000 ली.प्र.मि.	10.11.07		8.5.08	28.5.08	1.00		
	4. नलकूप संख्या -2(कुम्हार टोला)	30.5.08	15.7.08				ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	
3	भारतनगर पेय जल योजना :- 3 नलकूप , जोन-3							
	5. सत्यलोक कालोनी	15.3.08		20.5.08		-	पम्प सेट चालू	राइजिंग मेन जोडा जाना है।
	6. महाराजा अग्रसेन पार्क	30.4.08		21.6.08		-	तदैव	तदैव
	7. भगत सिंह पार्क	28.4.08		21.6.08			तदैव	तदैव
4	गढीकनौरा पुनगर्ठन पेयजल योजना :- 6 नलकूप , जोन-2							
	8. पी.टी.सी. , मिल के पास,	30.4.08	15.7.08				लोअरिंग पूर्ण	
	9. नलकूप संख्या-2, तालकटोरा	21.5.08	31.7.08				तदैव	
5	खरिका वार्ड-पेयजल योजना :- 6 नलकूप , जोन-4							
	10. नलकूप संख्या-1(लौगा खेडा)	3.5.08	15.7.08			पूर्ण	लोअरिंग पूर्ण	
	11. नलकूप संख्या-2(झंडे वाला पार्क)	13.5.08	25.7.08				तदैव	
	12. नलकूप संख्या-3(बलदेव विहार पार्क)	17.5.08	25.7.08				तदैव	
	13. नलकूप संख्या-3(गोप स्कूल के पीछे)	30.5.08	30.7.08				तदैव	
	14. चन्द विहार कालोनी पार्क	18.6.08	4.8.08				तदैव	
	15. डिफेन्स कालोनी	18.6.08	30.7.08				ड्रिलिंग कार्य प्रगति पर	

सार:-

1. कूल प्रस्तावित नलकूपों की संख्या - 21 नग
2. चालू नलकूपों की संख्या - 3 नग , जलावृद्धि - 3.00एम.एल.डी.
   निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या - 12 नग
   नलकूपों की संख्या जिनके पम्प सेट चालू है राइजिंग मेन जोडा जाना है। - 4 नग, संम्भावित जलावृद्धि - 4 एम.एल.डी.

परियोजना प्रबन्धक

6 नलकूप 226

2117

1176 ~~1085~~

128

दिनांक 19.7.2008 तक की प्रगति

स	जे.एन.एन.यू.आर.एम के अन्तर्गत 43 नग री-बोर नलकूपो का निर्माण कार्य-:
	लक्ष्य- 43 री-बोर नलकूपों को चालू करने की सम्भावित तिथि 31.12.08
	उपलब्धि - 7 नग

क्र. सं.	नलकूपों का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (राइजिंग मेन पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./सं.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			वास्तविक	सम्भावित			
1	2	3	4	5	6	7	
1	डायमंड डेरी, जोन-1	1.3.08	29.4.08		1.00	जलापूर्ति प्रारम्भ	
2	महानगर सेक्टर-डी, जोन-3	6.4.08	1.5.08		1.00	तदैव	
3	हातामातादीन, जोन-1	20.3.08	13.5.08		0.60	तदैव	
4	जवाहर भवन, जोन-1	17.4.08	30.5.08		1.00	तदैव	
5	कमला कपूर पार्क निराला नगर जोन-3	10.5.08	3.6.08		1.00	तदैव	
6	जानकी पुरम, ए-ब्लाक, जोन-3	28.5.08	23.6.08		1.00	तदैव	
7	[illegible] कालोनी नलकूप सं-3	20.5.08	25.6.08		1.00	तदैव	
8	पत्रकार पुरम गोमतीनगर जोन-5	5.5.08		15.7.08		ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य पूर्ण	
9	कोनेश्वर मंदिर, जोन-3	6.6.08		30.7.08		कम्प्रेसर से विकास प्रगति पर	
10	कपूरथला, नलकूप जोन-3	28.6.08		20.8.08		तदैव	
11	शिव कालोनी, जोन-3	6.6.08		30.7.08		लोअरिंग पूर्ण	
12	ओल्ड स्पीकर, जोन-1	15.6.08		4.8.08		तदैव	
13	नैपियर रोड, जोन-6	11.6.08		30.7.08		तदैव	
14	बाबूगंज जोन-3	24.5.08		15.7.08		तदैव	
15	इंदिरानगर नलकूप स.-54 जोन-5	3.5.08		20.6.08		तदैव	
16	आनन्द नगर, जोन-4	28.5.08		10.7.08		तदैव	
17	मुरली नगर , जोन-3	1.6.08		30.7.08		तदैव	
18	आर्यसमाज मंदिर गणेश गंज जोन-1	20.5.08		15.7.08		तदैव	
19	अलीगंज सं.-6 जोन-3	6.6.08		28.7.08		तदैव	
20	अलीगंज सं.-7 जोन-3	10.6.08		30.7.08		तदैव	
21	समर विहार, जोन-4	28.5.08		10.7.08		तदैव	
22	डायमंड डेरी, जोन-1	1.6.08		15.7.08		तदैव	
23	खिन्नी पार्क, जोन-3	21.6.08		10.8.08		तदैव	
24	कर्वला तालकटोरा रोड, राजीजीपुरम, जोन-6	23.6.08		12.8.08		तदैव	
25	[illegible], जोन-6	28.6.08		20.8.08		तदैव	
26	गांधीनगर जोन-1	17.6.08		6.8.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	
27	लालबाग ,जोन-1	30.6.08		20.8.08		तदैव	
28	से.-11 राजाजीपुरम जोन-6	28.6.08		20.8.08		तदैव	
29	विजय खण्ड, जोन-5	3.7.08		20.8.08		तदैव	

Jal Sansthan Zone

नोट:-

1. कुल प्रस्तावित री-बोर नलकूपों की संख्या - 43 नग
2. चालू नलकूपों की संख्या - 7 नग , जलावृद्धि - 7.00एम.एल.डी.
3. निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या - 22 नग

परियोजना प्रबन्धक

21/7

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, पेयजल(द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में चालू किये गये नलकूपों की सूची

40 नग नये नलकूपों के अन्तर्गत

क्र0 सं0	नलकूपों का नाम एवं स्थल
1	2
1	अलीगंज सेक्टर-एच
2	इन्दिरानगर डी-ब्लॉक
3	विजयखण्ड, गोमतीनगर
4	अलीगंज सेक्टर-डी
5	गुलिस्ता कॉलोनी
6	अहिबरनपुर सीतापुर रोड
7	त्रिवेणी नगर
8	विकासनगर सेक्टर-9
9	सहयोग पार्क, महानगर
10	जानकीपुरम् सेक्टर-एच
11	हिन्द नगर नलकूप, जोन-4
12	तातारपुर सेक्टर-ई, अलीगंज
13	मेंहदीटोला, विष्णुपुरी कॉलोनी
14	शिवपुरी पार्क, गणेशगंज
15	कानपुर रोड योजना, सेक्टर जे, रेलनगर
16	विनीत खण्ड, गोमती नगर
17	साउथ सिटी, सेक्टर-सी-1
18	दामोदरनगर, आलमबाग
19	इन्दिरानगर बी-ब्लॉक
20	मेवा नर्सरी, निशातगंज
21	पंचवटी कॉलोनी, रहीमनगर
22	साउथ सिटी, रश्मि खण्ड

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत प्राक्कलन में सम्मिलित पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत

23	शिवनगर खदरा जलकल परिसर
24	मानस विहार कॉलोनी, सर्वोदयनगर
25	लिबर्टी पार्क, सर्वोदयनगर

नगरीय पेयजल योजना सामान्य के अन्तर्गत स्वीकृत नलकूप

26	राजाजीपुरम् बी-ब्लॉक, रानी लक्ष्मीबाई पार्क

19-7-08

परियोजना प्रबन्धक

Gram Corporation Limited (LUCKNOW) Secretary

417

130

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, गो0प्र0नि0ई0-।।।(वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 43 नग रिबोर नलकूपों का कार्य

1	डायमण्ड डेरी कॉलोनी
2	महानगर सेक्टर-डी
3	ममता मातादीन
4	जवाहरभवन
5	कमलाकपूर पार्क निरालानगर
6	जानकीपुरम् ए-ब्लॉक
7	पेपरमिल कॉलोनी

19.7.08

परियोजना प्रबन्धक

Commissioner LUCKNOW

2117

पेयजल योजना

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 30.04.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

सामान्य कार्यक्रम

(रू. लाख में)

क्रमांक	कार्य प्रगति	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 21.5.2008 तक कुल प्रगति		दिनांक 19.7.2008 तक कुल प्रगति		दिनांक 21.5.08 से 19.7.08 तक कुल प्रगति	
1.	नये हैण्डपम्प	409 नग	284 नग	115.53	409 नग	286.80	125 नग	74.87
2.	विषेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प	670 नग	413 नग	96.40	670 नग		257 नग	
3.	नये नलकूप	5 नग	3 नग	125.00	3नग चालू	125.00	—	—
4.	रिबोर नलकूप	39 नग	39 नग	690.00	39नग चालू	690.00	—	—
	योग :			**1026.93**		**1101.80**		**74.87**

19.7.08

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक

लखनऊ नगर में जल संस्थान के विभिन्न जोनों में नगरीय पेयजल (सामान्य) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

दिनांक 01.04.06 से कराये गये कार्य

दिनांक 19.7.2008 तक

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
1.	जोन–1, लालबाग	नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य	4 नग
		मिनी नलकूप	2 नग
2.	जोन–2, ऐषबाग	नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य	2 नग
		मिनी नलकूप	1 नग
3.	जोन–3, अलीगंज	**फैजुल्लागंज पेयजल योजना**	
		नया नलकूप	1 नग
		स्टाफ क्वार्टर	9 प्रतिशत पूर्ण
		नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य	12 नग
4.	जोन–4, आलमबाग	नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य	7 नग पूर्ण
5.	जोन–5, इन्दिरानगर	**विनय खण्ड, गोमती नगर में एक नये एवं रिबोर नलकूप का कार्य**	
		नया नलकूप	1 नग
		रिबोर नलकूप	1 नग
6.	जोन–6, राजाजीपुरम	**बी–ब्लॉक रानीलक्ष्मीबाई पार्क में नलकूप का निर्माण**	1 नग
		राजाजीपुरम् 'ई' एवं 'एफ' ब्लॉक पेयज़ल योजना	
		नया नलकूप	–
		वितरण प्रणाली	1.00 कि.मी.
		नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य	9 नग
	योग :	**नया नलकूप**	**3 नग**
		रीबोर नलकूप	**39 नग**
		मिनी नलकूप	**4 नग**
		नया हैण्डपम्प	**409 नग**
		रिबोर/विशेष मरम्मत द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प	**670 नग**

19.7.08
परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक

417

ANNEXURE A-2

1181

~~1090~~

133

जनहित याचिका संख्या 4436 (एम.बी.)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ0प्र0 सरकार में दिनांक 21.5.2008 को हुई सुनवाई के दौरान मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ द्वारा पारित <u>आदेशों के अनुरूप अनुपालन आख्या का प्रेषण (सीवर)</u>

गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण अनुमानित लागत रू0 263.04 करोड़ जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.06.2008 को स्वीकृत हुई है, में ककरहा के निकट 370 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाये जाने के कार्य सम्मिलित थे। अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की मूल कार्य लागत रू0 104.22 करोड़ थी।

जुलाई 2006 में मूल प्रस्ताव में चिन्हित स्थान ग्राम बाघामऊ एवं भैंसोरा में 120 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी थी, किन्तु उक्त प्रस्ताव लखनऊ महायोजना-2021 में इसके अधिकांश भाग आवासीय उपयोग में निहित होने के कारण दिनांक 25.09.2007 को राजस्व परिषद, लखनऊ द्वारा वापस कर दिया गया। इसके उपरान्त लखनऊ महायोजना-2021 के अनुरूप ग्राम भरवारा, लोनापुर एवं भैंसोरा में 120 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु नया प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिस पर नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा धारा-4 एवं धारा-6 की कार्यवाही के उपरान्त, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। भूमि अधिग्रहण दिनांक 16.07.2008 को किया जा चुका है।

एस.टी.पी. हेतु निविदायें फाइनल की जा चुकी है तथा दिनांक 19.07.2008 से कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

एस.टी.पी. के निर्माण कार्यों को 1 वर्ष के समय में पूर्ण किये जाने हेतु सम्बन्धित ठेकेदार से आश्वासन लिया गया है। धन की उपलब्धता पर कार्य को समय से पूर्ण किया जायेगा।

गोमती कार्य योजना प्रथम चरण में अवशेष 2 योजनायें एवं गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण के कार्य प्रगति पर हैं एवं उपलब्ध धन के अनुरूप वांछित प्रगति दी जा रही है, जिसका विवरण संलग्न तालिक (संलग्नक-1 व 2) में दिया गया है। लखनऊ नगर में किये जा रहे सीवर कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति संलग्न है। (संलग्नक-3)

संलग्नकः- यथापरोक्त।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई-1
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

2/7

संलग्नक--1

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इमाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्ण कार्यवाही दिनांक 21.05.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रू0 करोड़ में)

क्र0सं0	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 21.05.08 तक प्रगति	दिनांक 16.07.2008 तक कुल प्रगति	दिनांक 21.05.08 से 16.07.08 तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	आई0 एण्ड डी0 कार्य-6 नग	6 नग	5 नग पूर्ण	5 नग पूर्ण	---
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन--5 नग	6 नग	5 नग पूर्ण+ 1 नग (10%)	5 नग पूर्ण + 1 नग (25%)	5 नग पूर्ण + 1 नग (15%)
3	राइजिंग मेन--7525 मीटर	7525 मीटर	5120 मीटर	5120 मीटर	---
4	सीवर लाइन--20 मीटर	20 मीटर	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
5	स्टाफ क्वार्टर--4 नग	4 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
6	जेनसेट--8 नग	8 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
7	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट--1 नग	1 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
8	भूमि अधिग्रहण--जाब	1 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
9	पम्पिंग प्लान्ट--25 नग	25 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
10	विद्युत संयोजन--6 नग	6 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
11	विविध कार्य--जाब	50 %	25%	40%	15%
(ब)	वित्तीय प्रगति				
1	वित्तीय प्रगति (व्यय)	लागत 45.22	34.28	34.75	0.47
2	प्राप्त धन		31.24	31.24	---

नोट :-- कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु उ0प्र0 सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.04.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई--1
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

2117

संलग्नक–2

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इमाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 21.05.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रू0 करोड़ में)

क्र0सं0	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 21.05.08 तक प्रगति	दिनांक 16.07.2008 तक कुल प्रगति	दिनाक 21.05.08 से 16.07.08 तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	आई0 एण्ड डी0 कार्य–18 नग	18 नग	17 नग (95%)+ 1 नग (10%)	17 नग (95%)+ 1 नग (15%)	1 नग (5%)
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन–11 नग	11 नग	11 नग (95%)	11 नग (95%)	
3	राइजिंग मेन–18955 मीटर	18955 मी0	8104 मी0	8119 मी0	15 मीटर
4	सीवर लाइन–6092 मीटर	6092 मी0	3340 मी0	3400 मी0	60 मीटर
5	स्टाफ क्वार्टर–11 नग	11 नग	80%	80%	--
6	जेनसेट–25 नग	25 नग	100%	100%	--
7	मेन पम्पिंग स्टेश–1 नग	1 नग	40%	50%	10%
	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट–3 नग	3 नग	4%	6%	2%
9	सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार–7 नग	7 नग	6 नग (100%) + 1 नग (65%)	6 नग (100%) + 1 नग (90%)	6 नग (0%) + 1 नग (5%)
10	नदी तट का विकास (घाट)–5 नग	5 नग	9 नग (90 %)	5 नग (95%)	5%
11	शौचालय का निर्मा–21 नग	21 नग	6 नग	6 नग	––
12	वनीकरण–जाब	20%	5%	5%	--
13	जनजागरण – जाब	20%	5%	5%	--
14	भूमि अधिग्रहण–जाब	100%	50%	95%	45%
15	पम्पिंग प्लान्ट–जाब	58 नग	95%	95%	--
16	विद्युत संयोजन–जाब	30%	70%	70%	--
17	विविध कार्य–जाब	50%	30%	35%	5%
(ब)	वित्तीय प्रगति				
		लागत			
1	वित्तीय प्रगति (व्यय)	263.04	57.32	94.48	37.16
2	प्राप्त धन		58.395	92.768	34.373

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई–1
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

2/7

संलग्नक-3

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 21.05.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रू0 करोड़ में)

क्र0सं0	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 21.5.08 तक प्रगति	दिनांक 16.07.2008 तक कुल प्रगति	दिनांक 21.05.08 से 16.07.08 तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज	289 किमी0	10 किमी0	20 किमी0	10 किमी0
2	ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.)	48 किमी0	1.00 किमी0	3.00 किमी	2.00 किमी0
3	सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल. डी.)	1 नग	6%	10%	कार्य एवार्ड
4	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल. डी.)	1 नग	6%	10%	कार्य एवार्ड
5	राइजिंग मेन - 1000 एम.एम.	45 मीटर	0	0	इसकी आवश्यकता वर्ष 2009-10 में हैं।
(ब)	वित्तीय प्रगति				
1	वित्तीय प्रगति (व्यय)	लागत 236.23	10.99	17.84	6.85
2	प्राप्त धन		30.00	30.00	--

नोट :-

1. योजना दिनांक 17.08.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रू0 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को निर्गत की गयी तथा पुनः रु. 15.00 करोड़ की द्वितीय किश्त दिनांक 27.4.2008 को निर्गत की गयी।
3. लगभग 180 किमी0 सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम0एल0डी0 के कार्य दिनांक 19.05.2008 से प्रारम्भ/18 माह की कार्य अवधि।
5. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य एवार्ड/ कार्य 01.06.2008 से प्रारम्भ करा दिया गया।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई-1
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

21/7

21.7.08
(डा० जटाशंकर त्रिपाठी)
अपर आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-5 (फौजदारी)
उ० प्र० शासन

1185 ~~1044~~ 137

IN THE HON'BE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
IN RE:
WRIT PETITION 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant --------- Petitioner

VERSUS

State of U.P. and others --- opposite parties

Affidavit on behalf of Jal Sansthan, Lucknow in Compliance of the order dated 22.05.2008 passed by this Hon'ble Court

I, D.K. Sharma,, aged about 55 years, S/o Late D.L. Sharma presently working as General Manager, Lucknow Jal Sansthan, Lucknow; the deponent do hereby solemnly affirms and state on oath as under:-

1. That the deponent is impleaded in the aforesaid writ petition as opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed herein.

2. That this writ petition was last listed on 22.05.2008 wherby this Hon'ble Court was pleased to direct the opposite party to submit updated status report of work done on the next date of listing i.e. on 21.07.2008.

(2)

3. That in compliance of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 22.05.2008 the present affidavit is being filed thereby mentioning the details of work under taken by the authorities under the JNNURM and others.

4. That it is submitted that so for as the installation of 61 Tubewells are concerned which are to be completed under the JNNURM Scheme, in which work of installation of 40 Tubewells is also included, out of the same the work of 22 Tubewells has been commissioned and work of remaining 18 Tubewells are in progress where water supply system is available and the work would be completed expeditiously. The chart has been prepared in this regard by the U.P. Jal Nigam. A photocopy of the said chart is being filed herewith as **Annexure No. 1** to this affidavit.

5. That so far as installation of 21 Tubewells is concerned the work has already been completed on three tubewells. It is pertinent to mention here that no water supply system is available so after completing the work of installation of Tube wells which will take some reasonable time and the same will be commissioned after laying down of the distribution system. Moreover, the work on 12 Tubewells are well in progress. A photocopy of the chart in respect of installation of 21

tubewells is being annexed herewith as **Annexure No. 2** to this affidavit.

6. That it is submitted that so far as reboring of 43 Tubewells is concerned the work has been completed on 7 Tubewells whereas the work is in progress on 22 Tubewells. A photocopy of the progress chart in respect of re-boring of 43 Tubewells is being annexed herewith as **Annexure No. 3** to this affidavit.

7. That it is further submitted that from the target of installation of 409 new handpumps and re-boring/special reboring of 670 handpumps was vested under the URBAN DISTRICT PLAN out of the said 409 new handpumps and reboring/special re-boring of 670 handpumps has already been completed. A photocopy of progress chart in detail is being annexed herewith as **Annexure No. 4** to this affidavit.

8. That it is further relevant to submit over here that under URBAN WATER SUPPLY (NORMAL) PROGRMME out of five proposed tubewells three tubewell has been completed out of 39 reboring of tubewell all 39 has been commissioned. A photocopy of progress report in this regard is being annexed herewith as **Annexure No. 5** to this affidavit.

1188 ~~1097~~ (4) 140

9. That from the narration made hereinabove it is established that the Lucknow Jal Sansthan, Lucknow had taken all relevant steps in compliance of order dated 22.05.2008 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will carry out every direction that is issued by this Hon'ble Court from time to time.

Lucknow
Dated: 21/7/08

Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of paragraph 1 to 9 of the affidavit are true to the best of our personal knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed by me.

So help me God

Lucknow
Dated 21/7/08

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me

Advocate

Solemnly affirmed before me on 21/7/08 at 11.45 A.M./P.M by the deponent who is identified by Shri. Namit Sharma, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him by me.

OATH COMMISSIONER
High Court, Allahabad
Lucknow Bench

1189 1098 141

(5)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436(MB) OF 2008
Sewage Treatment Plan VERSUS State of U.P. & Ors
ANNEXURE NO 1

Annexure - 1.

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई तृतीय(वि0/यॉ0), उ0प्र0,जल निगम , लखनऊ

दिनांक 19.7.2008 तक की प्रगति

ए.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित किये जाने वाले 40 नलकूपों का निर्माण-:
लक्ष्य- 40 नग नये नलकूपों.
उपलब्धि - 21 नग (जलापूर्ति प्रारम्भ)

क्र. सं.	नलकूपों का नाम और जल स्त्राव ली. प्रति मिनट	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जल.पूर्ति प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि	जलापूर्ति प्रारम्भ करने की निर्धारित तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम. एल.डी	वर्तमान की प्रगति	टिप्पणी
			संभावित	वास्तविक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अलीगंज सेक्टर-एच जोन-3 (1500 ली.प्र. मि.)	1.1.07		6.5.08	16.5.08		1.5		3
2	इंदिरानगर बी ब्लाक, जोन-5 (1000 ली..प्र.मि.)	15.12.07		1.5.08	12.5.08		1.00		5
3	विजय खण्ड, जोन-5 (1000 ली.प्र.मि.)	5.3.08		12.5.08	17.5.08		1.00		5
4	अलीगंज सेक्टर -सी/डी, जोन-3 (1000 ली.प्र.मि.)	17.3.08		7.5.08	17.5.08		1.00		3
5	गुलिस्ता कालोनी, जोन-1 (1000 ली.प्र.मि.)	18.3.08		18.5.08	18.5.08		1.00		1
6	अहिभवरनपुर जोन-3 (1000 ली . .मि)	30.3.08		8.5.08	31.5.08		1.00		3
7	त्रिवेणी नग., जोन-3 (1000 ली.प्र.मि	17.3.08		8.5.08	7.6.08		1.00		3
8	विकास नगर, सेक्टर-9 (1000 ली.प्र.मि)	19.4.08		19.5.08	11.6.08		1.00		3
9	सहयोग पार्क, महानगर जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	29.4.08		21.5.08	20.6.08		1.00		3
10	जानकीपुरम सेक्टर-एच ,अलीगंज जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	15.4.08		2.6.08	17.6.08		1.00		3
	हिन्द नगर नलकूप जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	11.3.08		10.6.08	17.6.08		1.00		4
12	तातारपुर सेक्टर-ई अलीगंज जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	13.4.08		29.5.08	18.6.08		1.00		3
13	मेहदी टोला,विष्णुपुरी कालोनी जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	9.5.08		7.6.08	18.6.08		1.00		3
14	शिवपुरी पार्क गणेश गंज, जोन-1 (1000 ली.प्र.मि)	15.4.08		16.6.08	22.6.08		1.00		1
15	कानपुर रोड योजना सेक्टर-जे, जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	10.4.08		20.6.08	23.6.08		1.00		4
16	विनीत खण्ड, जोन-5 (1000 ली.प्र.मि)	24.3.08		15.6.08	28.6.08		1.00		5
17	साउथ सिटी सेक्टर-सी-1 जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	21.4.08		26.6.08	4.7.08		1.00		4
18	दामोदर नगर,आलमनगर, जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	13.4.08		30.6.08	4.7.08		1.00		4
19	इंदिरा नगर बी- ब्लाक जोन-5 (1000 ली.प्र.मि)	15.3.08		16.6.08	8.7.08		1.00		5
20	मेवा नर्सरी निशातगंज , जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	5.5.08		15.6.08	10.7.08		1.00		5
21	पंचवटी कालोनी, रहीम नगरोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	19.5.08		15.6.08	11.7.08		1.00		5

1190 ~~1090~~ (6) 142

	नलकूपों का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प सेट का निर्माण कार्य एवं वि./सं.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जलापूर्ति प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि	जलापूर्ति प्रारम्भ करने की निर्धारित तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी	वर्तमान की प्रगति	टिप्पणी
			सम्भावित	वास्तविक					
1	2	3	4.	5	6	7	8	9	10
22	जानकी पुरम सेक्टर-सी, जोन-3	9.5.08		17.6.08		23.6.08		पम्प सेट चालू	गड़ियाँ बिना बीम जल 3
23	विवेक खण्ड -4 गोमती नगर जोन-5	15.4.08		21.6.08		23.6.08		तदैव	तदैव 5
24	सोसाइटी पार्क नरही, जोन-1	9.5.08		26.6.08		11.7.08		तदैव	तदैव 1
25	साउथ सिटी रशिम खण्ड, जोन-4	9.5.08		30.6.08	17.7.08			जलापूर्ति प्रारम्भ	4
26	सेक्टर-आई, एल.डी.ए. कालोनी आलमबाग, जोन -4	29.4.08		3.7.08		6.7.08		तदैव पम्प सेट चालू	तदैव 4
27	अशोकनगर राजाजीपुरम जोन-6	29.4.08	7.7.08			8.7.08		पम्प रोट अधिष्ठापित वि.स. अपेक्षित	तदैव 6
28	बड़ा बरहा, आनन्दनगर, जोन-4	8.5.08	7.7.08			9.7.08		ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य पूर्ण	4
29	इंदिरानगर सेक्टर-14, जोन-5	5.5.08	15.7.08			17.7.08		ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	5
30	ब्रहम नगर, जोन-4	8.5.08	8.7.08			10.7.08		तदैव	4
31	मातादीनशेरवाली कोठी,सहादतगंज जोन-6	13.4.08	5.7.08			7.7.08		ओ.पी. यूनिट की शिफ्टिंग प्रगति पर	6
32	विशाल खण्ड गोमतीनगर, जोन-5	6.6.08	19.7.08			19.7.08		तदैव	5
33	हुसैनाबाद शिवपुरी , जोन-2	19.5.08	16.7.08			18.7.08		कन्वेसर से विकास कार्य प्रगति पर	2
34	आनन्द नगर बरहा रोड , जोन-4	10.6.08	25.7.08			27.7.08		तदैव	4
35	विनय खण्ड-1, गोमतीनगर , जोन-5	6.6.08	18.7.08			18.7.08		कन्वेसर से विकास हेतु ट्रायलेक्शन प्रगति पर	5
36	स्टार कालोनी सेक्टर-9 इंदिरा नगर , जोन-5	20.5.08	15.7.08			17.7.08		कन्वेसर से विकास कार्य पानी भरा होने के कारण नहीं किया जा सका।	5
37	सरी पुरा, आलमनगर जोन-6	30.5.08	17.7.08			19.7.08		पाईप लाईन बिछाने के लिए की गयी खुदाई के कारण कन्वेसर का विकास-तक नहीं पहुंच सकी।	6
38	वजीरबाग बदरअली तकिया शाह जोन-6	30.5.08	20.7.08			20.7.08		लोअरिंग पूर्ण	6
39	जलाल पुर, जोन-6	1.7.08	29.7.08			31.7.08		लोअरिंग प्रगति पर	6
40	अहमदगंज एजाबा जोन-2	5.7.08	29.7.08			8.8.08		कार्य प्रगति पर	2

सार:-

1. चालू नलकूपों की संख्या - 22 नग , जलावृद्धि - 21.5 एम.एल.डी.
2. निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या - 18 नग
3. नलकूपों की संख्या जिनके पम्प सेट चालू है राइजिंग मेन जोडा जाना है। - 6 नग, सम्भावित जलावृद्धि - 6 एम.एल.डी.

परियोजना प्रबंधक

21/7/08

1192 ~~101~~ (8) 144

लखनऊ नगर में जल संस्थान के विभिन्न जोनों में जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

दिनांक 19.7.2008 तक

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	अद्यतन प्रगति
1.	जोन–1, लालबाग	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	2 नग चालू, 1 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	3 नग चालू, 6 नग प्रगति पर।
2.	जोन–2, ऐषबाग	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	4 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	—
3.	जोन–3, अलीगंज	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	10 नग चालू, 5 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	4 नग चालू, 7 नग प्रगति पर।
4.	जोन–4, आलमबाग	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	5 नग चालू, 10नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	2 नग प्रगति पर।
5.	जोन–5, इन्दिरानगर	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	8 नग चालू, 5 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	3 नग प्रगति पर।
6.	जोन–6, राजाजीपुरम	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	5 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	4 नग प्रगति पर।
	योग :	नया नलकूप	25 नग चालू 30 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	7 नग चालू 22 नग प्रगति पर

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक

24/7

1193 ~~102~~ (9) 145

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2008 (MB)
Sewage Treatment Plant VERSUS Govt of UP & Ors
ANNEXURE NO 2

ANNEXURE – 2

दिनांक 19.7.2008 तक की प्रगति

ज.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ शहर के विभिन्न पेयजल योजनाओं के विरूद्ध प्रस्तावित 21 नलकूप का वितरण
लक्ष्य – 21नग नये नलकूप
उपलब्धि – 2 नग नलकूप

क्र सं.	नलकूपों का नाम स्त्राव लीटर प्रति मिनट	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प प्रक्ष का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जलापूर्ति प्रारम्भ करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम. एल.डी.	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			सम्भावित	वास्तविक				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	लिबर्टी कालोनी कुर्मान्चल नगर पेय जल योजना –: 2 नग , जोन-3							
	1 कुर्मान्चल नगर(मानसविहार)नलकूप-1 1000 ली.प्र.मि.	10.2.08		8.5.08	18.5.08	1.00		
	2.कुर्मान्चल नगर(लिबर्टी कालोनी) नलकूप-2	17.3.08		22.6.08		1.00		जलापूर्ति प्रारम्भ
2	[illegible]वनगर पेयजल योजना :- 4 नलकूप जोन-3							
	3. नलकूप स.-1 1000 ली.प्र.मि..	10.11.07		8.5.08	28.5.08	1.00		
	4. नलकूप संख्या -2(कुम्हार टोला)	30.5.08	15.7.08				ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	
3	भारतनगर पेय जल योजना :- 3 नलकूप , जोन-3							
	5. सत्यलोक कालोनी	15.3.08		20.5.08		-	पम्प सेट चालू	राइजिंग मेन जोडा जाना है।
	7. महाराजा अग्रसेन पार्क	30.4.08		21.6.08		-	तदैव	तदैव
	6. भगत सिंह पार्क	28.4.08		21.6.08			तदैव	तदैव
4	गढीकनौरा पुनगर्ठन पेयजल योजना :- 6 नलकूप , जोन-2							
	8. पी.टी.सी. , मिल के पास,	30.4.08	15.7.08				लोअरिंग पूर्ण	
	9. नलकूप संख्या-2, तालकटोरा	21.5.08	31.7.08				तदैव	
5	खरिका वार्ड पेयजल योजना :- 6 नलकूप , जोन-4							
	10. नलकूप संख्या-1(लीगा खेडा)	3.5.08	15.7.08				लोअरिंग पूर्ण	
	11. नलकूप संख्या-2(झंडे वाला पार्क)	13.5.08	25.7.08				तदैव	
	12. नलकूप संख्या-3(बलदेव विहार पार्क)	17.5.08	25.7.08				तदैव	
	नलकूप संख्या-3(गोप स्कूल के	30.5.08	30.7.08				तदैव	
	14. चन्द्र विहार कालोनी पार्क	16.6.08	4.8.08				तदैव	
	15. डिफेन्स कालोनी	18.6.08	30.7.08				[illegible] पर	

सार-:

1. कुल प्रस्तावित नलकूपों की संख्या - 21 नग
2. चालू नलकूपों की संख्या - 3 नग , जलावृद्धि - 3.00एम.एल.डी.
3. निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या - 12 नग
4. नलकूपों की संख्या जिनके पम्प सेट चालू है राइजिंग मेन जोडा जाना है। - 4 नग, संम्भावित जलावृद्धि - 4 एम.एल.डी.

योजना प्रबन्धक

In Eastern Zone

5
5
3
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
4

High Court, Allahabad
21/7/08

1194 ~~1105~~ (10) 146

ार्यालय परियोजना प्रबन्धक, गो0प्र0नि0ई0-।।।(वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 43 नग रिबोर नलकूपों का कार्य

1	डायमण्ड डेरी कॉलोनी
2	महानगर सेक्टर-डी
3	लाता मातादीन
4	जवाहरभवन
5	कमलाकपूर पार्क निरालानगर
6	जानकीपुरम् ए-ब्लॉक
7	पेपरमिल कॉलोनी

परियोजना प्रबन्धक

1195 1194 (11) 147

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2008 (M/B)
Sewage Treatment Plant VERSUS State of U.P. & Ors
ANNEXURE NO 3

Annexure NO. 3

दिनांक 19.7.2008 तक की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम के अन्तर्गत 43 नग री-बोर नलकूपों का निर्माण कार्य-:
लक्ष्य- 43 री-बोर नलकूपों को चालू करने की सम्भावित तिथि 31.12.08
उपलब्धि - 7 नग

क्र. स.	नलकूपों का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (राइजिंग मेन पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./सं.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			वास्तविक	सम्भावित			
1	2	3	4	5	6	7	
1	डायमंड डेरी, जोन-1	1.3.08	29.4.08		1.00	जलापूर्ति प्रारम्भ	
2	महानगर सेक्टर-डी, जोन-3	6.4.08	1.5.08		1.00	तदैव	
3	हातामाताधीन, जोन-1	20.3.08	13.5.08		0.60	तदैव	
4	जवाहर भवन, जोन-1	17.4.08	30.5.08		1.00	तदैव	
5	कमला कपूर पार्क निराला नगर जोन-3	10.5.08	3.6.08		1.00	तदैव	
6	जानकी पुरम, ए-ब्लाक, जोन-3	28.5.08	23.6.08		1.00	तदैव	
7	पेपर मिल कालोनी नलकूप जोन-3	20.5.08	25.6.08		1.00	तदैव	
8	पत्रकार पुरम गोमतीनगर जोन-5	5.5.08		15.7.08		ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य पूर्ण	
9	कोनेश्वर मंदिर, जोन-3	6.6.08		30.7.08		कम्प्रेसर से विकास प्रगति पर	
10	कपूरथला, नलकूप जोन-3	28.6.08		20.8.08		तदैव	
11	शिया कालोनी, जोन-3	6.6.08		30.7.08		लोअरिंग पूर्ण	
12	ओल्ड स्पीकर, जोन-1	15.6.08		4.8.08		तदैव	
13	नैपियर रोड, जोन-6	11.6.08		30.7.08		तदैव	
14	बाबूगंज जोन-3	24.5.08		15.7.08		तदैव	
15	इंदिरानगर नलकूप सं.-54 जोन-5	3.5.08		20.6.08		तदैव	
16	आनन्द नगर, जोन-4	28.5.08		10.7.08		तदैव	
17	मुरली नगर , जोन-3	1.6.08		30.7.08		तदैव	
18	आर्यसमाज मंदिर गणेश गंज जोन-1	20.5.08		15.7.08		तदैव	
19	अलीगंज सं.-6 जोन-3	6.6.08		28.7.08		तदैव	
20	अलीगंज सं.-7 जोन-3	10.6.08		30.7.08		तदैव	
21	समर विहार, जोन-4	28.5.08		10.7.08		तदैव	
22	डायमंड डेरी, जोन-1	1.6.08		15.7.08		तदैव	
23	खिन्नी पार्क, जोन-3	21.6.08		10.8.08		तदैव	
24	बसेला लालपटोरा रोड, राजीवपुरम, जोन-6	23.6.08		12.8.08		तदैव	
25	खुशीदबाग, जोन-6	28.6.08		20.8.08		तदैव	
26	गांधीनगर, जोन-1	17.6.08		6.8.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	
27	लालबाग ,जोन-1	30.6.08		20.8.08		तदैव	
28	से.-11 राजाजीपुरम जोन-6	28.6.08		20.8.08		तदैव	
29	विजय खण्ड, जोन-5	3.7.08		20.8.08		तदैव	

सार-:

1. कूल प्रस्तावित री-बोर नलकूपों की संख्या - 43 नग
2. चालू नलकूपों की संख्या - 7 नग , जलापूर्ति - 7.00एम.एल.डी.
3. निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या - 22 नग

परियोजना प्रबन्धक

21/7

पेयजल योजना

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 30.04.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

सामान्य कार्यक्रम

(रू. लाख में)

क्रमांक	कार्य प्रगति	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 21.5.2008 तक कुल प्रगति		दिनांक 19.7.2008 तक कुल प्रगति		दिनांक 21.5.08 से 19.7.08 तक कुल प्रगति	
1.	नये हैण्डपम्प	409 नग	284 नग	115.53	409 नग	286.80	125 नग	74.87
2.	विषेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प	670 नग	413 नग	96.40	670 नग		257 नग	
3.	नये नलकूप	5 नग	3 नग	125.00	3नग चालू	125.00	–	–
4.	रिबोर नलकूप	39 नग	39 नग	690.00	39नग चालू	690.00	–	–
	योग :			1026.93		1101.80		74.87

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

मई प्रबन्धक

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2008
VERSUS
ANNEXURE NO 4

1196

148

1197 1106

13 149

लखनऊ नगर में जल संस्थान के विभिन्न जोनों में नगरीय पेयजल (सामान्य) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

दिनांक 01.04.06 से कराये गये कार्य-

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	दिनांक 19.7.2008 तक पूर्ण कार्य
1.	जोन–1, लालबाग	नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य	4 नग
		मिनी नलकूप	2 नग
2.	जोन–2, ऐषबाग	नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य	2 नग
		मिनी नलकूप	1 नग
3.	जोन–3, अलीगंज	फैजुल्लागंज पेयजल योजना	
		नया नलकूप	1 नग
		स्टाफ क्वार्टर	9 प्रतिशत पूर्ण
		नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य	12 नग
4.	जोन–4, आलमबाग	नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य	7 नग पूर्ण
5.	जोन–5, इन्दिरानगर	विनय खण्ड, गोमती नगर मे एक नये एवं रिबोर नलकूप का कार्य	
		नया नलकूप	1 नग
		रिबोर नलकूप	1 नग
6.	जोन–6, राजाजीपुरम	बी–ब्लॉक रानीलक्ष्मीबाई पार्क में नलकूप का निर्माण	1 नग
		राजाजीपुरम् 'ई' एवं 'एफ' ब्लॉक पेयजल योजना	
		नया नलकूप	–
		वितरण प्रणाली	1.00 कि.मी.
		नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य	9 नग
	योग :	नया नलकूप	3 नग
		रीबोर नलकूप	39 नग
		मिनी नलकूप	4 नग
		नया हैण्डपम्प	409 नग
		रिबोर/विशेष मरम्मत द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प	670 नग

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक

1198 Hot

(14) 15

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. OF 2008
Sewage Treatment Plant VERSUS State U.P. & Ors
ANNEXURE NO 5

ANNEXURE-5

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इमाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 21.05.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रू0 करोड़ में)

क्र0सं0	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 21.05.08 तक प्रगति	दिनांक 16.07.2008 तक कुल प्रगति	दिनांक 21.05.08 से 16.07.08 तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	आई0 एण्ड डी0 कार्य-6 नग	6 नग	5 नग पूर्ण	5 नग पूर्ण	--
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन-5 नग	6 नग	5 नग पूर्ण+ 1 नग (10%)	5 नग पूर्ण + 1 नग (20%)	5 नग पूर्ण + 1 नग (15%)
3	राइजिंग मेन-7525 मीटर	7525 मीटर	5120 मीटर	5120 मीटर	--
4	सीवर लाइन-20 मीटर	20 मीटर	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
5	स्टाफ क्वार्टर-4 नग	4 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
6	जेनसेट-8 नग	8 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
7	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट-1 नग	1 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
8	भूमि अधिग्रहण-जाब	1 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
9	पम्पिंग प्लान्ट-25 नग	25 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
10	विद्युत संयोजन-6 नग	6 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
11	विविध कार्य-जाब	50	25	40	15
(ब)	वित्तीय प्रगति				
1	वित्तीय प्रगति (व्यय)	लागत 45.22	34.28	34.75	0.47
2	प्राप्त धन		31.24	31.24	--

नोट :- कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु उ0प्र0 सिंचाई विभाग द्वारा दिनाक 17.04.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई-1
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

1199 ~~108~~ 151

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
SITTING AT LUCKNOW.

W/P No. 4436 (M/B)/2003

Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

APPLICATION FOR AFFIDAVIT TO BE TAKEN ON RFECORD

For the facts, reasons and circumstances stated in the accompanying counter affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to take the affidavit on record in the interest of justice.

Any other suitable order or direction which this Hon'ble Court may deem fit just and proper in the circumstances of the case may also be passed in favour of the opp. Party.

Place : Lucknow

Date : 21/7/08

(I.P. Singh)
Advocate,
Counsel for Deponent

1200 #09 152

IN THE HONBLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
SITTING AT LUCKNOW.

W/P No. 4436 (M/B)/2003

2008 AFFIDAVIT HIGH COURT ALLAHABAD 0210496

COURT FEE INDIA TEN RUPEES

HUSSAIN

Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF HON'BLE COURT'S ORDER DATED 22-5-2008 ON BEHALF OF UP JAL NIGAM

I, V.U. Bishnoi, aged about 56 years, son of late Sri P.C. Bishnoi presently posted as General Manager, Gomti Pollution Control Unit, UP. Jal Nigam, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as General Manager, Gomti Pollution Control Unit, in U.P. Jal Nigam, Lucknow, and he has been authorized to swear and file this affidavit on behalf of UP Jal Nigam as such he is fully conversant with the facts and circumstances of the case and on the basis of record. The deponent submits as under.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

1201 ~~110~~ (2) 153

2. That on 22-5-2008 an affidavit was filed by U.P. Jal Nigam in compliance of the Order of this Hon'ble court but this Hon'ble court was pleased to direct to file update status report of work done.

3. That it is submitted that after receiving the funds hectic efforts have been done by UP Jal Nigam to complete the work. It is submitted that so far installation of the 61 tube wells is concerned, which are to be completed under JNNURM scheme, in which work of installation of 40 tube wells is also included, the work of 22 tube wells has been commissioned and the work of remaining 18 tube wells are in progress, where water supply system is available and the work would be completed expeditiously, a chart has been prepared in this regard. A photo copy of the chart, wherein details have been given, is being annexed as **Annexure no.1** to this affidavit.

4. That so far installation of 21 tube wells is concerned , the work has been completed for 3 tube wells. There is no water supply system available, so after completing the work of the installation of tube wells it will take some time and would be commissioned after laying of distribution system. The work of 12 tube wells are under progress. A photo copy of the chart in respect of installation of 21 tube wells is being annexed as **Annexure no.2** to this affidavit.

5. That it is submitted that so far re-boring of 43 tube wells is concerned; the work has been competed for 7 tube wells and the work is in progress for 22 tube wells Due to non availability of rising main pipe, the work is delayed. Efforts are being made to resolve this problem as soon as possible. A photo copy the progress chart in respect of re-boring of 43 tube wells is being annexed as **annexure no.3** to this affidavit.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

6. That it is submitted that target of installation of 409 new handpumps and re-boring / special repair of 670 handpumps was fixed under District Plan (urban). Out of which all the 409 new hand pumps and re-boring / special repair of 670 handpumps has been completed. A photo copy of progress chart in detail, including new installed hand pumps is being annexed as **Annexure no.4** to this affidavit.

7. That it is further submitted that in addition to JNNURM UP Jal Nigam has worked under Urban Water Supply (normal) programme for which fund has been provided by State Government for the work of installation of tube wells, re-boring of tube wells and other works. Out of 5 proposed tube wells, the works for 3 tube wells have been completed and the work for remaining 2 tube wells will be started after availability of land. out of proposed 39 rebore tube wells,all the 39 tube wells has been commissioned. A photo copy of progress chart in this respect is being annexed as **Annexure no.4** to this affidavit.

8. That it is also submitted that establishment of 3rd Water works project is concerned, the work for finalization of tender process has been completed and the date of start has been given to the Firm. The technical drawing and design is to be submitted by the firm and the work will be started from July End. As per Approved estimate the work is to be completed by 2010, efforts will be made to complete the work before time.

9. That so far cleaning of Gomati river is concerned, it is submitted that the land for construction of 345mld STP has been acquired by Nagar Nigam, Lucknow, on 16.07.2008 and after finalization of tendering process, the work for STP has been started on 19.07.2008. It is further submitted that the work done under Gomati action plan phase-I, II and

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

JawaharLal Nehru National Urban Renewal Programme is concerned, detail updated chart is being annexed as **Annexure no.5, 6** and **7** to this affidavit.

Place : Lucknow

Date : 21.07.2008

Deponent

Verification

I, the deponent named above do hereby verify that the content of para 1 to 9 of this affidavit filed in support of the writ petition, are true to the best of my knowledge, while those of para ..... are believed to be true being based on legal advice. No part of it is false. Nothing material has concealed. So help me God.

Place : Lucknow

Date : 21.07.2008.

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me on 21.7.08 at 11.30 a.m./p.m. by Shri V. U. Bishnoi who is identified by Shri I.P. Singh, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the facts of this affidavit which have been read over and explained to him by me.

OATH COMMISSIONER

Dinesh Kumar Misra, Advocate
Oath Commissioner High Court
Allahabad Lucknow Bench
Date 21.7.08 210491

(5) 1204 ~~113~~ 156

Annexure – 1

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई तृतीय(ई0/यॉ0), उ0प्र0,जल निगम , लखनऊ

दिनांक 19.7.2008 तक की प्रगति

ग.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित किये जाने वाले 40 नलकूपों का निर्माण-:

लक्ष्य- 40 नग नये नलकूपों

उपलब्धि – 21 नग (जलापूर्ति प्रारम्भ)

क्र सं.	नलकूपो का नाम और जल स्त्राव ली. प्रति मिनट	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि. /स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जलापूर्ति प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि	जलापूर्ति प्रारम्भ करने की निर्धारित तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम. एल.डी	वर्तमान की प्रगति	टिप्पणी
			संभावित	वास्तविक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अलीगंज सेक्टर-एच जोन-3 (1500 ली.प्र. मि.)	1.1.07		6.5.08	16.5.08		1.5		
2	इंदिरानगर डी ब्लाक, जोन-5 (1000 ली..प्र.मि.)	15.12.07		1.5.08	12.5.08		1.00		
3	विजय खण्ड, जोन-5 (1000 ली.प्र.मि.)	5.3.08		12.5.08	17.5.08		1.00		
4	अलीगंज सेक्टर -सी/डी, जोन-3 (1000 ली.प्र.मि.)	17.3.08		7.5.08	17.5.08		1.00		
5	लस्ता कालोनी, जोन-1 (1000 ली.प्र.मि.)	18.3.08		18.5.08	18.5.08		1.00		
6	अहिमबरनपुर जोन-3 (1000 ली .मि)	30.3.08		8.5.08	31.5.08		1.00		
7	त्रिवेणी नगर, जोन-3 (1000 ली.प्र.मि	17.3.08		8.5.08	7.6.08		1.00		
8	विकास नगर, सेक्टर-9 (1000 ली.प्र.मि)	19.4.08		19.5.08	11.6.08		1.00		
9	सहयोग पार्क, महानगर जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	29.4.08		21.5.08	20.6.08		1.00		
10	जानकीपुरम सेक्टर-एच ,अलीगंज जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	15.4.08		2.6.08	17.6.08		1.00		
11	हिन्द नगर नलकूप जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	11.3.08		10.6.08	17.6.08		1.00		
12	तातारपुर सेक्टर-ई अलीगंज जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	13.4.08		29.5.08	18.6.08		1.00		
13	मेहदी टोला,विष्णुपुरी कालोनी जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	9.5.08		7.6.08	18.6.08		1.00		
14	वपुरी पार्क गणेश गंज, जोन-1 (1000 ली.प्र.मि)	15.4.08		16.6.08	22.6.08		1.00		
15	कानपुर रोड योजना सेक्टर-जे, जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	10.4.08		20.6.08	23.6.08		1.00		
16	विनीत खण्ड, जोन-5 (1000 ली.प्र.मि)	24.3.08		15.6.08	28.6.08		1.00		
17	साउथ सिटी सेक्टर-सी-1 जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	21.4.08		26.6.08	4.7.08		1.00		
18	दामोदर नगर,आलमनगर, जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	13.4.08		30.6.08	4.7.08		1.00		
19	इंदिरा नगर बी- ब्लाक जोन-5 (1000 ली.प्र.मि)	15.3.08		16.6.08	8.7.08		1.00		
20	मेवा नर्सरी निशातगंज , जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	5.5.08		15.6.08	10.7.08		1.00		
21	पंचवटी कालोनी, रहीम नगरोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	19.5.08		15.6.08	11.7.08		1.00		गहरा

Jal Sanstha Zone

3' 5' 5' 3' 1' 3' 3' 3' 3' 4' 3' 3' 1' 4' 5' 4' 4' 5' 5' 5'

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

	नलकूपों का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जलापूर्ति प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि	जलापूर्ति प्रारम्भ करने की निर्धारित तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी	वर्तमान की प्रगति	टिप्पणी
			सम्भावित	वास्तविक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	जानकी पुरम सेक्टर-सी, जोन-3	9.5.08		17.6.08		23.6.08		पम्प सेट चालू	राईजिंग मेन जोडा जाना है।
23	विवेक खण्ड -4 गोमती नगर जोन-5	15.4.08		21.6.08		23.6.08		तदैव	तदैव
24	सोसाइटी पार्क नरही, जोन-1	9.5.08		26.6.08		11.7.08		तदैव	तदैव
25	साउथ सिटी रशिम खण्ड, जोन-4	9.5.08		30.6.08	17.7.08			जलापूर्ति प्रारम्भ	
26	सेक्टर-आई, एल.डी.ए. कालोनी आलमबाग, जोन -4	29.4.08		3.7.08		6.7.08		पम्प सेट चालू	तदैव
27	अशोकनगर राजाजीपुरम जोन-6	29.4.08	7.7.08			8.7.08		पम्प सेट अतिरिक्तापित वि.स. अपेक्षित	तदैव
28	बडा बरहा, आनन्दनगर, जोन-4	8.5.08	7.7.08			9.7.08		ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य पूर्ण	
29	इंदिरानगर सेक्टर-14, जोन-5	5.5.08	15.7.08			17.7.08		ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	
30	ब्रहम नगर, जोन-4	8.5.08	8.7.08			10.7.08		तदैव	
31	मातादीनशेरवाली कोठी,सहादतगंज जोन-6	13.4.08	5.7.08			7.7.08		ओ.पी. यूनिट की शिपिटंग प्रगति पर	
32	विशाल खण्ड गोमतीनगर, जोन-5	6.6.08	19.7.08			19.7.08		तदैव	
33	हुसैनाबाद शिवपुरी , जोन-2	19.5.08	16.7.08			18.7.08		कम्प्रेसर से विकास कार्य प्रगति पर	
34	आनन्द नगर वरहा रोड , जोन-4	10.6.08	25.7.08			27.7.08		तदैव	
35	विनय खण्ड-1, गोमतीनगर , जोन-5	6.6.08	18.7.08			18.7.08		कम्प्रेसर से विकास हेतु इंस्टालेशन प्रगति पर	
36	स्टार कालोनी सेक्टर-9 इंदिरा नगर , जोन-5	20.5.08	15.7.08			17.7.08		कम्प्रेसर से विकास कार्य पानी भरा होने के कारण नहीं किया जा सका।	
37	सरी पुरा, आलमनगर जोन-6	30.5.08	17.7.08			19.7.08		पावर लाइन डालने के लिए की गयी खुदाई के कारण कम्प्रेसर कार्यस्थल तक नहीं पहुँच सकी।	
38	वजीरबाग वदरअली तकिया शाह जोन-6	30.5.08	20.7.08			20.7.08		लीअरिंग पूर्ण	
39	जलाल पुर, जोन-6	1.7.08	29.7.08			31.7.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	
40	अहमदगंज पजाबा जोन-2	5.7.08	29.7.08			8.8.08		कार्य प्रगति पर	

सार-:

1. चालू नलकूपों की संख्या - 22 नग , जलावृद्धि - 21.5 एम.एल.डी.
2. निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या - 10 नग
3. नलकूपों की संख्या जिनके पम्प सेट चालू है राइजिंग मेन जोडा जाना है। - 6 नग, संम्भावित जलावृद्धि - 6 एम.एल.डी.

परियोजना प्रबंधक

Jal Samiti Zone

पेयजल योजना

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 16.07.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

जे.एन.एन.एयू.आर.एम. कार्यक्रम

(रू. लाख में)

क्रमांक	कार्य प्रगति	प्रस्तावित कार्य	दि. 21.5.2008 तक की प्रगति	दिनांक 19.7.08 तक कुल प्रगति	दिनांक 21.5.08 के उपरान्त प्रगति
1.	नया नलकूप	40 नग	5 नग चालू 27 नग प्रगति पर	22 नग चालू 18 नग प्रगति पर	17 नग चालू, 8 नग कार्य प्रारम्भ। कुल 18 नग पर कार्य प्रगति पर
		21 नग	1 नग चालू 10 नग प्रगति पर	3 नग चालू 12 नग प्रगति पर	2 नग चालू, 04 नग पर कार्य प्रारम्भ। कुल 12 नग पर कार्य प्रगति पर।
2.	रिबोर नलकूप	43 नग	3 नग चालू 7 नग प्रगति पर	7 नग चालू 22 नग प्रगति पर	4 नग चालू, 19 नग पर कार्य प्रारम्भ। कुल 22 नग पर कार्य प्रगति पर।
3.	वितरण प्रणाली	133.31 कि.मी.	12.00 कि.मी.	17.00 कि.मी.	5.00 कि.मी. का कार्य पूर्ण।
4.	राइजिंग मेन	14.40 कि.मी.	6 नग नलकूपो की राजिंग मेन पूर्ण एवं चालू 3 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रारम्भ	22 नग नलकूपों की राजिंग मेन पूर्ण एवं चालू 8 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रारम्भ	16 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू 8 नग नलकूप की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर।

योजना पर अवमुक्त धनराशि : रू. 40.00 करोड
योजना पर अब तक व्यय : रू. 36.00 करोड़

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक

41

1206
158

(8) 1207 159

लखनऊ नगर में जल सस्थान के विमिन्न जोनों में जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराषि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

दिनांक 19.7.2008 तक

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	अद्यतन प्रगति
1.	जोन–1, लालबाग	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	2 नग चालू, 1 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	3 नग चालू, 6 नग प्रगति पर।
2.	जोन–2, ऐषबाग	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	4 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	–
3.	जोन–3, अलीगंज	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	10 नग चालू, 5 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	4 नग चालू, 7 नग प्रगति पर।
4.	जोन–4, आलमबाग	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	5 नग चालू, 10नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	2 नग प्रगति पर।
5.	जोन–5, इन्दिरानगर	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	8 नग चालू, 5 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	3 नग प्रगति पर।
6.	जोन–6, राजाजीपुरम	जे.एन.एन.यू.आर एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	5 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	4 नग प्रगति पर।
	योग :	**नया नलकूप**	**25 नग चालू 30 नग प्रगति पर**
		रीबोर नलकूप	**7 नग चालू 22 नग प्रगति पर**

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक

(I.P. ...

(9) 1208 160

ANNEXURE – 2

दिनांक 19.7.2008 तक की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ शहर के विभिन्न पेयजल योजनाओं के विरूद्ध प्रस्तावित 21 नलकूप का विवरण

लक्ष्य – 21नग नये नलकूप

उपलब्धि – 2 नग नलकूप

क्र सं.	नलकूपों का नाम स्त्राव लीटर प्रति मिनट	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जलापूर्ति प्रारम्भ करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम. एल.डी.	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			संम्भावित	वास्तविक				
1	2	3	4	5	6	7	3	
1	लिवटी कालोनी, कुर्मान्चल नगर पेय जल योजना –: 2 नग , जोन-3							
	1.कुर्मान्चल नगर(मानसबिहार)नलकूप-1 1000 लो.प्र.मि.	10.2.08		8.5.08	18.5.08	1.00		
	2.कुर्मान्चल नगर(लिवटी कालोनी) नलकूप-2	17.3.08		22.6.08		1.00		जलापूर्ति प्रारम्भ
2	शिवनगर पेयजल योजना :- 4 नलकूप जोन-3							
	3. नलकूप सं.-1 1000 लो.प्र.मि..	10.11.07		8.5.08	28.5.08	1.00		
	4. नलकूप संख्या -2(कुम्हार टोला)	30.5.08	15.7.08				ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	
3	भारतनगर पेय जल योजना :- 3 नलकूप , जोन-3							
	5. सत्यलोक कालोनी	15.3.08		20.5.08		-	पम्प सेट चालू	राइजिंग मेन जोडा जाना है।
	7. महाराजा अग्रसेन पार्क	30.4.08		21.6.08		-	तदैव	तदैव
	6. भगत सिंह पार्क	28.4.08		21.6.08			तदैव	तदैव
4	गढीकनौरा पुनगर्ठन पेयजल योजना :- 6 नलकूप , जोन-2							
	8. पी.टी.सी. , मिल के पास,	30.4.08	15.7.08				लोअरिंग पूर्ण	
	9. नलकूप संख्या-2, तालकटोरा	21.5.08	31.7.08				तदैव	
5	खरिका वार्ड पेयजल योजना :- 6 नलकूप , जोन-4							
	10. नलकूप संख्या-1(लौगा खेडा)	3.5.08	15.7.08				लोअरिंग पूर्ण	
	11. नलकूप संख्या-2(झंडे वाला पार्क)	13.5.08	25.7.08				तदैव	
	12. नलकूप संख्या-3(बलदेव विहार पार्क)	17.5.08	25.7.08				तदैव	
	13. नलकूप संख्या-3(गोप स्कूल के पीछे)	30.5.08	30.7.08				तदैव	
	14. चन्द्र विहार कालोनी पार्क	18.6.08	4.8.08				तदैव	
	15. डिफेन्स कालोनी	18.6.08	30.7.08				ड्रिलिंग कार्य प्रगति पर	

सार:-

1. कूल प्रस्तावित नलकूपों की संख्या – 21 नग
2. पूर्ण नलकूपों की संख्या – 3 नग , जलावृद्धि 3.00एम.एल.डी.
3. निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या – 12 नग
4. नलकूपों की संख्या जिनके पम्प सेट चालू है राइजिंग मेन जोडा जाना है। – 4 नग, संम्भावित जलावृद्धि - 4 एम.एल.डी.

मु.योजना प्रबन्धक

Ex Engineer Zone

5
5
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

ार्यालय परियोजना प्रबन्धक, गो0प्र0नि0ई0-।।।(वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 43 नग रिबोर नलकूपों का कार्य

1	डायमण्ड डेरी कॉलोनी
2	महानगर सेक्टर-डी
3	हाता मातादीन
4	जवाहरभवन
5	कमलाकपूर पार्क निरालानगर
6	जानकीपुरम् ए-ब्लॉक
7	पेपरमिल कॉलोनी

परियोजना प्रबन्धक

Annexure NO. 3

दिनांक 19.7.2008 तक की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम के अन्तर्गत 43 नग री-बोर नलकूपो का निर्माण कार्य-:
लक्ष्य- 43 री-बोर नलकूपों को चालू करने की सम्भावित तिथि 31.12.08
उपलब्धि - 7 नग

क्र. स.	नलकूपों का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (राइजिंग मेन पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./से.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			वास्तविक	सम्भावित			
1	2	3	4	5	6	7	
1	डायमंड डेरी, जोन-1	1.3.08	29.4.08		1.00	जलापूर्ति प्रारम्भ	
2	महानगर सेक्टर-डी, जोन-3	6.4.08	1.5.08		1.00	तदैव	
3	हातीमाताद्दीन, जोन-1	20.3.08	13.5.08		0.60	तदैव	
4	जवाहर भवन, जोन-1	17.4.08	30.5.08		1.00	तदैव	
5	कमला कपूर पार्क निराला नगर जोन-3	10.5.08	3.6.08		1.00	तदैव	
6	जानकी पुरम, ए-ब्लाक, जोन-:	28.5.08	23.6.08		1.00	तदैव	
7	पेपर मिल कालोनी नलकूप जोन-3	20.5.08	25.6.08		1.00	तदैव	
8	पत्रकार पुरम गोमतीनगर जोन-5	5.5.08		15.7.08		ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य पूर्ण	
9	कोनेश्वर मंदिर, जोन-3	6.6.08		30.7.08		कम्प्रेसर से विकास प्रगति पर	
10	कपूरथला, नलकूप जोन-3	28.6.08		20.8.08		तदैव	
11	शिया कालोनी, जोन-3	6.6.08		30.7.08		लीअरिंग पूर्ण	
12	ओल्ड स्पीकर, जोन-1	15.6.08		4.8.08		तदैव	
13	नैपियर रोड, जोन-6	11.6.08		30.7.08		तदैव	
14	बाबूगंज जोन-3	24.5.08		15.7.08		तदैव	
15	इंदिरानगर नलकूप स.-54 जोन-5	3.5.08		20.6.08		तदैव	
16	आनन्द नगर, जोन-4	28.5.08		10.7.08		तदैव	
17	मुरली नगर , जोन-3	1.6.08		30.7.08		तदैव	
18	आर्यसमाज मंदिर गणेश गंज जोन-1	20.5.08		15.7.08		तदैव	
19	अलीगंज सं.-6 जोन-3	6.6.08		28.7.08		तदैव	
20	अलीगंज सं.-7 जोन-3	10.6.08		30.7.08		तदैव	
21	समर विहार, जोन-4	28.5.08		10.7.08		तदैव	
22	डायमंड डेरी, जोन-1	1.6.08		15.7.08		तदैव	
23	खिन्नी पार्क, जोन-3	21.6.08		10.8.08		तदैव	
24	कर्वला तालकटोरा रोड, राजाजीपुरम, जोन-6	23.6.08		12.8.08		तदैव	
25	खुर्रमबाग जोन-6	28.6.08		20.8.08		तदैव	
26	गोमतीनगर, जोन-1	17.6.08		6.8.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	
27	लालबाग ,जोन-1	30.6.08		20.8.08		तदैव	
28	से.-11 राजाजीपुरम जोन-6	28.6.08		20.8.08		तदैव	
29	विजय खण्ड, जोन-5	3.7.08		20.8.08		तदैव	

Jal Sansthan Zone

सार-:

1. कूल प्रस्तावित री-बोर नलकूपों की संख्या - 43 नग
2. चालू नलकूपों की संख्या - 7 नग , जलावृद्धि - 7.00एम.एल.डी.
3. निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या - 22 नग

परियोजना प्रबन्धक

पेयजल योजना

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 30.04.2008 के उपर किये गये कार्यो की प्रगति

सामान्य कार्यक्रम

(रू. लाख में)

क्रमांक	कार्य प्रगति	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 21.5.2008 तक कुल प्रगति		दिनांक 19.7.2008 तक कुल प्रगति		दिनांक 21.5.08 से 19.7.08 तक कुल प्रगति	
1.	नये हैण्डपम्प	409 नग	284 नग	115.53	409 नग	286.80	125 नग	74.87
2.	विषेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प	670 नग	413 नग	96.40	670 नग		257 नग	
3.	नये नलकूप	5 नग	3 नग	125.00	3नग चालू	125.00	–	–
4.	रिबोर नलकूप	39 नग	39 नग	690.00	39नग चालू	690.00	–	–
	योग :			**1026.93**		**1101.80**		**74.87**

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

मई प्रबन्धक

ANNEXURE – 4

12/1

163

(13) 12/2 164

लखनऊ नगर में जल संस्थान के विभिन्न जोनों में नगरीय पेयजल (सामान्य) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

दिनांक 01.04.06 से कराये गये कार्य

दिनांक 19.7.2008 तक

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
1.	जोन–1, लालबाग	नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य	4 नग
		मिनी नलकूप	2 नग
2.	जोन–2, ऐषबाग	नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य	2 नग
		मिनी नलकूप	1 नग
3.	जोन–3, अलीगंज	**फैजुल्लागंज पेयजल योजना**	
		नया नलकूप	1 नग
		स्टाफ क्वार्टर	9 प्रतिशत पूर्ण
		नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य	12 नग
4.	जोन–4, आलमबाग	नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य	7 नग पूर्ण
5.	जोन–5, इन्दिरानगर	**विनय खण्ड, गोमती नगर में एक नये एवं रिबोर नलकूप का कार्य**	
		नया नलकूप	1 नग
		रिबोर नलकूप	1 नग
6.	जोन–6, राजाजीपुरम	**बी–ब्लॉक रानीलक्ष्मीबाई पार्क में नलकूप का निर्माण**	1 नग
		राजाजीपुरम् 'ई' एवं 'एफ' ब्लॉक पेयजल योजना	
		नया नलकूप	–
		वितरण प्रणाली	1.00 कि.मी.
		नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य	9 नग
	योग :	**नया नलकूप**	**3 नग**
		रीबोर नलकूप	**39 नग**
		मिनी नलकूप	**4 नग**
		नया हैण्डपम्प	**409 नग**
		रिबोर/विशेष मरम्मत द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प	**670 नग**

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक

(14) 1213 165

ANNEXURE-5

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इमाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

<u>माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 21.05.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति</u>

गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रू0 करोड़ में)

क्र0सं0	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 21.05.08 तक प्रगति	दिनांक 16.07.2008 तक कुल प्रगति	दिनांक 21.05.08 से 16.07.08. तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	आई0 एण्ड डी0 कार्य-6 नग	6 नग	5 नग पूर्ण	5 नग पूर्ण	--
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन-5 नग	6 नग	5 नग पूर्ण+ 1 नग (10%)	5 नग पूर्ण + 1 नग (25%)	5 नग पूर्ण + 1 नग (15%)
3	राइजिंग मेन-7525 मीटर	7525 मीटर	5120 मीटर	5120 मीटर	--
4	सीवर लाइन-20 मीटर	20 मीटर	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
5	स्टाफ क्वार्टर-4 नग	4 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
6	जेनसेट-8 नग	8 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
7	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट-1 नग	1 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
8	भूमि अधिग्रहण-जाब	1 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
9	पम्पिंग प्लान्ट-25 नग	25 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
10	विद्युत संयोजन-6 नग	6 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
11	विविध कार्य-जाब	50 :	25:	40:	15:
(ब)	वित्तीय प्रगति				
1	वित्तीय प्रगति (व्यय)	लागत 45.22	34.28	34.75	0.47
2	प्राप्त धन		31.24	31.24	--

नोट :- कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु उ0प्र0 सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.04.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई-1
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

ANNEXURE-6

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 21.05.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रू0 करोड़ में)

क्र0सं0	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 21.05.08 तक प्रगति	दिनांक 16.07.2008 तक कुल प्रगति	दिनांक 21.05.08 से 16.07.08 तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	आई0 एण्ड डी0 कार्य-18 नग	18 नग	17 नग (95%)+ 1 नग (10%)	17 नग (95%)+ 1 नग (15%)	1 नग (5%)
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन-11 नग	11 नग	11 नग (95%)	11 नग (95%)	
3	राइजिंग मेन-18955 मीटर	18955 मी0	8104 मी0	8119 मी0	15 मीटर
4	सीवर लाइन-6092 मीटर	6092 मी0	3340 मी0	3400 मी0	60 मीटर
5	स्टाफ क्वार्टर-11 नग	11 नग	80%	80%	--
6	जेनसेट 25 नग	25 नग	100%	100%	--
7	मेन पम्पिंग स्टेश-1 नग	1 नग	40%	50%	10%
8	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट-3 नग	3 नग	4%	6%	2%
9	सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग	7 नग	6 नग (100%) + 1 नग (65%)	6 नग (100%) + 1 नग (90%)	6 नग (0%) + 1 नग (5%)
10	नदी तट का विकास (घाट)-5 नग	5 नग	9 नग (90%)	5 नग (95%)	5%
11	शौचालय का निर्मा-21 नग	21 नग	6 नग	6 नग	--
12	वर्नीकरण-जाब	20%	5%	5%	--
13	जनजागरण - जाब	20%	5%	5%	--
14	भूमि अधिग्रहण-जाब	100%	50%	95%	45%
15	पम्पिंग प्लान्ट-जाब	58 नग	95%	95%	--
16	विद्युत संयोजन-जाब	30%	70%	70%	--
17	विविध कार्य-जाब	50%	30%	35%	5%
(ब)	वित्तीय प्रगति				
		लागत			
1	वित्तीय प्रगति (व्यय)	263.04	57.32	94.48	37.16
2	प्राप्त धन		58.395	92.768	34.373

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई-1
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

(1)

1215 (16) ~~1214~~ 167

ANNEXURE-7

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 21.05.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रू0 करोड़ में)

क्र0सं0	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 21.5.08 तक प्रगति	दिनांक 16.07.2008 तक कुल प्रगति	दिनांक 21.05.08 से 16.07.08 तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज	289 किमी0	10 किमी0	20 किमी0	10 किमी0
2	ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.)	48 किमी0	1.00 किमी0	3.00 किमी	2.00 किमी0
3	सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.)	1 नग	6%	10%	कार्य एवार्ड
4	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.)	1 नग	6%	10%	कार्य एवार्ड
5	राइजिंग मेन 1000 एम.एम.	45 मीटर	0	0	इसकी आवश्यकता वर्ष 2009-10 में हैं।
(ब)	वित्तीय प्रगति				
1	वित्तीय प्रगति (व्यय)	लागत 236.23	10.99	17.84	6.85
2	प्राप्त धन		30.00	30.00	--

नोट :-

1. योजना दिनांक 17.08.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रू0 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को निर्गत की गयी तथा पुनः रु. 15.00 करोड़ की द्वितीय किश्त दिनांक 27.4.2008 को निर्गत की गयी।
3. लगभग 180 किमी0 सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम0एल0डी0 के कार्य दिनांक 19.05.2008 से प्रारम्भ/18 माह की कार्य अवधि।
5. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य एवार्ड/ कार्य 01.06.2008 से प्रारम्भ करा दिया गया।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई-1
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

1216 ~~125~~ 168

राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
National Environmental Engineering Research Institute

डॉ. त. चक्रबर्ती
Dr. T. Chakrabarti
कार्यकारी निदेशक
Acting Director

SPEED POST
D/15/2008
July 17, 2008

To

The Registrar
Lucknow Bench
Allhabad High Court
Lucknow

Subject: Regarding Compliance of the directive from Lucknow bench of Hon'ble Allahabad High Court for writ petition No. 4436

Dear Sir,

As per the Directive of the Lucknow Bench of Hon'ble Allahabad High Court regarding the subject matter, I am sending herewith Inspection Report entitled "Environmental Issues Associated with MSW Dumping on the Gomati River Bed near Gandhi Setu, Lucknow"

With regards

Yours sincerely,

cl. As above

(T. Chakrabarti)

Cc to: 1) Member Secretary, UPSPCB, Lucknow
2) Commissioner, Lucknow Municipal Corporation, Lucknow

नेहरू मार्ग, नागपुर 440 020 भारत – Nehru Marg, Nagpur 440 020 INDIA
O : 91-712-2249999 Fax : 2249900 R : 2460378
E-mail : director@neeri.res.in Website : www.neeri.res.in

ISO 9001 REGISTERED
MGMT. SYS. RvA C 024

1217 ~~1126~~ 169

Inspection Report

Report on Environmental Issues Associated with MSW Dumping on the Gomati River Bed near Gandhi Setu, Lucknow

(Reference: Writ Petition No. 4436 (MB) of 2003)

Submitted to:

Lucknow Bench of Hon'ble Allahabad High Court

National Environmental Engineering Research Institute
(Council of Scientific and Industrial Research)
Nehru Marg, Nagpur - 440 020

17 July, 2008

1210 ~~1127~~ 170

Report on Environmental Issues Associated with MSW Dumping on the Gomati River Bed near Gandhi Setu, Lucknow

(Reference: Writ Petition No. 4436 (MB) of 2003)

1. Preamble

Gomati river, a tributary of river Ganga, originates near Pilibhit in Uttar Pradesh (U.P.) and, on its course, flows by many towns in U.P. of which Lucknow is the largest town and the capital city of U.P. Gomati river is the single largest source of domestic water supply, including drinking water, for the city of Lucknow, apart from its cultural importance. However, Gomati river also receives huge amount of treated and untreated wastewater, which result in the pollution of the river. The **Writ Petition No. 4436 (MB) of 2003** pertains to the sewage treatment and the abatement of the water pollution for cleaning the Gomati river. In addition, through this Writ Petition it was brought to the notice of Lucknow Bench of the Hon'ble Allahabad High Court that Municipal Solid Waste (MSW) was being dumped on the banks of Gomati river, specifically near Gandhi Setu, by Lucknow Municipal Corporation (LMC), which might lead to the contamination of Gomati river.

In this context, Lucknow Bench of the Hon'ble Allahabad High Court directed National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur to inspect the situation and submit a report in consultation with Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB). Accordingly, a team of scientists from NEERI, namely Dr. T. Nandy, Dr. A.N. Vaidya, Mr. J.K. Bhattacharyya, and Dr. S.Y. Bodkhe visited Lucknow on June 8 and 9, 2008, for site inspection and to get the relevant information from concerned Governmental and regulatory agencies. The officials who accompanied the team of NEERI Scientists during the site inspection were Mr. S.K. Tandon, Regional Officer (RO), Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Mr. A.C. Sinha, Additional Municipal Commissioner, LMC, Mr. Anil Kumar, Deputy Municipal Commissioner, LMC, Mr. B.W. Mishra, Chief Engineer, LMC and Mr. S.K. Jain, Executive Engineer, LMC.

This report details the status of MSW dumping on the banks of Gomati river, possibility of contamination of the river due to MSW dumping, and the necessary measures to be taken to minimize the pollution of Gomati river due to MSW dumping, a step towards cleaning of the river. This report is based on the site inspection and the data collected from concerned State Government and regulatory agencies and it is being submitted to Lucknow Bench of Hon'ble Allahabad High Court as per the directive.

2. Existing Scenario

- Lucknow city has a population of around 25 lakh and the estimated quantity of MSW generation is around 1200 tons per day (TPD). There are around 303 open dumps, 58 dhalaos and 39 big and small dumps spread all over the city. There is no sanitary landfill developed for the management of MSW as per MSW Rules 2000 stipulated by The Ministry of Environment and Forests (MoEF). However LMC is proposing to develop sanitary landfill under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM). (As per information collected from LMC).

- The specific municipal solid waste dump site as referred in the petition is situated on the west bank of the Gomati River near Gandhi Setu. The site is adjacent to the main road and small road to Jiamau. It occupies the area on the river bed inside the embankment of the river. Barrage on the Gomati river is situated on the upstream side of the site. The exact location of the site is shown in the map attached as **Figure 1**. LMC had been dumping MSW at this site since June 13, 2007 till March, 27, 2008. The dumping was stopped after March 27, 2008 as per the order of Hon'ble High Court. During this period, about 5287 cubic meters of MSW were dumped at this particular site. LMC is planning to cap the site and develop a garden over the site (as per information collected from LMC).

- Apart from MSW, about 345 mld of sewage is generated in the area in and around Lucknow and discharged into the Gomati river through 26 no. of nullahs. About 42 mld of sewage is subjected to the treatment and remaining quantum is discharged without any treatment. Uttar Pradesh Jal Nigam (UPJN) is planning to set up a 345 mld Sewage Treatment Plant (STP) at Bharwara towards the eastern end of the city. (As per information collected from UPJN).

3. Inspection and Observations

The team of NEERI scientists along with officials from LMC and UPPCB inspected the site and other impacted areas. The relevant photographs and water samples were collected during this inspection. The matter was discussed with the officers from LMC, UPPCB, and UPJN. The salient observations are mentioned hereunder.

- Huge quantity of MSW was dumped at the site near Gandhi Setu. The Dump height was approximately 5 meters. The area occupied by the dump as reported by LMC, was approximately 2500 sq. meters [(50 x 50) meters]. The photographs of dumpsite from different directions are attached as **Figures 2-5**.
- The dumpsite is very close to the river and inside the embankment and falls in the flood prone area. A photograph showing proximity of the river and stagnated water pools is attached as **Figure 6**.
- The dumpsite is also at the proximity of the monuments being developed on the banks of Gomati river. A photograph is attached as **Figure 7**.
- A pool of MSW leachate was observed at the base of dumpsite, which was formed by the runoff rain water. The colour of the leachate was dark and it had bad odour. A sample of leachate was collected and analyzed for relevant parameters. Photograph showing the pool of leachate and the leachate sample collected are attached as **Figures 8 and 9**.

- Small surface water streams from the leachate pool were observed to be approaching the river **(Figure 10)**.
- Apart from this site, MSW was dumped at many places in a non scientific way. The photograph of open dumpsite on Hardoi road is attached as **Figure 11**. These sites also have water bodies in the vicinity.

4. Possible Impacts due to Uncontrolled Land filling Practices Near the River Bed

Uncontrolled disposal of MSW on river bed may lead to the following environmental problems:

- **Contamination of river water by leachate and surface run off from MSW**
  Rain water falling over the dump dissolves organic and inorganic pollutants present in MSW and generates a highly polluted stream of water commonly referred as leachate, characterized by high Chemical / Biochemical Oxygen Demand (COD /BOD) and high metal content. Leachate may find access to river by percolation through soil strata or by surface streams leading to river water pollution.

- **Contamination of ground water of localities nearby the MSW dump**
  Leachate may migrate downwards or laterally by diffusion through the soil strata to the adjacent areas and may contaminate ground water in the localities nearby the MSW dump.

- **Deterioration in air quality due to suspended particulate matter(SPM) released from the MSW dump**
  Dumping of MSW releases large quantities of SPM leading to the deterioration of ambient air quality nearby the MSW dump.

- **Deterioration of aesthetic value of the area due to ugly site and odour problem**
  The organic matter in the MSW undergoes biodegradation leading to odour problems in the area. In addition, it leads to the breeding of mosquitoes and flies deteriorating the aesthetic value of the area.

Awadhya
Kapasiawala

Chemical analysis of leachate showed high COD values in the range of 8000 to 12000 mg/lit. indicating its pollution potential. Standards for the discharge of waste water into the river require COD to be less than 250 mg/lit and BOD to be less than 30 mg/lit. As the site is close to the river and it is in flood prone area, there is a possibility of contamination of river water due to leachate and surface run off specially in the rainy season. This applies to any uncontrolled dumping nearby river.

5. Recommendations

Based on the inspection and the information collected, following steps are recommended.

i. Immediate abandoning of the MSW dumping along the riverside

The concerned authorities should immediately abandon the practice of dumping MSW along the Gomati river side. This applies to the particular site referred in the petition as well as to any other site close to the river bed whether such dumping is practised intentionally or unintentionally. This is necessary for the protection of ground water and river water from environmental pollution.

ii. Protection of the Gomati river from the possible pollution due to the MSW dumped at the site near the Gandhi Setu.

Two options are delineated for the protection of the Gomati river from possible pollution due to MSW dumping at the above mentioned site.

Option 1: Removal of the Garbage (MSW) from the referred site

The garbage should be mechanically removed from the dumpsite and transferred to the sanitary landfill developed in accordance with the Guidelines of MSW Rules 2000 of MoEF, wherein due precautions are taken for the prevention of leachate percolation in the ground as also for leachate collection and treatment and landfill gas collection. **However, scientifically designed sanitary land fill is not available in Lucknow and dumping of the removed garbage at some**

other improper location will lead to the same problems as in case of the referred dumpsite. Therefore construction of a sanitary landfill in the city of Lucknow is mandatory pre-requise for this option.

Option 2: Confinement of the possible pollution from the referred MSW dumpsite

Another option is the confinement of the possible pollution by already dumped MSW so as to protect Gomati river from environmental pollution. The process involves application of final cover over the top of the dumpsite and sides of the dumped waste. The final cover should meet the specifications delineated in the MSW Rules 2000 of MoEF, which are broadly as follows.

- A soil layer comprising of 60 cms clay or clayey soil of permeability not more than 1×10^{-7} cm/sec.
- A HDPE cover of thickness 1.5 mm
- A drainage layer of thickness 15 cms
- A vegetative soil layer of 45 cms for supporting plantation and plant growth
- Plantation of appropriate species
- Boreholes should be constructed around the site to draw ground water for monitoring.
- The slope of the final cover should not be directed towards the river. A peripheral drain can be provided around the closed site.

In both the options, a retaining wall must be constructed near the dump to act as barrier between the leachate & contaminated ground water, and the river water. This should be done in consultation with appropriate regulatory

Aravidya
Gopalan

agencies, experts in the field, and considering hydrogeological properties of the area.

iii. Development of Sanitary Land fill for Lucknow as per the MSW rules 2000 of MoEF.

The concerned authorities should pursue the development of sanitary landfill to cater the need of MSW management of Lucknow city. As per the information received from the LMC, the procedure has been initiated under JNNURM. However, sanitary landfill construction needs to be taken on priority by all concerned authorities to avoid future problems of similar kind.

iv. Treatment of Sewage

It is desirable that entire quantity of sewage generated in the city should be treated and reused for suitable purpose, rather than discharging into the river. However, this warrants detailed scientific study. In any case untreated sewage not conforming to the discharge standards stipulated by the UPPCB should not be discharged into river. UPJN has already proposed a 345 mld sewage treatment plant at Bharwara and expansion of the existing 42 mld STP to 56 mld at Daulatganj and it is recommended that it should be constructed on priority basis.

v. Monitoring of the Water Quality of Gomati River Upstream and Downstream of the Dump Site

The UPPCB is monitoring river water quality regularly for the parameters such as dissolved oxygen, pH, total coliforms. However, monitoring should be more frequent and in details, especially with respect to heavy metals, COD and BOD.

vi. Study for Cleaning of Gomati River

A comprehensive scientific study should be immediately undertaken by the concerned authorities for studying the cleaning of Gomati river covering all environmental aspects.

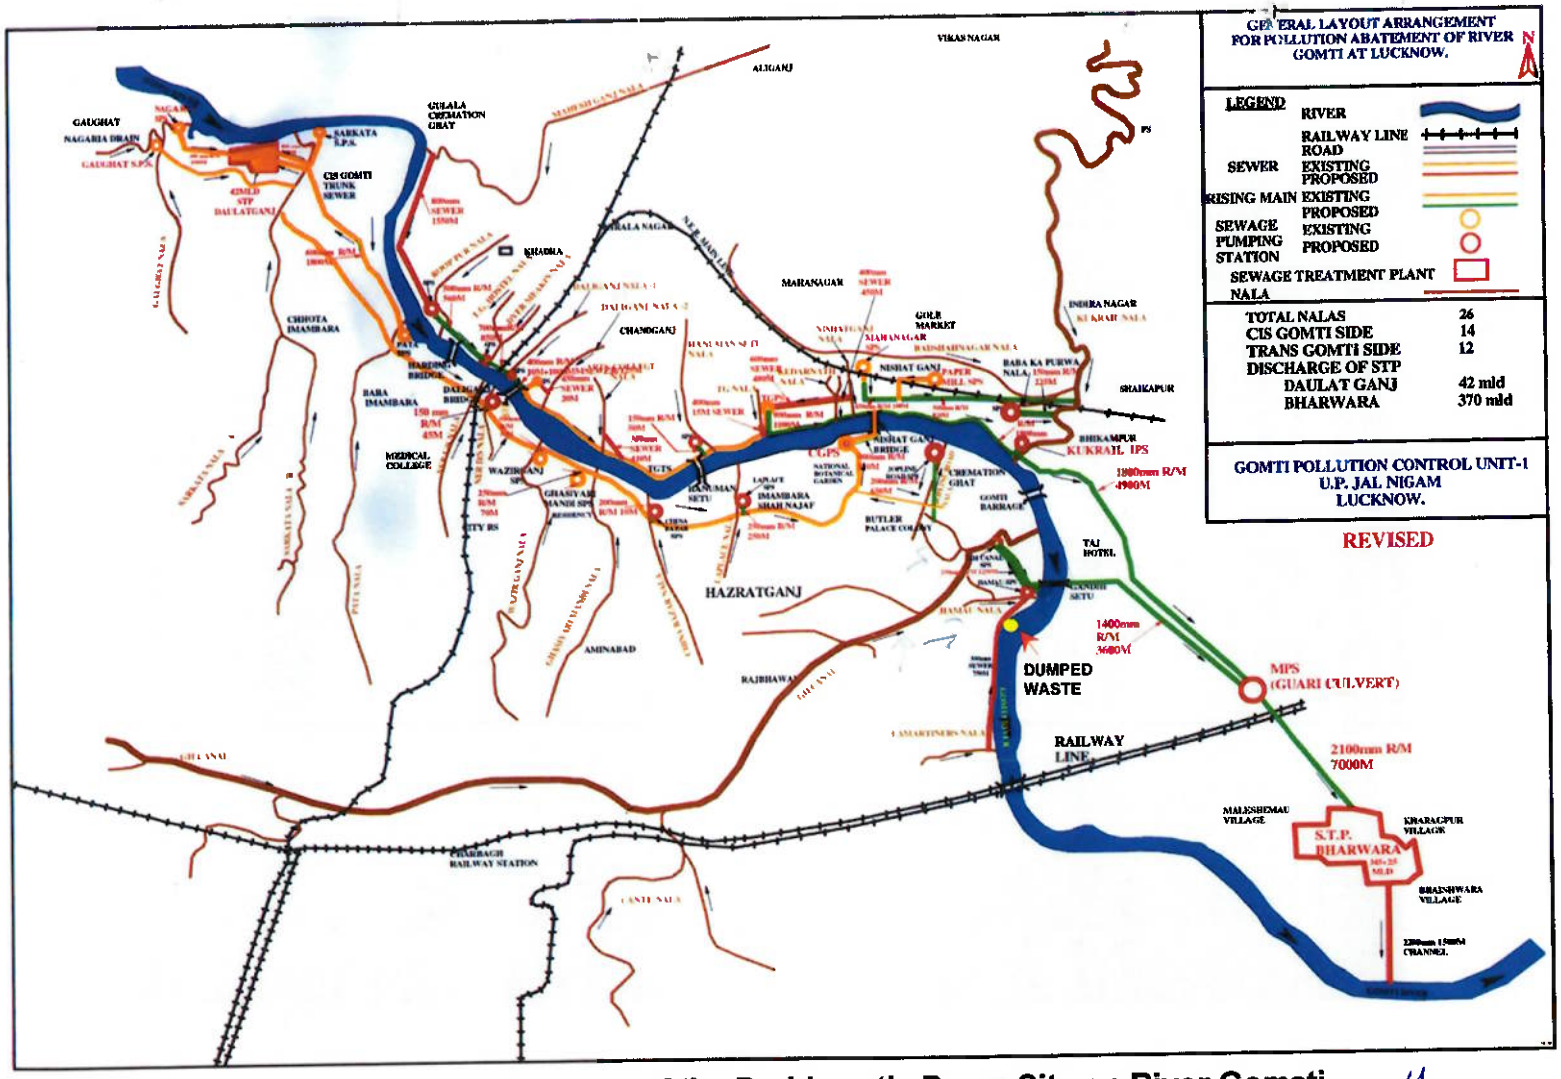

Figure. 1: Location of the Problematic Dump Site on River Gomati

1225

177

1228 137 180

Figure 6: Photograph showing proximity of MSW dump to the stagnated water pools near the river

Figure 7: Photograph showing proximity of MSW dump to the Monuments

1229 ~~1150~~ 181

Figure 8: Photograph of leachate sample collected from the site

Figure 9: Photograph showing stagnated pool of leachate near MSW dump

A Waidya

Gopaswamy

1230 ~~151~~ 182

Figure 10: Photograph of surface water streams from MSW dump to Gomati River

Figure 11: Photograph of open MSW dump site on Hardoi Road, Lucknow

1231 ~~1110~~ ~~183~~

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH LUCKNOW.

Writ Petition No. 4436 (MB) of 2003

Sewage Treatment Plant ... Petitioner

Versus

State of U.P. and others ... Opposite Parties

CONNECTED WITH

Writ Petition No. 2598 (MB) of 2007

Gomti Nagar Jan Kalyan Maha Samiti ... Petitioner

Versus

State of U.P. and others ... Opposite parties

AND

Writ Petition No. 6748 (MB) of 2008

Bhanwari Lal ... Petitioner

Versus

State of U.P. and others ... Opposite Parties

OBJECTIONS AGAINST THE SECOND OPTION FOR DEVELOPMENT OF THE PARK NEAR GANDHI SETHU AS SUGGESTED BY THE LUCKNOW NAGAR NIGAM

1. That on 21.7.2008, the National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) given second option of confinement of the possible pollution from the referred Municipal Sold Waste (MSW) dumpsite to protect the Gomti River from the environmental

1232 184

pollution. The process involves application of final cover over the top of the dumpsite and sides of the dumped waste. The final cover should meet the specifications delineated in the MSW Rules, 2000 of MoEF, which are broadly as follows:-

- A soil layer comprising of 60 cms. clay or clayey soil of permeability not more than 1×10^{-7} cm/sec.
- A HDPE cover of thickness 1.5 mm
- A drainage layer of thickness 15 cms
- A vegetative soil layer of 45 cms for supporting plantation and plant growth
- Plantation of appropriate species
- Boreholes should be constructed around the site to draw groundwater for monitoring.
- The slope of the final cover should not be directed towards the river. A peripheral drain can be provided around the closed site.

2. That MSW Rules came into force in the year 2000 but the State Government and Lucknow Nagar Nigam has not taken any steps for removal of the Municipal Solid Waste and due to this very reason, there are 500

1233 185

dumping sites in the city, but one site has come to the knowledge of this Hon'ble Court.

3. That since the referred dumping site is very adjacent to the Gomti River, second option, as suggested by the NEERI, is not at all possible for the reason that the respondents cannot avoid the contaminated water.

4. That in addition to the recommendations of the NEERI, Leachate, Sulfer and Nitrogen containing sold wastes will generate Ammonia and Hydrogen Sulfide due to anaerobic reaction. In Lucknow, drinking water is supplied from the ground through tube-wells and there are chances of grave contamination due to solid wastes dumping.

5. That there is deterioration of air quality for the reason that during summer and winter, the dust from the top of the dump may be re-suspended in the air and will increase suspended particulate matter (SPM) in the ambient air. In addition, ambient air will also be polluted with Methane Hydrogen Sulfide and Ammonia.

6. That deterioration of aesthetic value is also necessary for the reason that MSW lying uncovered will lead development of dump site and adour producing

1234 ~~1195~~ 186

pollutants. Development of grass cover may improve physical outlook of the site.

Arrangement of leachatge collection is to be provided and leachate conforming to waste discharge standards should only be discharged into the river. Arrangement of gas emission at some suitable heights is also required, which is not at all possible due to very adjacent of the site, near the Gomti River.

7. That the NEERI has suggested for physical removal of already dumped MSW from site to a sanitary landfill. This is an ideal solution but it is extremely difficult to construct sanitary landfill immediately. Municipal Corporation may adopt second option till arrangement for first option is completed on war footing, but in Lucknow City there is no sanitary landfill area and at present, Municipal Corporation is dumping about 1200 Tonnes per day Municipal Sold Waste at five hundred places and there is no any sanitary landfill area and due to this very reason, citizens of Lucknow are consuming contaminated groundwater through tube-wells as well as through Gomti River.

1235 187

The size of the sanitary landfill area should be decided in such a way, considering for at least 25 years. Some reputed consultants/advisors are also to be retained for MSW sanitary landfill area.

8. That at present there is no any sanitary landfill area and at least two sanitary landfill areas must be in operation as early as possible to improve the water and area quality.

9. That it would not be out of place to mention here that due to MSW dump near the Gomti River, large number of diseases are generating in the City, like, arthritis, cancer, anemia, etc.

10. That through the Chromium Nitrate Fluoride and Ammonium, large number of diseases are generating in the City and if the MSW may not be removed from the Gomti River and other places immediately, public at large will be affected badly.

11. That since second option is not possible at all, therefore, the respondents Lucknow Nagar Nigam and State Government may be directed to remove the MSW forthwith near Gomti Sethu and place the same

1236 188

at any sanitary fill area with the help and assistance of the authorized consultants, like NEERI.

12. That under these circumstances, the first option may be opted not only for the present area near Gandhi Sethu but also for other 500 sites, where the Municipal Authorities are dumping 1200 tonnes MSW per day.

13. That apart from this, it is also necessary to point here that so many areas, which are under the domain of the Lucknow Development Authority and Housing Board and other private Housing Board, but not under the domain of Lucknow Nagar Nigam, where large number of MSW are dumping, without any hindrance and these MSW sites may also be stopped forthwith and MSW may be placed at some sanitary fill area.

14. That under these circumstances, send option suggested by the Lucknow Nagar Nigam is not possible and only first option is a solution.

Place : Lucknow
Dated : 24/8 , 2008

(B.K. Singh)
Advocate
Counsel for the applicants

-1- 1237 ~~1146~~ ~~188-A~~

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
SITTING AT LUCKNOW.

W/P No. 4436 (M/B)/2003

Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

APPLICATION FOR AFFIDAVIT TO BE TAKEN ON RFECORD

For the facts, reasons and circumstances stated in the accompanying counter affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to take the affidavit on record in the interest of justice.

Any other suitable order or direction which this Hon'ble Court may deem fit just and proper in the circumstances of the case may also be passed in favour of the opp. Party.

Place : Lucknow

Date : 25/08/08

(I.P. Singh)
Advocate,
Counsel for Deponent

1238 447

189

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH LUCKNOW.

Writ Petition No. 4436 (MB) of 2003

Sewage Treatment Plant ... Petitioner

Versus

State of U.P. and others ... Opposite Parties

CONNECTED WITH

Writ Petition No. 2598 (MB) of 2007

Gomti Nagar Jan Kalyan Maha Samiti ... Petitioner

Versus

State of U.P. and others ... Opposite parties

AND

Writ Petition No. 6748 (MB) of 2008

Bhanwari Lal ... Petitioner

Versus

State of U.P. and others ... Opposite Parties

AFFIDAVIT

I, Brikeshwar Tiwari, aged about 62 years, son of Rajeshwar Tiwari, R/o 1/106, Vishwas Khand, Gomti Nagar, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the deponent is the elected General Secretary of Gomti Nagar Jan Kalyan Mahasamiti and pairokar and as

1259 ~~1148~~ 190

such, he is fully conversant with the facts and circumstances of this case and is deposed hereinunder.

2. That the contents of paras 1 to 14 of the accompanying objections are true to my personal knowledge and paras ~~4~~ are based on the records and those of paras ~~4~~ are believed to be true on the basis of legal advice.

Lucknow
Dated: 25/8/08

(DEPONENT)

VERIFICATION

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of para 1 to 2 of this affidavit are true to my personal knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed. So help me God.

Lucknow
Dated: 25/8/08

(DEPONENT)

I, identify the deponent who has signed before me.

B. K. Singh
Advocate

Solemnly affirmed before me on 25/8/08 at 8.30 a.m./~~p.m.~~ by Sri Brikeshwar Tiwari, the deponent who is identified by Sri B. K. Singh, Advocate, High Court, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understood the contents of the affidavit which has read out and explained by me.

Oath Commissioner

OATH COMMISSIONER
High Court
Lucknow Bench
No. 22405

1240 ~~1249~~ 191

IN THE HON'BE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
IN RE:
WRIT PETITION 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant --------- Petitioner

VERSUS

State of U.P. and others --- opposite parties

Affidavit on behalf of Jal Sansthan, Lucknow in Compliance of the order dated 21.07.2008 passed by this Hon'ble Court

I, Akhileshwar, aged about 53 years, S/o Late Lakhan Prasad presently working as Executive Engineer, Zone-I, Lucknow Jal Sansthan, Lucknow; the deponent do hereby solemnly affirms and state on oath as under:-

1. That the deponent is impleaded in the aforesaid writ petition as opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed herein.

2. That this writ petition was last listed on 21.07.2008 whereby this Hon'ble Court was pleased to direct the respondents to give a complete report regarding the

1241 ~~150~~ 192

projects proposed to be undertaken, funds released and utilized on the next date i.e. today i.e. on 25.08.2008.

3. That in compliance of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 21.07.2008 the present affidavit is being filed thereby mentioning the detail of work under taken by the authorities under the JNNURM and others.

4. That it is submitted that so for as the installation of 61 Tubewells are concerned which are to be completed under the JNNURM Scheme, in which work of installation of 40 Tubewells is also included, out of the same work of 25 Tubewell has been commissioned and work of remaining 15 Tubewells are in progress where water supply system is available and the work would be completed expeditiously. The chart has been prepared in this regard by U.P. Jal Nigam. A photocopy of the said chart is being filed herewith as **Annexure No. 1** tot his affidavit.

5. That so far as installation of 21 Tubewells is concerned the work has already been completed on three tubewells. It is pertinent to mention here that no water supply system is available so after completing the work of installation of Tube wells which will take some reasonable time and the same will be commissioned after laying done of the distribution system. Moreover, the work on 13 Tubewells are well in progress. A

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD
25/8/08

photocopy of the chart in respect of installation of 21 tubewells is being annexed herewith as **Annexure No. 2** to this affidavit.

6. That it is submitted that so far as reboring of 43 Tubewells is concerned the work has been completed on ~~8~~ 29 Tubewells whereas the work is in progress on ~~28~~ 27 Tubewells. A photocopy of the progress chart in respect of re-boring of 43 Tubewells is being annexed herewith as **Annexure No. 3** to this affidavit.

7. That it is further submitted that from the target of installation of 409 new handpumps and re-boring/special reboring of 670 handpumps was vested under the URBAN DISTRICT PLAN out of the said 409 new handpumps and reboring/special re-boring of 670 handpumps has already been completed. A photocopy of progress chart in detail is being annexed herewith as **Annexure No. 4** to this affidavit.

8. That it is further relevant to submit over here that under URBAN WATER SUPPLY (NORMAL) PROGRMME out of five propose tubewells three tubewell has been completed and work on one tubewell is in progress and further out of 39 reboring of tubewell all 39 has been commissioned. A photocopy of progress report in this regard is being annexed herewith as **Annexure No. 5** to this affidavit.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD 25.8.08

9. That it is pertinent to mention over here that so far as the establishment of 3rd Water Project is concerned the work for

finalization of tender process has been completed by the U.P. Jal Nigam. The Boundary Wall, Site Office and Zonal Under Ground Water Storage Tanks are in progress.

10. That from the narration made hereinabove it is establish that the Lucknow Jal Sansthan, Lucknow had taken all relevant steps in compliance of order dated 21.07.2008 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will carry out every direction i.e. issued by this Hon'ble Court from time to time.

Lucknow
Dated: 25/8/08

Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of paragraph 1 to 10 of the affidavit are true to the best of our personal knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed by me.

So help me God.

Lucknow
Dated 25/8/08

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me

Advocate

5. 1244 ~~453~~ 195

Solemnly affirmed before me on 25/8/88 at 3-01 A.M./P.M by the deponent who is identified by Shri. Namit Sharma, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him by me.

Shailendra Kumar
Advocate Oath Commissioner
Hon'ble High Court, Allahabad
Date 25-8-88 Copon No. 12456

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD
25/8/88

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW BENCH LUCKNOW

Writ Petetion No 4436 (M/B/2003) 6

Sewage Treatment Plant State of U.P. versus

ANNEXURE NO :1 ~~154~~ 196 245

- Petitioner

- - - -

1246 ~~1155~~

	नलकूपों का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि. /रा.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जलापूर्ति प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि	जलापूर्ति प्रारम्भ करने की निर्धारित तिथि	जल वृद्धि एम.एल.डी में	वर्तमान की प्रगति	टिप्पणी
			सम्भावित	वास्तविक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	साउथ सिटी रशिम खण्ड, जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	9.5.08		30.6.08	18.7.08		1.00		
23	विवेक खण्ड -4 गोमती नगर जोन-5 (1000 ली.प्र.मि)	15.4.08		21.6.08	30.7.08		1.00		
24	सेक्टर-आई, एल.डी.ए. कालोनी आलमबाग, जोन -4	29.4.08		3.7.08	11.8.08		1.00		
25	अशोकनगर राजाजीपुरम जोन-6	29.4.08		11.8.08	14.8.08		1.00		
26	जानकी पुरम सेक्टर-सी, जोन-3	9.5.08		17.6.08		20.8.08		पम्प सेट चालू	राइजिंग मेन जोडा जाना है।
27	[illegible]टी पार्क नरही, जोन-1	9.5.08		26.6.08		20.8.08		तदैव	तदैव
28	[illegible] यरहा, आनन्दनगर, जोन-4	8.5.08		7.7.08		20.8.08		तदैव	तदैव
29	ब्रह्म नगर, जोन-4	8.5.08		8.7.08		20.8.08		तदैव	तदैव
30	इंदिरानगर सेक्टर-14, जोन-5	5.5.08	15.7.08			25.8.08		ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य पूर्ण	
3	मातादीनभरवाली कोठी,सहादतगंज जोन-6	13.4.08	5.7.08			25.8.08		तदैव	
32	विशाल खण्ड गोमतीनगर, जोन-5	6.6.08	19.7.08			25.8.08		तदैव	
33	हुसैनाबाद शिवपुरी , जोन-2	19.5.08	16.7.08			27.8.08		ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	
34	विनय खण्ड-1, गोमतीनगर , जोन-5	6.6.08	18.7.08			27.8.08		कम्प्रेसर से विकास कार्य पूर्ण	
35	आनन्द नगर यरहा रोड , जोन-4	10.6.08	25.7.08			31.8.08		तदैव	
36	बजीरबाग बदरअली तकिया शाह जोन-6	30.5.08	20.7.08			31.8.08		तदैव	
37	सरी पुरा, आलमनगर जोन-6	30.5.08	17.7.08			15.9.08		पाइप लाइन डालने के लिए की गयी खुदाई के कारण कम्प्रेसर कार्यस्थल तक नही पहुंच सकी।	
38	स्पर कालोनी सेक्टर-9 इंदिरा नगर , जोन-5	20.5.08	15.7.08			15.9.08		कम्प्रेसर से विकास कार्य पानी भरा होने के कारण नही किया जा सका।	
39	अहमदगंज पजावा , जोन-2	5.7.08	29.7.08			7.9.08		लोअरिंग पूर्ण	
40	जलाल पुर, जोन-6	1.7.08	29.7.08			11.9.08		तदैव	

नोट:-

1. चालू नलकूपों की संख्या - 25 नग , जलावृद्धि - 25.5 एम.एल.डी.
2. निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या - 15 नग
3. नलकूपों की संख्या जिनके पम्प सेट चालू है राइजिंग मेन जोडा जाना है। - 4 नग, संभावित जलावृद्धि - 4 एम.एल.डी.

30/10/08
परियोजना प्रबंधक

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE
AT ALLAHABAD LUCKNOW BENCH ~~1156~~ 8
LUCKNOW
Writ Petetion No 4436(M/S/2003 1247 198
ANNEXURE NO:-(2)
Sewage Treatment plant - - - - - - - Petitioner.
Versus
State of U.P. - - - - - - - - - Opposite Party.

Annexure - 2

दिनांक 18.8.2008 तक की प्रगति

...एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ शहर के विभिन्न पेयजल योजनाओं के विरूद्ध प्रस्तावित 21 नलकूप का विवरण

...प - 21नग नये नलकूप

...उपलब्धि - 3 नग नलकूप

	नलकूपों का नाम स्राव लीटर प्रति मिनट	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जलापूर्ति प्रारम्भ करने की तिथि	जल वृद्धि एम.एल.डी. में	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			सम्भावित	वास्तविक				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	लिवटी कालोनी कुर्मान्चल नगर पेय जल योजना -: 2 नग , जोन-3							
	1.कुर्मान्चल नगर(मानसरोवर)नलकूप-1 1000 ली.प्र.मि.	10.2.08		8.5.08	18.5.08	1.00		
	2.कुर्मान्चल नगर(लिवटी कालोनी) नलकूप-2	17.3.08		22.6.08	17.7.08	1.00		
2	शिवनगर पेयजल योजना :- 4 नलकूप जोन-3							
	3. नलकूप सं.-1 1000 ली.प्र.मि.	10.11.07		8.5.08	28.5.08	1.00		
	4. नलकूप संख्या -2(कुम्हार टोला)	30.5.08		10.8.08			पम्प सेट चालू	राईजिंग मेन जोड़ा जाना है।
	5							
	6.							
3	भारतनगर पेय जल योजना :- 3 नलकूप , जोन-3							
	7 सत्यलोक कालोनी	15.3.08		20.5.08		-	पम्प सेट चालू	तदैव
	8. महाराजा अग्रसेन पार्क	30.4.08		21.6.08		-	तदैव	तदैव
	9. भगत सिंह पार्क	28.4.08		21.6.08			तदैव	तदैव
4	गढ़ी ...रा पुनगर्ठन पेयजल योजना :- 6 नलकूप , जोन-2							
	...टी.सी. , मिल के पास,	30.4.08	15.7.08				लोअरिंग पुर्ण	
	11. नलकूप संख्या-2, तालकटोरा	21.5.08	31.7.08				तदैव	
	12. कर्नलगंज नगर निगम स्टोर	3.8.08	31.9.08				कार्य प्रगति पर	
	13.							
	14.							
	15.							
5	खरिका वार्ड पेयजल योजना :- 6 नलकूप , जोन-4							
	16. नलकूप संख्या-1(लौंगा खेड़ा)	3.5.08	15.7.08				लोअरिंग पूर्ण	
	17. नलकूप संख्या-2(झंडे वाला पार्क)	13.5.08	25.7.08				तदैव	
	18. नलकूप संख्या-3(बलदेव विहार पार्क)	17.5.08	25.7.08				तदैव	
	19. नलकूप संख्या-3(गोप स्कूल के पास)	30.5.08	30.7.08.				तदैव	
	20. नन्द विहार कालोनी पार्क	18.6.08	4.8.08				तदैव	
	21 ...फेन्स कालोनी	18.6.08	30.7.08				तदैव	

सार :

1. कुल प्रस्तावित नलकूपों की संख्या - 21 नग
2. चालू नलकूपों की संख्या - 3 नग , जलवृद्धि 3.00एम.एल.डी.
3. निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या - 13 नग
4. नलकूपों की संख्या जिनके पम्प सेट चालू है राईजिंग मेन जोड़ा जाना है - 4 नग संभावित जलवृद्धि - 4 एम.एल.डी.

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE 199
AT ALLAHABAD LUCKNOW BENCH 1248
LUCKNOW
Writ Petetion No 4436(M/B/2003
ANNEXURE NO:-(3)
Sewage Treatment Plant - - - - - - - Petitioner.
versus
State of U.P. - - - - - - - - - Opposite Party.

Annexure -3

दिनांक 18.8.2008 तक की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम के अन्तर्गत 43 नग री-बोर नलकूपो का निर्माण कार्य-:

लक्ष्य- 43 री-बोर नलकूपों को चालू करने की सम्भावित तिथि 31.12.08

उपलब्धि - 9 नग

क्र. स.	नलकूपों का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (राइजिंग मेन पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जल वृद्धि एम.एल.डी. में	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			वास्तविक	सम्भावित			
1.	2	3	4	5	6	7	
1	डायमंड डेरी, जोन-1	1.3.08	29.4.08		1.00	जलापूर्ति प्रारम्भ	
2.	महानगर सेक्टर-डी, जोन-3	6.4.08	1.5.08		1.00	तदैव	
3	हातीमातादीन, जोन-1	20.3.08	13.5.08		0.60	तदैव	
4	जवाहर भवन, जोन-1	17.4.08	30.5.08		1.00	तदैव	
5	कमला नेपूर पार्क निशात नगर जोन-3	10.5.08	3.6.08		1.00	तदैव	
6	जानकी पुरम, ए-ब्लाक, जोन-3	28.5.08	23.6.08		1.00	तदैव	
7	पेपर मिल कालोनी नलकूप जोन-3	20.5.08	25.6.08		1.00	तदैव	
8	आर्यसमाज मंदिर गणेश गंज जोन-1		12.8.08		1 00	तदैव	
9	पत्रकार पुरम गोमतीनगर जोन-5	5.5.08	13.8.08		1.00	तदैव	
10	ज्ञानेश्वर मंदिर, जोन-3	6.6.08		20.8.08		पम्प लोअर	
11	मुरली नगर , जोन-3	1.6.08		25.8.08		तदैव	
12	कपूरथला, नलकूप जोन-3	28.6.08		20.6.08		ओ.पी. यूनिट से विकास पूर्ण	
13	शिया कालोनी, जोन-3	6.6.08		25.8.08		ओ.पी.यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	
14	डायमंड डेरी, जोन-1	1.6.08		25.8.08		तदैव	
	लालयाग ,जोन-1	30.6.08		20.8.08		तदैव	
16	वायुगंज, जोन-3	24.5.08		30.8.08		तदैव	
17	से.-11 राजाजीपुरम जोन-6	28.6.08		25.8.08		तदैव	
18	आनन्द नगर, जोन-4	28.5.08		10.9.08		तदैव	
19	अलीगंज सं.-6 जोन-3	6.6.08		10.9.08		कम्प्रेसर से प्रगति पर	
20	ओल्ड स्पीकर, जोन-1	15.6.08		5.9.08		लोअरिंग पूर्ण	
21	नैपियर रोड, जोन-6	11.6.08		5.9.08		तदैव	
22	इंदिरानगर स.-54 जोन-5	3.5.08		10.9.08		तदैव	
23	अलीगंज सं.-7 जोन-3	10.6.08		10.9.08		तदैव	
24	समर विहार, जोन-4	28.5.08		10.9.08		तदैव	
25	खिन्नी पार्क, जोन-3	21.6.08		10.9.08		तदैव	
26	कर्बला तालकटोरा रोड, राजीजीपुरम, जोन-6	23.6.08		15.9.08		तदैव	
27	खुशीदयाग, जोन-6	28.6.08		15.9.08		तदैव	
28	विजय खण्ड, जोन-5	3.7.08		20.8.08		तदैव	
29	गाँधीनगर जोन-1	17.6.08		20.8.08		तदैव	
30	कृष्णा नगर, जोन-4	20.7.08		15.9.08		तदैव	
31	डालीगंज नलकूप, जोन-3	24.7.08		30.8.08		तदैव	
32	सेक्टर-14 राजाजीपुरम जोन-6	25.7.08		30.8.08		तदैव	
33	हातारसूल खाँ, जोन-1	22.7.08		30.8.08		तदैव	
34	भवानीगंज, जोन-6	26.7.08		30.8.08		लोअरिंग प्रगति पर	

1249 ~~150~~ 200

10

1.	कुल प्रस्तावित री-बोर नलकूपों की संख्या	- 43 नग
2.	चालू नलकूपों की संख्या	- 9 नग , जलावृत्ति 9.00मी.एल.डी.
3.	निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या	- 27 नग

30/11

परियोजना प्रबन्धक

पेयजल योजना

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 19.07.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम

(रू. लाख में)

क्रमांक	कार्य का विवरण	प्रस्तावित कार्य की मात्रा	दि 19.07.2008 तक की प्रगति	दिनांक 18.08.08 तक कुल प्रगति	दिनांक 19.07.08 के उपरान्त प्रगति
1.	नये नलकूप (समस्याग्रस्त क्षेत्रों में)	40 नग	22 नग चालू 18 नग प्रगति पर	25 नग चालू 15 नग प्रगति पर	3 नग चालू, कुल 15 नग पर कार्य प्रगति पर
	नये नलकूप (विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत)	21 नग	3 नग चालू 12 नग प्रगति पर	3 नग चालू 13 नग प्रगति पर	1 नग पर कार्य प्रारम्भ, कुल 13 नग पर कार्य प्रगति पर।
2.	रिबोर नलकूप	43 नग	7 नग चालू 22 नग प्रगति पर	8 नग चालू 28 नग प्रगति पर	1 नग चालू, 6 नग पर कार्य प्रारम्भ। कुल 28 नग पर कार्य प्रगति पर।
3.	वितरण प्रणाली	133.31 कि.मी.	17.00 कि.मी.	26.00 कि.मी.	9.00 कि.मी. का कार्य पूर्ण।
4.	राइजिंग मेन	14.40 कि.मी.	22 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू 8 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर	28 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू 11 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर	6 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू, 3 नग नलकूप की राइजिंग मेन का कार्य प्रारम्भ एवं कुल 11 नग नलकूपों की राइजिंग मेन कार्य प्रगति पर।

योजना पर अवमुक्त धनराशि : रू. 40.00 करोड़
योजना पर अब तक व्यय : रू. 40.00 करोड

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

19/8/08
महाप्रबन्धक(पेयजल)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, पेयजल(द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

1251 ~~1160~~ 202

12

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में चालू किये गये नलकूपों की सूची

40 नग नये नलकूपों के अन्तर्गत

क्र0 सं0	नलकूपों का नाम एवं स्थल
1	2
1	अलीगंज सेक्टर-एच
2	इन्दिरानगर डी-ब्लॉक
3	विजयखण्ड, गोमतीनगर
4	अलीगंज सेक्टर-डी
5	गुलिस्ता कॉलोनी
6	अहिबरनपुर सीतापुर रोड
7	त्रिवेणी नगर
8	विकासनगर सेक्टर-9
9	सहयोग पार्क, महानगर
10	जानकीपुरम् सेक्टर-एच
11	हिन्द नगर नलकूप, जोन-4
12	तातारपुर सेक्टर-ई, अलीगंज
13	मेंहदीटोला, विष्णुपुरी कॉलोनी
14	शिवपुरी पार्क, गणेशगंज
15	कानपुर रोड योजना, सेक्टर-जे, रेलनगर
16	विनीत खण्ड, गोमती नगर
17	साउथ सिटी, सेक्टर-सी-1
18	दामोदरनगर, आलमबाग
19	इन्दिरानगर बी-ब्लॉक
20	मेवा नर्सरी, निशातगंज
21	पंचवटी कॉलोनी, रहीमनगर
22	साउथ सिटी, रश्मि खण्ड
23	विवेक खण्ड-4, गोमतीनगर
24	सेक्टर-आई, एल.डी.ए. कॉलोनी
25	अशोकनगर राजाजीपुरम्

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत प्राक्कलन में सम्मिलित पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत

26	शिवनगर सदर जलकल परिसर
27	मानस विहार कॉलोनी, सर्वोदयनगर
28	लिवटी पार्क, सर्वोदयनगर

नगरीय पेयजल योजना सामान्य के अन्तर्गत स्वीकृत नलकूप

29	विनयखण्ड, गोमतीनगर
30	फैजुल्लागंज
31	राजाजीपुरम् बी-ब्लॉक, रानी लक्ष्मीबाई पार्क

परियोजना प्रबन्धक

Progress 40 No TWS (JNNURM 3 08 08)

COMMISSIONER FOR OTH... BAD...

1252 ~~1161~~ 203

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, गो0प्र0नि0ई0-।।।(वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ 13

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 43 नग रिबोर नलकूपों का कार्य

1	डायमण्ड डेरी कॉलोनी
2	महानगर सेक्टर-डी।
3	हाता मातादीन
4	जवाहरभवन
5	कमलाकपूर पार्क निरालानगर
6	जानकीपुरम् ए-ब्लॉक
7	पेपरमिल कॉलोनी।
8	आर्य समाज मन्दिर गणेशगंज

परियोजना प्रबन्धक

Progress 40 No. TWs (JNNURM 18 Cr Dn)

1253 ~~112~~ 16 204

लखनऊ नगर में जल संस्थान के विभिन्न जोनों में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

दिनांक 18.08.08 तक

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
1.	जोन-1, लालबाग	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	2 नग चालू, 1 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	3 नग चालू, 6 नग प्रगति पर।
2.	जोन-2, ऐशबाग	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	5 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	-
3.	जोन-3, अलीगंज	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	10 नग चालू, 5 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	4 नग चालू, 8 नग प्रगति पर।
4.	जोन-4, आलमबाग	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	6 नग चालू, 9 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	4 नग प्रगति पर.
5.	जोन-5, इन्दिरानगर	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	9 नग चालू, 4 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	1 नग चालू, 4 नग प्रगति पर।
6.	जोन-6, राजाजीपुरम	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	1 नग पूर्ण, 4 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	6 नग प्रगति पर।
	योग	**नया नलकूप**	**28 नग चालू, 28 नग प्रगति पर**
		रीबोर नलकूप	**8 नग चालू, 28 नग प्रगति पर**

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)

18/8/08
महाप्रबन्धक(पेयजल)

पेयजल योजना

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 19.07.08 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

सामान्य कार्यक्रम

(रू0 लाख में)

क	कार्य का विवरण	प्रस्तावित कार्य की मात्रा	दिनांक 19.07.08 तक कुल प्रगति		दिनांक 18.08.08 तक कुल प्रगति		दिनांक 19.07.08 से 18.08.08 तक कुल प्रगति	
	नये हैण्डपम्प	409 नग	409 नग	286.80	409 नग	286.80	-	-
	विशेष मरम्मत/रिबांर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प	670 नग	670 नग		670 नग		-	
	नये नलकूप	5 नग	3 नग चालू	125.00	3 नग चालू तथा 1 नग प्रगति पर।	140.00	1 नग नलकूप प्रगति पर।	15.00
	रिबांर नलकूप	39 नग	39 नग चालू	690.00	39 नग चालू	690.00	-	-
	योग			1101.80		1116.80	1 नग नलकूप प्रगति पर।	15.00

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)

महाप्रबन्धक(पेयजल)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW BENCH
LUCKNOW
Writ Petition No 4436(M/B/2003
Sewage Treatment Plant - - - - - - - - Petitioner.
Versus
State of U.P. - - - - - - - - - - Opposite Party.

Annexure - 4

ANNEXURE NO:(4)

1254

1255 ~~1104~~ 16 206

लखनऊ नगर में जल संस्थान के विभिन्न जोनों में नगरीय पेयजल (सामान्य) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

दिनांक 18.08.08 तक

दिनांक 01.04.06 से कराये गये कार्य

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
1.	जोन-1, लालबाग	नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	4 नग पूर्ण एवं चालू।
		मिनी नलकूप	2 नग पूर्ण एवं चालू।
2.	जोन-2, ऐशबाग	नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	2 नग पूर्ण एवं चालू।
		मिनी नलकूप	1 नग पूर्ण एवं चालू।
3.	जोन-3, अलीगंज	फैजुल्लागंज पेयजल योजना	
		नया नलकूप	1 नग पूर्ण एवं चालू।
		स्टाफ क्वार्टर	95 प्रतिशत पूर्ण
		नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	12 नग पूर्ण एवं चालू।
4.	जोन 4, आलमबाग	नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	7 नग पूर्ण एवं चालू।
5.	जोन-5, इन्दिरानगर	विनयखण्ड, गोमती नगर में एक नये एवं एक रीबोर नलकूप का कार्य	
		नया नलकूप	1 नग पूर्ण एवं चालू।
		रीबोर नलकूप	1 नग पूर्ण एवं चालू।
6.	जोन-6, राजाजीपुरम्	'बी' ब्लॉक रानीलक्ष्मीबाई पार्क में नलकूप का निर्माण	1 नग पूर्ण एवं चालू।
		राजाजीपुरम् 'ई' एवं 'एफ' ब्लॉक पेयजल योजना	
		नया नलकूप	1 नग प्रगति पर।
		वितरण प्रणाली	1.00 कि.मी.
		नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	9 नग पूर्ण एवं चालू।
		नया नलकूप	3 नग चालू, 1 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	33 नग पूर्ण एवं चालू
		मिनी नलकूप	3 नग पूर्ण एवं चालू
		नया हैण्डपम्प	409 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत हैण्डपम्प	670 नग

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)

महाप्रबन्धक(पेयजल)

1256 ~~115~~ 207

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
IN RE:
WRIT PETITION 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant --------- Petitioner

VERSUS

State of U.P. and others --- Opposite Parties

Affidavit on behalf of Nagar Nigam, Lucknow Compliance of the order dated 21.07.2008 passed by this Hon'ble Court

I, Shailesh Kumar Singh, aged about 52 years, S/o Late Subedar Singh presently working as Nagar Ayukt, Nagar Nigam, Lucknow; the deponent do hereby solemnly affirms and state on oath as under:-

1. That the deponent is impleaded in the aforesaid writ petition as opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed hereinafter.

2. That this writ petition was last listed on 21.07.2008 whereby this Hon'ble Court pleased to pass the following order:-

1257 #66

208

"In terms of the observations made in the report, it is directed that the State its authorities, Nagar Nigam and all concerned authorities shall see and take necessary steps and issue directions that no municipal solid waste should be allowed to be dumped, either intentionally or unintentionally on the river side any further.

Since the report also says that construction of sanitary land fill in the city of Lucknow as one of the means for saving the river water and ground water free from pollution and contamination, the State shall also consider the said aspect.

The second option given by the State Government shall also be considered. The State Shall come with specific plan, so that the problems, as mentioned in the report may be rectified and appropriate steps be taken which is essential for not only saving the environment but also the people living in the city of Lucknow and around it, who are directly affected by contamination in water.

In the mean time, the respondents must give a complete report regarding the projects proposed to be undertaken, funds, released and utilized and the work done.:

3. That in compliance of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 21.07.2008 the present affidavit is being filed mentioning therein the steps taken at the

end of Nagar Nigam, Lucknow in compliance of the same.

4. That in compliance of the said order the Nagar Nigam Lucknow has already taken relevant steps thereby directing the concerned departments not to dump the municipal solid waste on the river side in question.

5. That further the Nagar Nigam, Lucknow issued a letter dated 14.08.2008 addressed to Chief Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow requesting them for their cooperation for implementing the project for disposal of garbage dumped near river side, in the light of detailed report dated 17.07.2008 submitted by NEERI. The said project is based on recommendation Point No. 5 of report option 2. Subsequently a reminder by means of letter dated 20.08.2008 was also forwarded to Uttar Pradesh Pollution Control Board with regard to disposal of garbage near river side, in the light of directions issued by this Hon'ble .Court in the said petition. The said letters were addressed to the U.P. Pollution Control Board for seeking their special comments with regard to the implementation of the said project. The photocopies of said letters dated 14.08.2008 and 20.08.2008 and report of NEERI dated 17.07.2008 are annexed as **Annexure No. 1, 2 & 3** respectively to this affidavit.

1259 ~~1168~~

210

6. That the above mentioned project proposed for construction of a park at Jiyamau Lucknow by Nagar Nigam Lucknow involved following works to be done in the light of report submitted by NEERI mentioned at point No. 5 option 2 from page 6 onward, which is as following:

i) Construction of park and land scaping which would include following works;

a. Horticulture and land land scape

b. Construction of park

c. Construction of gate pillar

d. Construction of boundary wall

e. Construction of parking area

f. Construction of toilet, guard cabin, electrical room which would include earth work, concrete work, brick work, plastering work, flooring work, and painting work

g. Electrical work.

The above mentioned work is being covered in compliance of points laid down (1 to 5 and 7) under the head of point 5 option 2 of the said report of NEERI which involved a total expenditure of Rs. 14437879.00 (Rs. One Crore forty four lakhs thirty seven thousand eight hundred and seventy nine only) under the head of construction of park and land scaping.

Secondly for construction of retaining wall at the above mentioned site in question which is in compliance

of point 5 option 2 (sub point 6) of NEERI's report for which a total expenditure of Rs. 91619647.00 (Rs Nine Crore Sixteen Lakhs Nineteen Thousand Six Hundred Forty Seven Only) is to be incurred. The above mentioned project will be executed after consultation and necessary direction to be sought from appropriate agency. The detailed estimate of the above mentioned project to be undertaken by Nagar Nigam, Lucknow along with abstract of cost, map/drawings are cumulatively annexed herewith as **Annexure 4** to this affidavit.

7. That thereafter, the U.P. Pollution Control Board vide its letter dated 22.08.2008 addressed to Nagar Nigam enclosing therewith the report of Technical Committee of U.P. Pollution Control Board providing their special comments with regard to implementation of project to be executed by Nagar Nigam, Lucknow. It is further submitted that the special comments of the Technical Committee of U.P. Pollution Control Board is being studied by the concerned officers of the Nagar Nigam for its proper implementation and execution in the light of report submitted by NEERI and the directions passed by this Hon'ble Court in the said petition. A photocopy of letter dated 22.08.2008 along with special comments of Technical Committee of U.P. Pollution Control Board is being filed herewith as **Annexure No. 5** to this affidavit.

8. That further it is pertinent to mention over here that for acquisition of land near Gandhi Setu where garbage has been dumped, necessary directions have been issued by the State Government for acquiring the above land in question on top priority and further to ensure that the same be completed by 20.08.2008 for which necessary directions have been issued to the concerned department for needful at its end.

9. That for implementation of the said project, the land in question has to be acquired by the Lucknow Development Authority and Lucknow Development Authority is taking all relevant steps for acquiring the said land.

10. That it is pertinent to mention over here that in the minutes of meeting held on 30.07.2008 by the State Government it was decided that for setting up Solid Waste Management following land is to be acquired by the Lucknow Development Authority i.e. 40.19 Hectare at Hardoi Road and 38.77 Hectare at Deva Road. The above mentioned abstract of minute of meeting dated 30.07.2008 is being annexed herewith as **Annexure No. 6** to this affidavit.

11. That further it is relevant to mention over here that so far as cleaning of River Gomti is concerned it is submitted that the land for construction of 345 MLD

STP has been acquired by the Nagar Nigam, Lucknow on 16.07.2008 and the same has been handed over to the Jal Nigam, Lucknow which has started the work on the same.

12. That till date the Nagar Nigam, Lucknow had released and forwarded Rs. 60 Crores under the Head of Water Supply to U.P. Jal Nigam out of which Rs. 40 Crore have been utilized till date. Further, Rs. 30 Crore have ~~relapsed~~ been released and forwarded by Nagar Nigam Lucknow to the U.P. Jal Nigam under the Head of Sewage which has been completely utilized. Moreover, for Solid Waste till date Rs. 3,48,00,000.00 (Rs. Three Croce Forty Eight Lakhs only) have been released by the Nagar Nigam Lucknow.

13. That from the narration made hereinabove it is establish that the Lucknow Nagar Nigam has taken all relevant steps in compliance of the order dated 21.07.2008 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will carry out every direction issued to him by this Hon'ble Court time to time.

Lucknow
Dated: 25.08.2008

Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of paragraph 1 to 10 of the affidavit are true to the

8- 1263 214

best of our personal knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed by me.

So help me God

Lucknow
Dated 25.08.2018

Deponent

I, identify the deponent ~~who has~~ signed before me

Advocate

Solemnly affirmed before me on 25/8/18 at 2-00 A.M./P.M by the deponent who is identified by Shri. Namit Sharma, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him by me.

Shailendra Kumar.
Advocate Oath Commissioner
Honble High Court, Allahabad
Date 25/8/18 Comon No 223531

9- 1267 (M)B

215

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2008 (M/B)
Sewage Treatment Plant VERSUS State of U.P.
ANNEXURE NO 1

DFA

नगर निगम लखनऊ

प्रेषक, अपर नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ। संख्याः- D-372/AMCA/08 दिनांकः- 14.08.2008	सेवा में, मुख्य अभियन्ता उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण भवन गोमती नगर लखनऊ। नत्थी – 2 पृष्ठ –>

–: विषय :–

गोमती सेतु के समीप डाले गये कूड़े के निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मेरी आपसे दूरभाष पर हुई वार्ता दिनांक 13.08.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। गोमती सेतु के समीप डाले गये कूड़े के निस्तारण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा निर्देश दिये गये गये थे कि 'नीरी' (NERRI) द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर कार्ययोजना तैयार कर इस क्षेत्र की विशेषज्ञ एजेन्सी के परामर्श के साथ दिनांक 20.08.2008 तक प्रस्तुत किया जाए। नगर निगम लखनऊ द्वारा 'नीरी' की अनुशंसा दिनांक 17.06.2008 के पैरा– 5 के विकल्प– 2 के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे संलग्न कर आपकी विशेषज्ञ टिप्पणी हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है। कृपया समयान्तर्गत अपनी टिप्पणी नगर निगम को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ–पत्र समय के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय

14/8

(ए.सी. सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

8/c

550

1265 10 ~~477~~ 216

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2008 (M/B)
Sewage Treatment Plant VERSUS State of U.P.
ANNEXURE NO 2

नगर निगम लखनऊ

प्रेषक, अपर नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ। संख्याः- D-389/AMC/08 दिनांकः- 20.08.08	सेवा में, मुख्य अभियन्ता उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण भवन गोमती नगर लखनऊ। नत्थी

–: विषय :–

गोमती सेतु के समीप डाले गये कूड़े के निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो के संबंध मे।

महोदय,

कृपया पूर्व पत्र संख्या डी–372/एएमसी–ए/08 दिनांक 14.08.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। रिट याचिका संख्या 4436(एम.बी.)/2003 एवं याचिका संख्या 6748(एम.बी./2008 पी.आई.एल. बनवारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.2008 ,की तिथि सुनवाई हेतु नियत की गयी है। इसी संदर्भ में रिट याचिका संख्या 4436(एम. बी.)/2003 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में 'नीरी' द्वारा अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट दिनांक 17.07.2008 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें गॉधी सेतु के समीप पड़े कूड़े के निस्तारण के संबंध में अपनी आख्या के बिन्दु संख्या– 5 पर दी गयी अनुशंसा मे 2 विकल्प दिये गये थे जिसके विकल्प संख्या– '2 के आधार पर कार्यवाही करते हुए तैयार किए गये प्लान की प्रति संलग्न करते हुए नीरी की संस्तुति के क्रम में आपसे विशेषज्ञ राय प्राप्त किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था परन्तु अभी तक इसका कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है जबकि नियंत तिथि दि. 25.08.2008 से पूर्व प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने में 2 दिन अवशेष रह गये है।

अतः आपकी विशेषज्ञ टिप्पणी से तत्काल नगर निगम को अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय

(ए.सी. सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ को सूचनार्थ।
3. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ।

(ए.सी. सिन्हा)

1267

1178

12-

218

Report on Environmental Issues Associated with MSW Dumping on the Gomati River Bed near Gandhi Setu, Lucknow

(Reference: Writ Petition No. 4436 (MB) of 2003)

1. Preamble

Gomati river, a tributary of river Ganga, originates near Pilibhit in Uttar Pradesh (U.P.) and, on its course, flows by many towns in U.P. of which Lucknow is the largest town and the capital city of U.P. Gomati river is the single largest source of domestic water supply, including drinking water, for the city of Lucknow, apart from its cultural importance. However, Gomati river also receives huge amount of treated and untreated wastewater, which result in the pollution of the river. The **Writ Petition No. 4436 (MB) of 2003** pertains to the sewage treatment and the abatement of the water pollution for cleaning the Gomati river. In addition, through this Writ Petition it was brought to the notice of Lucknow Bench of the Hon'ble Allahabad High Court that Municipal Solid Waste (MSW) was being dumped on the banks of Gomati river, specifically near Gandhi Setu, by Lucknow Municipal Corporation (LMC), which might lead to the contamination of Gomati river.

In this context, Lucknow Bench of the Hon'ble Allahabad High Court directed National Environmental, Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur to inspect the situation and submit a report in consultation with Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB). Accordingly, a team of scientists from NEERI, namely Dr. T. Nandy, Dr. A.N. Vaidya, Mr. J.K. Bhattacharyya, and Dr. S.Y. Bodkhe visited Lucknow on June 8 and 9, 2008, for site inspection and to get the relevant information from concerned Governmental and regulatory agencies. The officials who accompanied the team of NEERI Scientists during the site inspection were Mr. S.K. Tandon, Regional Officer (RO), Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Mr. A.C. Sinha, Additional Municipal Commissioner, LMC, Mr. Anil Kumar, Deputy Municipal Commissioner, LMC, Mr. B.W. Mishra, Chief Engineer, LMC and Mr. S.K. Jain, Executive Engineer, LMC.

13.

This report details the status of MSW dumping on the banks of Gomati river, possibility of contamination of the river due to MSW dumping, and the necessary measures to be taken to minimize the pollution of Gomati river due to MSW dumping, a step towards cleaning of the river. This report is based on the site inspection and the data collected from concerned State Government and regulatory agencies and it is being submitted to Lucknow Bench of Hon'ble Allahabad High Court as per the directive.

2. Existing Scenario

- Lucknow city has a population of around 25 lakh and the estimated quantity of MSW generation is around 1200 tons per day (TPD). There are around 303 open dumps, 58 dhalaos and 39 big and small dumps spread all over the city. There is no sanitary landfill developed for the management of MSW as per MSW Rules 2000 stipulated by The Ministry of Environment and Forests (MoEF). However LMC is proposing to develop sanitary landfill under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM). (As per information collected from LMC).

- The specific municipal solid waste dump site as referred in the petition is situated on the west bank of the Gomati River near Gandhi Setu. The site is adjacent to the main road and small road to Jiamau. It occupies the area on the river bed inside the embankment of the river. Barrage on the Gomati river is situated on the upstream side of the site. The exact location of the site is shown in the map attached as **Figure 1**. LMC had been dumping MSW at this site since June 13, 2007 till March, 27, 2008. The dumping was stopped after March 27, 2008 as per the order of Hon'ble High Court. During this period, about 5287 cubic meters of MSW were dumped at this particular site. LMC is planning to cap the site and develop a garden over the site (as per information collected from LMC).

- Apart from MSW, about 345 mld of sewage is generated in the area in and around Lucknow and discharged into the Gomati river through 26 no. of nullahs. About 42 mld of sewage is subjected to the treatment and remaining quantum is discharged without any treatment. Uttar Pradesh Jal Nigam (UPJN) is planning to set up a 345 mld Sewage Treatment Plant (STP) at Bharwara towards the eastern end of the city. (As per information collected from UPJN).

3. Inspection and Observations

The team of NEERI scientists along with officials from LMC and UPPCB inspected the site and other impacted areas. The relevant photographs and water samples were collected during this inspection. The matter was discussed with the officers from LMC, UPPCB, and UPJN. The salient observations are mentioned hereunder.

- Huge quantity of MSW was dumped at the site near Gandhi Setu. The Dump height was approximately 5 meters. The area occupied by the dump as reported by LMC, was approximately 2500 sq. meters [(50 x 50) meters]. The photographs of dumpsite from different directions are attached as **Figures 2-5**.
- The dumpsite is very close to the river and inside the embankment and falls in the flood prone area. A photograph showing proximity of the river and stagnated water pools is attached as **Figure 6**.
- The dumpsite is also at the proximity of the monuments being developed on the banks of Gomati river. A photograph is attached as **Figure 7**.
- A pool of MSW leachate was observed at the base of dumpsite, which was formed by the runoff rain water. The colour of the leachate was dark and it had bad odour. A sample of leachate was collected and analyzed for relevant parameters. Photograph showing the pool of leachate and the leachate sample collected are attached as **Figures 8 and 9**.

1270
15.
~~1178~~ 1179
221

- Small surface water streams from the leachate pool were observed to be approaching the river **(Figure 10)**.
- Apart from this site, MSW was dumped at many places in a non scientific way. The photograph of open dumpsite on Hardoi road is attached as **Figure 11.** These sites also have water bodies in the vicinity.

4. Possible Impacts due to Uncontrolled Land filling Practices Near the River Bed

Uncontrolled disposal of MSW on river bed may lead to the following environmental problems:

- **Contamination of river water by leachate and surface run off from MSW**
  Rain water falling over the dump dissolves organic and inorganic pollutants present in MSW and generates a highly polluted stream of water commonly referred as leachate, characterized by high Chemical / Biochemical Oxygen Demand (COD /BOD) and high metal content. Leachate may find access to river by percolation through soil strata or by surface streams leading to river water pollution.

- **Contamination of ground water of localities nearby the MSW dump**
  Leachate may migrate downwards or laterally by diffusion through the soil strata to the adjacent areas and may contaminate ground water in the localities nearby the MSW dump.

- **Deterioration in air quality due to suspended particulate matter(SPM) released from the MSW dump**
  Dumping of MSW releases large quantities of SPM leading to the deterioration of ambient air quality nearby the MSW dump.

- **Deterioration of aesthetic value of the area due to ugly site and odour problem**
  The organic matter in the MSW undergoes biodegradation leading to odour problems in the area. In addition, it leads to the breeding of mosquitoes and flies deteriorating the aesthetic value of the area.

Anwesha
Capacity

598

Chemical analysis of leachate showed high COD values in the range of 8000 to 12000 mg/lit. indicating its pollution potential. Standards for the discharge of waste water into the river require COD to be less than 250 mg/lit and BOD to be less than 30 mg/lit. As the site is close to the river and it is in flood prone area, there is a possibility of contamination of river water due to leachate and surface run off specially in the rainy season. This applies to any uncontrolled dumping nearby river.

5. Recommendations

Based on the inspection and the information collected, following steps are recommended.

i. Immediate abandoning of the MSW dumping along the riverside

The concerned authorities should immediately abandon the practice of dumping MSW along the Gomati river side. This applies to the particular site referred in the petition as well as to any other site close to the river bed whether such dumping is practised intentionally or unintentionally. This is necessary for the protection of ground water and river water from environmental pollution.

ii. Protection of the Gomati river from the possible pollution due to the MSW dumped at the site near the Gandhi Setu.

Two options are delineated for the protection of the Gomati river from possible pollution due to MSW dumping at the above mentioned site.

Option 1: Removal of the Garbage (MSW) from the referred site

The garbage should be mechanically removed from the dumpsite and transferred to the sanitary landfill developed in accordance with the Guidelines of MSW Rules 2000 of MoEF, wherein due precautions are taken for the prevention of leachate percolation in the ground as also for leachate collection and treatment and landfill gas collection. **However, scientifically designed sanitary land fill is not available in Lucknow and dumping of the removed garbage at some**

Amardeep Kapadia

other improper location will lead to the same problems as in case of the referred dumpsite. Therefore construction of a sanitary landfill in the city of Lucknow is mandatory pre-requise for this option.

Option 2: Confinement of the possible pollution from the referred MSW dumpsite

Another option is the confinement of the possible pollution by already dumped MSW so as to protect Gomati river from environmental pollution. The process involves application of final cover over the top of the dumpsite and sides of the dumped waste. The final cover should meet the specifications delineated in the MSW Rules 2000 of MoEF, which are broadly as follows.

- A soil layer comprising of 60 cms clay or clayey soil of permeability not more than 1×10^{-7} cm/sec.
- A HDPE cover of thickness 1.5 mm
- A drainage layer of thickness 15 cms
- A vegetative soil layer of 45 cms for supporting plantation and plant growth
- Plantation of appropriate species
- Boreholes should be constructed around the site to draw ground water for monitoring.
- The slope of the final cover should not be directed towards the river. A peripheral drain can be provided around the closed site.

In both the options, a retaining wall must be constructed near the dump to act as barrier between the leachate & contaminated ground water, and the river water. This should be done in consultation with appropriate regulatory

agencies, experts in the field, and considering hydrogeological properties of the area.

iii. Development of Sanitary Land fill for Lucknow as per the MSW rules 2000 of MoEF.

The concerned authorities should pursue the development of sanitary landfill to cater the need of MSW management of Lucknow city. As per the information received from the LMC, the procedure has been initiated under JNNURM. However, sanitary landfill construction needs to be taken on priority by all concerned authorities to avoid future problems of similar kind.

iv. Treatment of Sewage

It is desirable that entire quantity of sewage generated in the city should be treated and reused for suitable purpose, rather than discharging into the river. However, this warrants detailed scientific study. In any case untreated sewage not conforming to the discharge standards stipulated by the UPPCB should not be discharged into river. UPJN has already proposed a 345 mld sewage treatment plant at Bharwara and expansion of the existing 42 mld STP to 56 mld at Daulatganj and it is recommended that it should be constructed on priority basis.

v. Monitoring of the Water Quality of Gomati River Upstream and Downstream of the Dump Site

The UPPCB is monitoring river water quality regularly for the parameters such as dissolved oxygen, pH, total coliforms. However, monitoring should be more frequent and in details, especially with respect to heavy metals, COD and BOD.

vi. Study for Cleaning of Gomati River

A comprehensive scientific study should be immediately undertaken by the concerned authorities for studying the cleaning of Gomati river covering all environmental aspects.

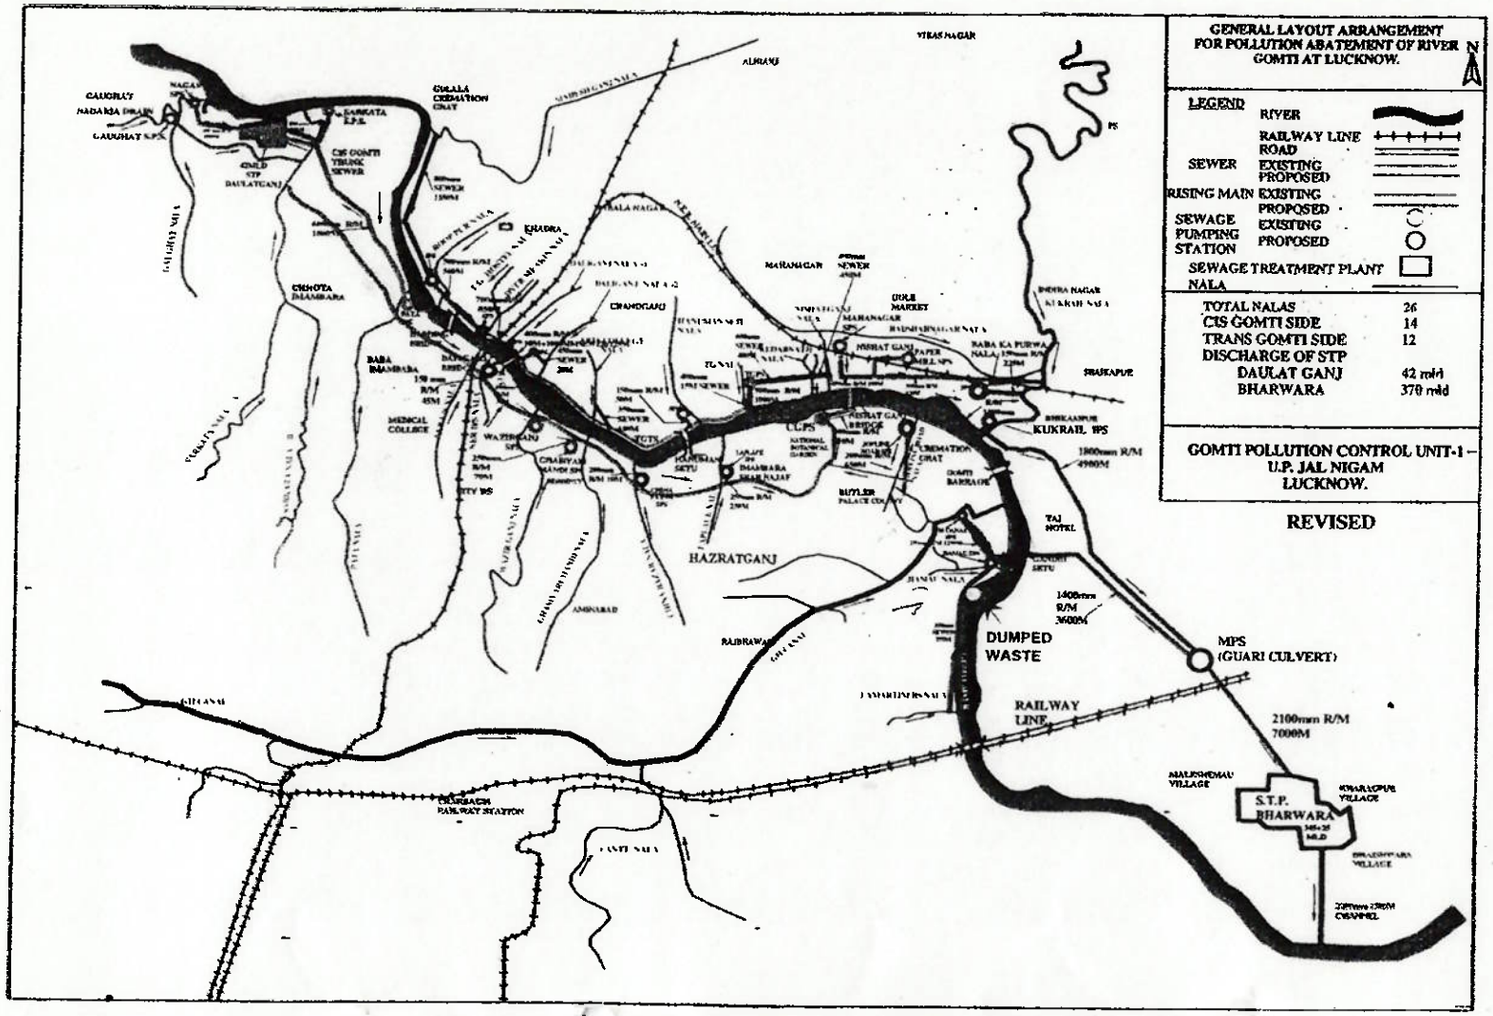

Figure. 1: Location of the Problematic Dump Site on River Gomati

Figure 2: Dumped MSW (from Top)

Figure 3: Dumped MSW (from South Direction)

Aswaidya

Gopakumar

COMMISSIONER FOR OATHS

Figure 4: Dumped MSW (from Top West Direction)

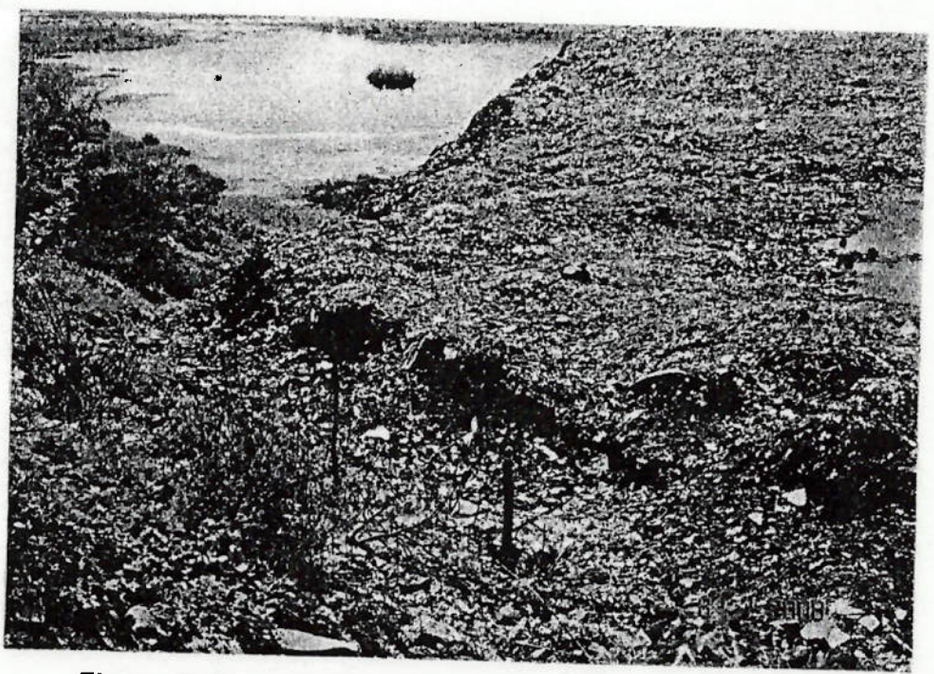

Figure 5: Dumped MSW (from Top North Direction)

A Vaidya

Kapadia

COMMISSIONER SUB CATCHMENT AHMEDABAD
558

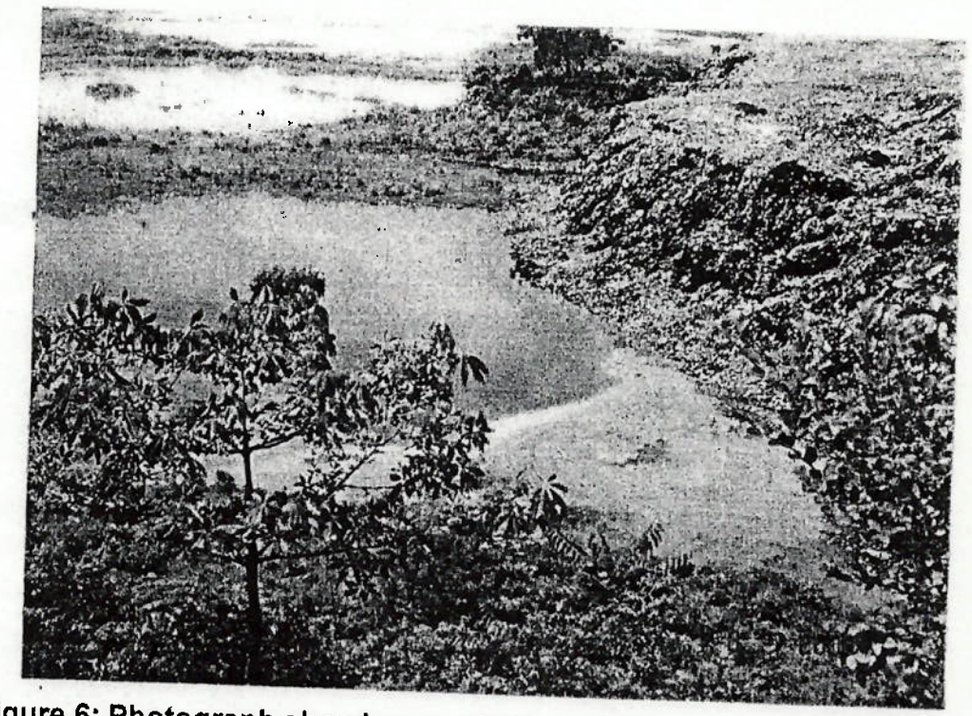

Figure 6: Photograph showing proximity of MSW dump to the stagnated water pools near the river

Figure 7: Photograph showing proximity of MSW dump to the Monuments

COMMISSIONER FOR OATHS
BADDI
2578

1278

~~1186~~ (1187) 229

23.

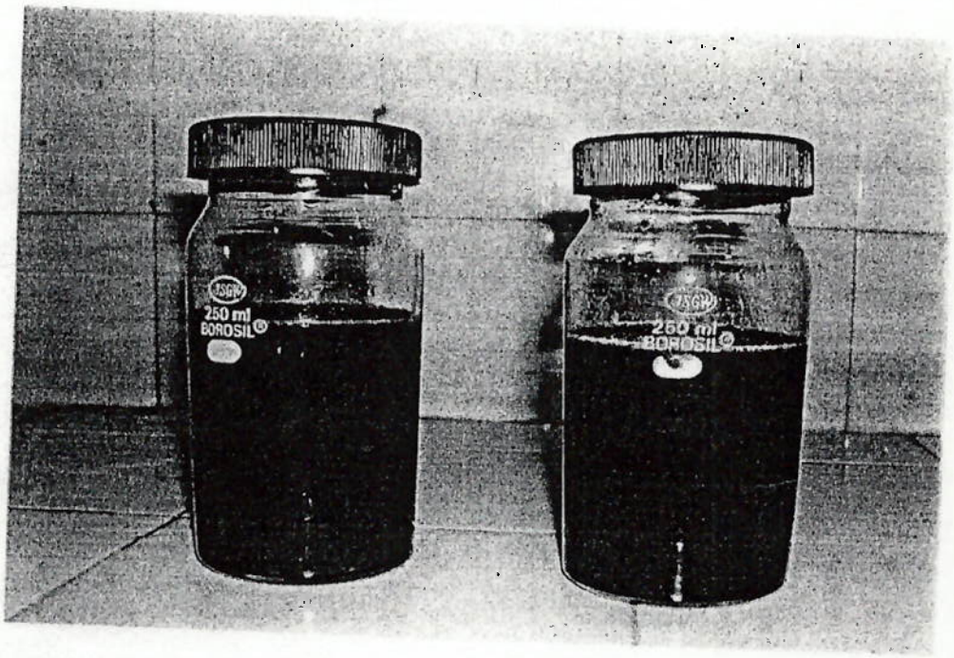

Figure 8: Photograph of leachate sample collected from the site

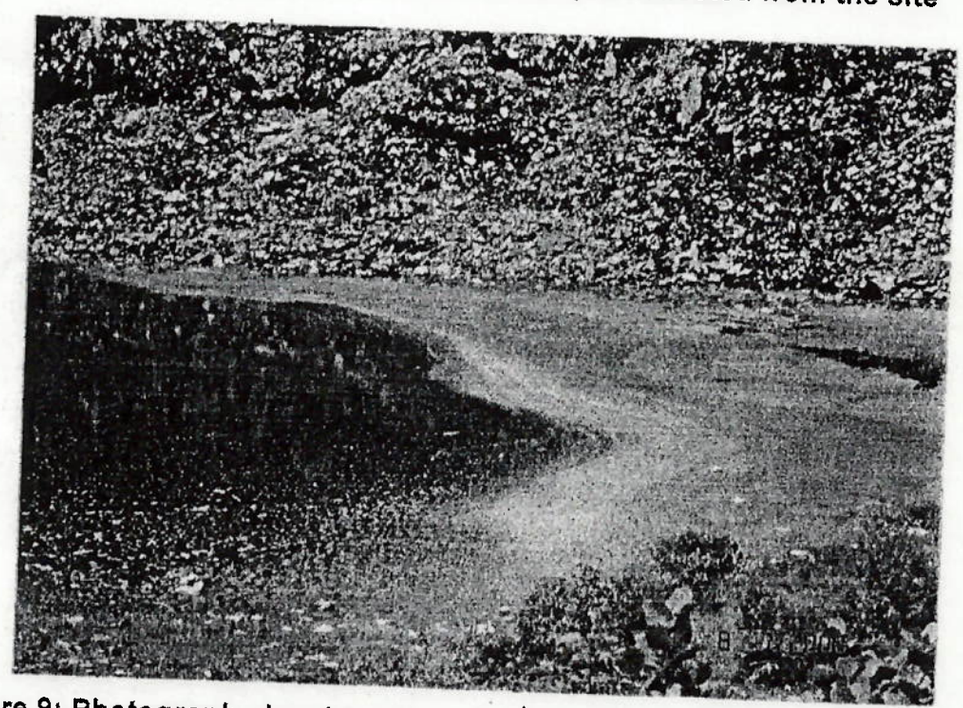

Figure 9: Photograph showing stagnated pool of leachate near MSW dump

A Waidya

Gopaswamy

COMMISSIONER FOR OATHS
HIGH COURT OF KARNATAKA
BANGALORE

1279 ~~1188~~ 230

24

Figure 10: Photograph of surface water streams from MSW dump to Gomati River

Figure 11: Photograph of open MSW dump site on Hardoi Road, Lucknow

1280 231

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2008 (m/B)
Sewage Treatment Plant VERSUS State of U.P.
ANNEXURE NO 4

25- 189 1188

NAME OF PROJECT : PROPOSED PARK AT JIAMAU , LUCKNOW		
NAME OF CLINET : LUCKNOW NAGAR NIGAM		
	SUMMARY	
S.NO	DESCRIPTION	AMOUNT
1	CONSTRUCTION OF PARK & LAND SCAPING	14437879.00
2	CONSTRUCTION OF RETAINING WALL	91619647.00
	GRAND TOTAL	106057526.00
RS. TEN CRORE SIXTY LACKS FIFTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDREAD TWENTY SIX ONLY.		

dl

M/c
20/8/08
E.E.

21
29.8
C.E.

578

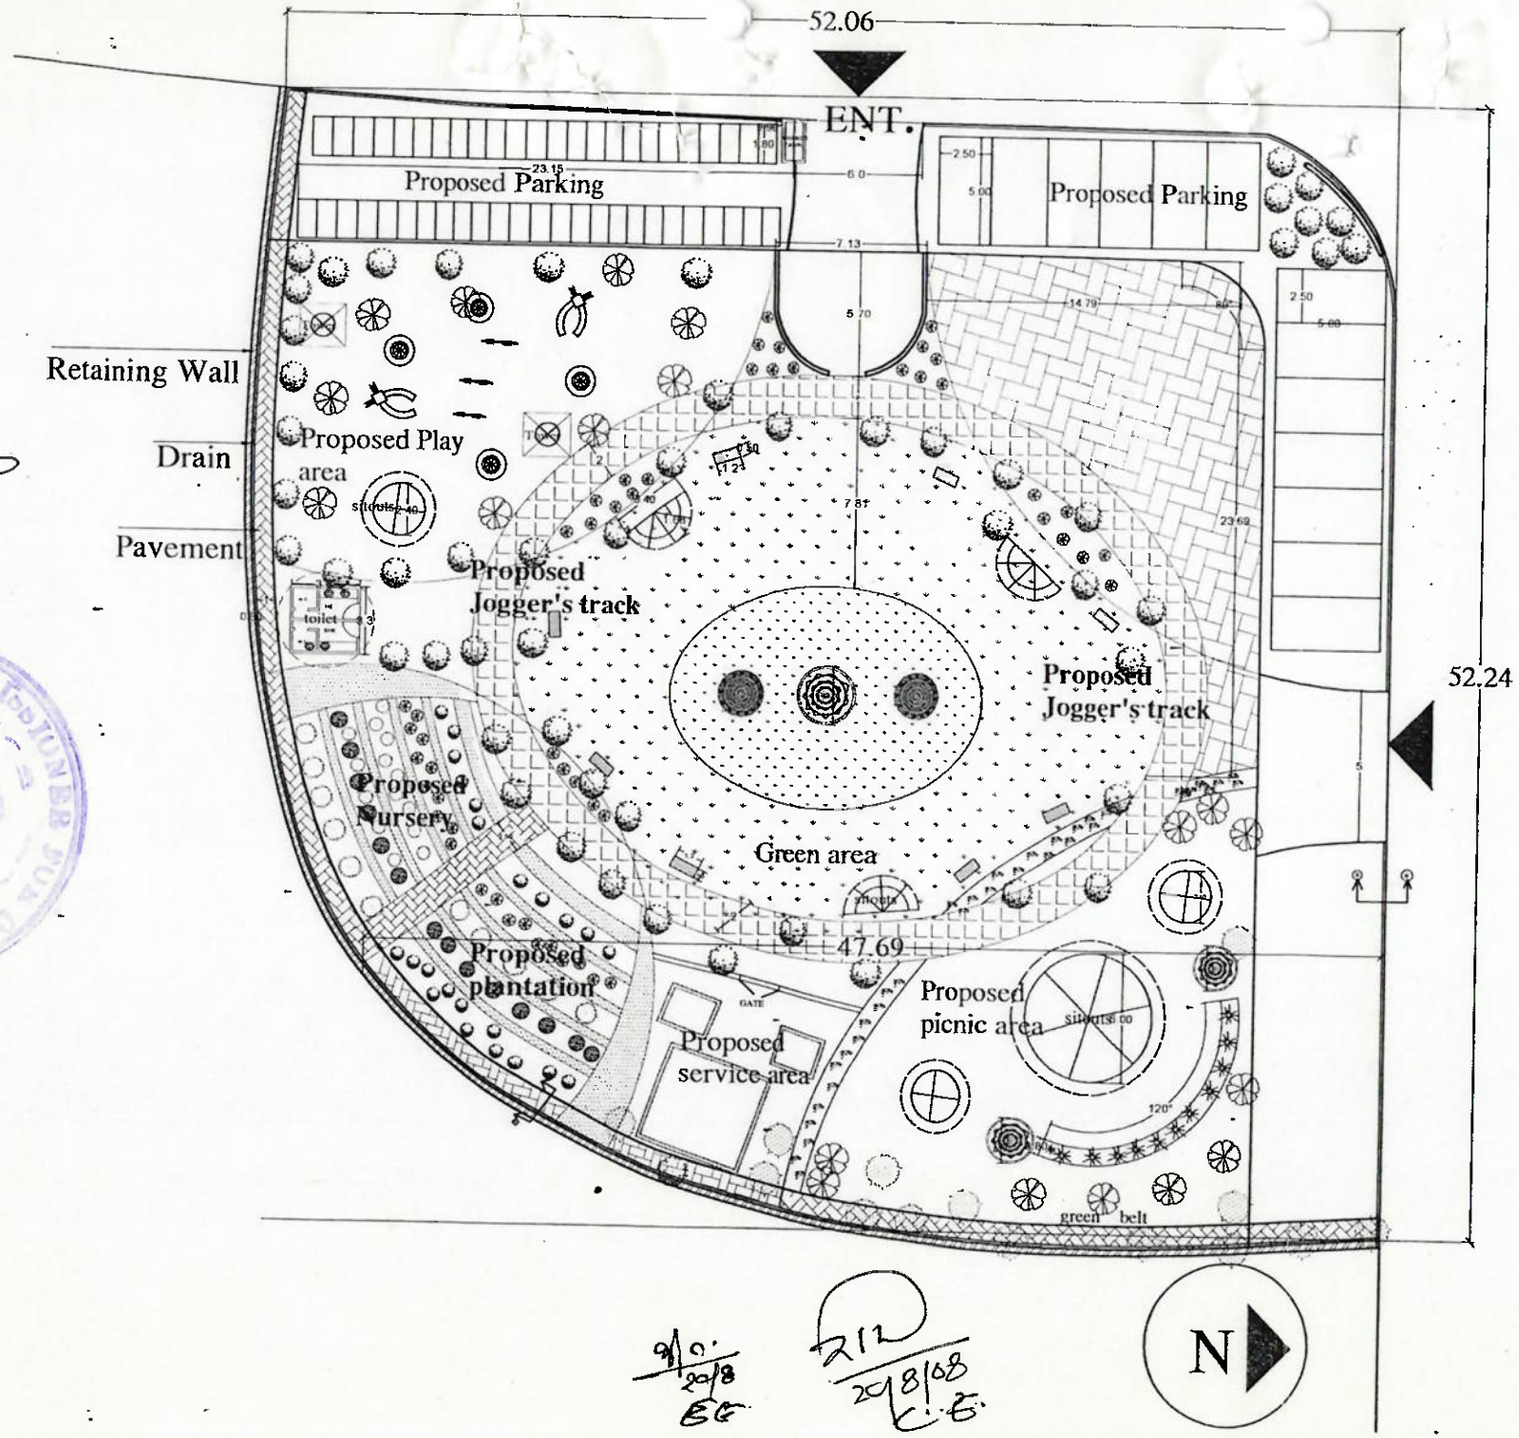
52.06
ENT.
Proposed Parking
Proposed Parking
Retaining Wall
Drain
Pavement
Proposed Play area
Proposed Jogger's track
Proposed Jogger's track
Proposed Nursery
Green area
Proposed plantation
Proposed service area
Proposed picnic area
47.69
52.24
green belt
N

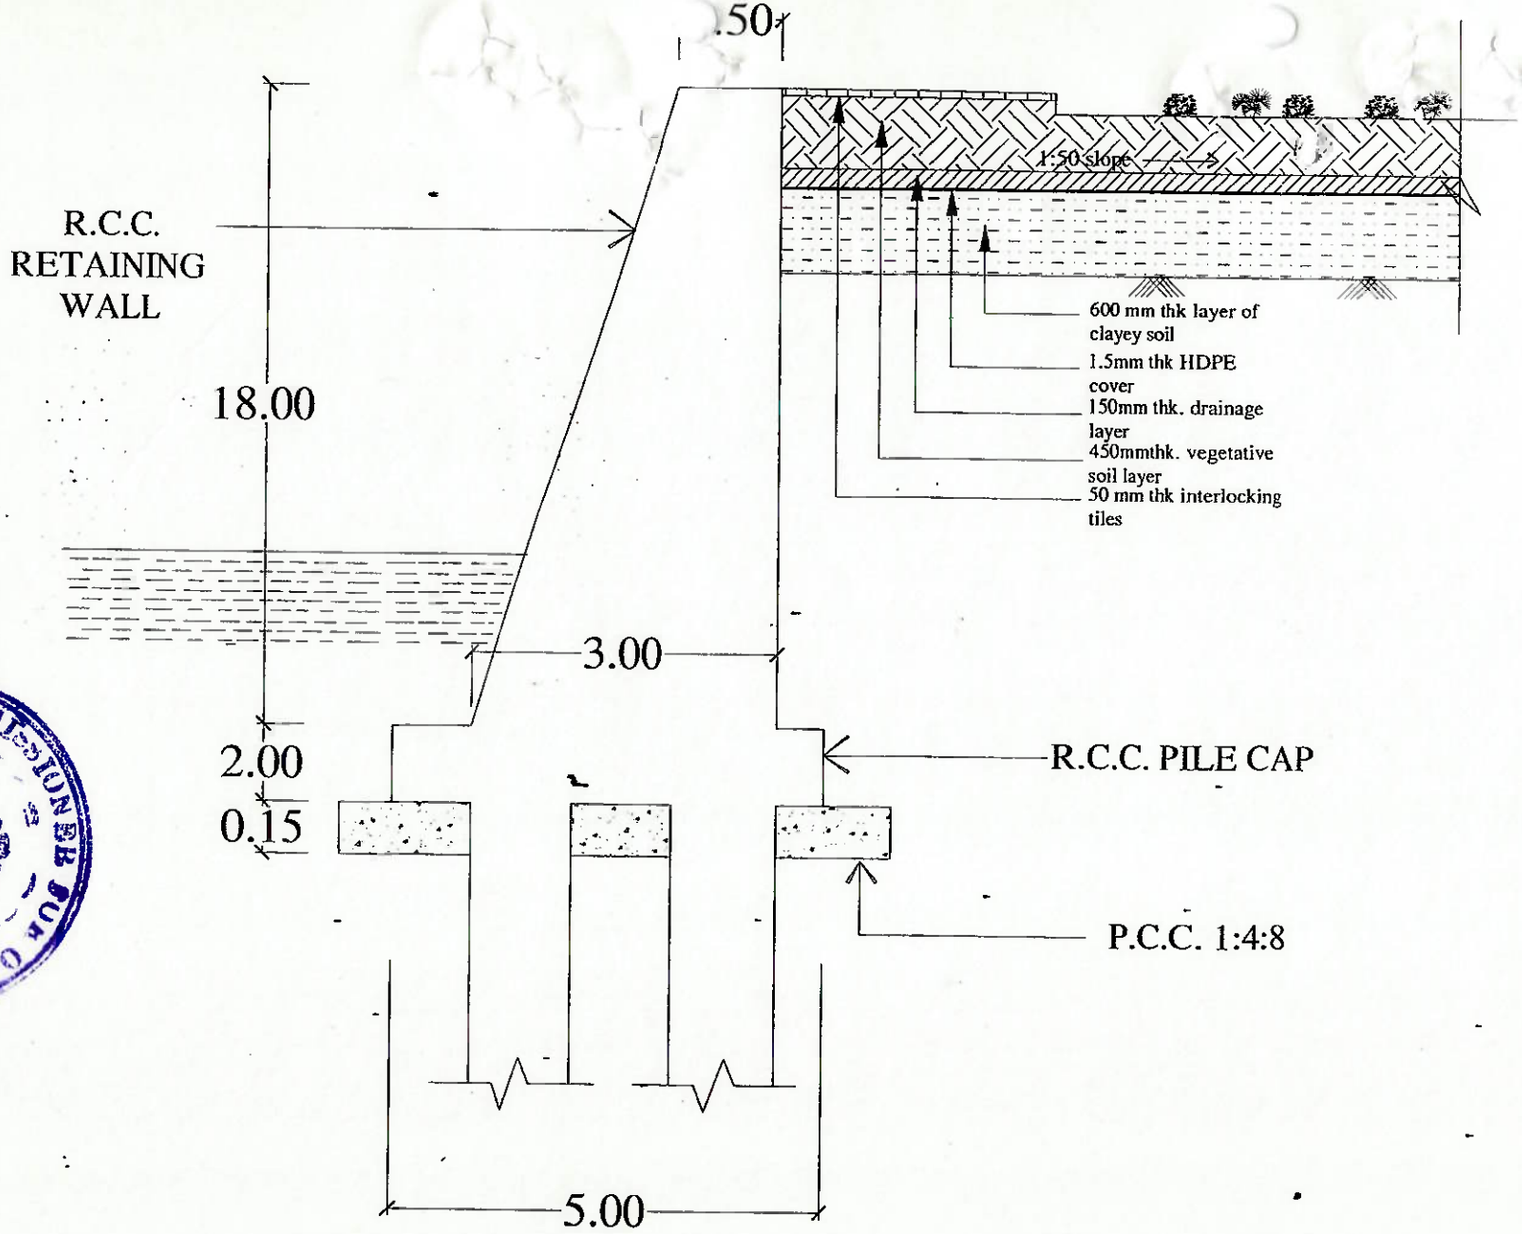

DETAIL OF RETAINING WALL

1282

233

1283 28 234

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2008 (m/B)
Sewage Treatment Plant VERSUS State of U.P.
ANNEXURE NO

(1)

	NAME OF PROJECT : PROPOSED PARK AT JIAMAU , LUCKNOW				
	NAME OF CLINET : LUCKNOW NAGAR NIGAM				
	NAME OF WORK : HORTICULTURE & LAND SCAPE				
A	HEAD-HORTICULTURE & LAND SCAPE				
S.NO	DESCRIPTION OF ITEMS	UNIT	QUANTITY	RATE	AMOUNT
1	Supply & stacking of good earth at site including royality & carriage up to 25 km (earth measured in stacks will be reduced by 20% for payment .)(as per DSR NO 23.2 /HORTICULTURE /2007)	cum	1166.0	269.21	313898.86
2	Supply & stacking of manure at site from approved source , including carriage up to one km (manure measured in stacks will be reduced by 8% for payment .)(as per DSR NO 23.4 /HORTICULTURE /2007)				
	Screened through sieve of I.S designation 4.75 mm	cum	600.85	245.79	147682.92
3	Fine dressing the ground . as per DSR NO 23.7 /HORTICULTURE /2007)	sqm	2704.0	0.80	2163.20
4	Spreading of sludge, dump manure or/ and good earth in required thickness .(Cost of sludge , dump manure or/and erth to be paid seprately.)(as per DSR NO 23.8 /HORTICULTURE /2007)	sqm	1767.2	11.60	20499.52
5	Mixing earth and sludge or manure in proprtion specified or directed.(as per DSR NO 23.9 /HORTICULTURE /2007)	cum	1767.2	7.85	13872.52
6	Grassing with Selection NO 1 Rajghat grass including watering & maintenance of the lawn for 30 days or more till the grass forms a thick lawn free from weeds and fit for mowing including supplying good earth if needed(the good earth shall be paid seprately .)	sqm	2209.0	5.00	11045.00
7	Digging holes in ordinary soil and refilling the same with the excvated earth mixed with manure or sludge in the ratio of 2:1((2 parts of stacked volume of earth after reduction by 20 % : one part of stcked volume of sludge or manure after reduction by 8%), flooding with water ,dressing including removal of rubbish & surplus erth, if any with all leads &lift (cost of manure,sludge or extra good earth if needed to be paid for seprately).(as per DSR NO 23.14 /HORTICULTURE /2007)				
a	Hole 60 cm dia & 60 cm deep.(as per DSR NO 23.14.2/HORTICULTURE /2007)	Nos	150	19.25	2887.50
8	Plantation of PALM, AMALTAS ,DELONIX REGIA , GRAVILLA ROBUSTA,BOTTLE PALM ETC. trees irrigation,weeding, hoeing development up to Six month.Plant size 8 to 10 feet	Nos	150	500.00	75000.00
9	Providing & fixing m.s flats iron tree guard 60 cm dia. & 2m ht above ground level formed of 4 nos 25x6 mm & 8nos,25x3 mm vertical m.s flats rivetted to 3nos 25x6 mm m.s flat iron ring in two halves, bolted togather with 8mm dia and 30 mm long bolts including painting two coats with paint of approved brand and manufacture over a coat of priming, complete in all respects.(as per DSR NO 23.16 /HORTICULTURE /2007)	Nos	150	1592.10	238815.00
10	Preparation of floower bed, use of antitermite treatment , use of manure & fertilizer,planing of shrubs(as Hybrid lantana, Dwarf hybrid Bonganvilla, cassia biflora, Exora Chinensis, Zatrofha, Mussandra,etc), irrigation,weeding,hoeing, development up to six month.	Nos	10000.0	100.00	1000000.0
	SUB TOTAL -1				1825864.52
B	CONSTRUCTION OF PARK				
1	Earth work in cutting or in embankment in ordinary soil excavation to be done form of regular pits not exceeding 1/2 M in depth and work embankment to be in 20 cm layers including ramming and dressing the surface to required levels & slope including royality and cartage of earth from 25 km & complete in all respect.(as per PWD Sl NO 253(A))	cum	29952.0	216.90	6496588.80

1284 29. ~~1108~~ ~~1193~~ 235

2	Providing & laying cement concrete 1 : 4 :8 with 40 mm gauge stone ballast coarse sand and cement & curing complete,includingcost of form work in foundations and under floors. (as perPWD SI NO 281 /2008)	cum	48.6	2500.00	121500.00
3	Providing & laying at or near ground level factory made kerb stone of M25 grade cement in drain position to the required line,levl & curvature jointed with cement mortar 1:3 (1cement :3 coarse sand) including making joints with or without grooves (thickness of joints except at sharp curve not be less than 5 mm) including making drainage opening whereever required complete etc. as per direction of Engineer - In - Charge (length of finished kerb edging shall be measured payment).(Precast C.C kerb stone shall be approved by Engineer-In-Charge).(as per DSR 16.69/2007/PAGE NO 251)	cum	18.0	4247.70	76458.60
4	Chequerred precast cement concrete tiles 22 mm thick in footh path & courtyard of mediam shade using 50 % white cement , 50% ordinary cement jointed with cement slurry mixed with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of the tiles including rubbing and cleaning etc complete on 20 mm thick bed of cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand).(As per DSR 11.20.2 /2007/PAGE NO 175)	Sqm	324.00	973.15	315300.60
5	Providing & laying 60 mm thick factdry made cement concrete interlocking paver block of M 30 grade made by block making machine with strong vibratory compaction and of approved size & design /shape laid in required colour and pattern over and including 50 mm thick compacted bed of coarse sand , filling the joints with coarse sand etc all complete as per the direction of Engineer - in - charge.(as per DSR SI NO 16.68 /2008)	sqm	180.00	345.45	62181.00
6	Providing and fixing of G.I PIPE 50 MM DIA nominal bore complete withG.I fittings including trenching abd refilling etc.(As per DSR 18.12.6 / 2007 / PAGE NO 293)	meter	200.0	280.100	56020.00
7	Providing and fixing of G.I PIPE 25 MM DIA nominal bore complete withG.I fittings including trenching abd refilling etc.(As per DSR 18.12.3 / 2007 / PAGE NO 292)	meter	10.0	156.85	1568.50
8	Making connection of G.I distribution branch with G.I main by providing and fixing tee, including cutting and threading the pipe etc. complete.(As, per DSR 18.13.1 / 2007 / PAGE NO 293)	each	10.0	166.05	1660.50
9	Providing & fixing 50 mm nominal bore gun metal gate valve with C.I wheel of approved quality (screwed end) (As per DSR 18.15.4 / 2007 / PAGE NO 292).	Nos	1.0	578.20	578.20
0	Providing & fixing 25 mm nominal bore ball valve (brass) of approved quality, high or low pressure, with plastic floats complete.(As per DSR 18.18.3 / 2007 / PAGE NO 292).	Nos	10.0	385.90	3859.00
11	Constructing masonry chamber 30 x30 x50 cms, inside with 75 class designation brick work in cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) for stop cock , with C.I surface box 100 x 100 x 75 mm in side with hinged cover fixed in cement concrete slab 1:2:4 mix (1 cement :L 2 coarsse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal sige) necessary excavation foundation concrete 1:5:10 (1cement : 5 fine sand : 10 graded stone aggregate 40 mm nominal size) and in side plastering with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) 12 mm thick finished with a fl;oating coat of neat cement complete as per standared design.(As per DSR 18.32.1 / 2007 / PAGE NO 297).	Nos	16.0	599.80	9596.80

A/C EE

ZIH C.E.

COMMISSIONER SUB OATH

1285 30. ~~1197~~ 236

12	Providing & making benches as per drawing & specifications including supply of all materials, labours& T&Petc complete.	Nos	50.0	11984.00	599200.0
13	Mild steel or iron work in heavy size such as trusses,build up gates,record racks, roof work ,gates etc wrought to required from including drilling holes riveting or welding where necessary and their fixing required for proper cqmplition of work.(As per PWD SI NO 503/2008).Weight of gate @ 17.5 kg/ sqm	KG	483	45.00	21735.00
14	Applying priming coat over new steel and other metal surface up to 10 cm in width or girth or small articles not exceeding 0.1 sqm area after and including preparing the3 surface by throughly cleaning oil, grease, dirt and other foreign matter and scoured with wire brushes, fine steel wood scraper and papering and knotting including cost of all material s, labour,T&P , etc required for proper complition of work.(As per PWD SI NO / 19.4/2008.)	sqm	27.6	22.00	607.20
15	Painting two coat over priming coat (but excluding cost of pr imning coat) on steel & other metal sufrface up[to 10 cm width or girth or small articles not exceeding 0.1 sqm in area syntthetic enamel such as luxol-3, higloss apcolite superlac , delux specified brushing to give an even sheadand including cleaning the surfaceof all dirt , dust and other foreign matter sand papering , and stopping including cost of all material s, labour,T&P , etc required for proper complition of work.(As per PWD SI NO / 19.3/2008)	sqm	27.6	51.00	1407.60
16	**Construction of gate pillars**				
	Earth work in excavation in trenches for foundations , pipers cable etc in ordinary soil (loan clay or sand)nincluding lift up to 1.5 mt lead up to 50 mt and dressing of sides and rammings of bottom and disposal of surplus excavated earth as directed by the Engineer-in charge i.c with in a lead of 50 m.(As per PWD SI NO 251 (1A) /2008	cum	10.8	40.00	432.00
b	Providing & laying cement concrete 1 : 4 :8 with 40 mm gauge stone ballast coarse sand and cement & curing complete,includingcost of form work in foundations and under floors. (as per SI no 281 /2008)	cum	0.9	2500.00	2250.00
c	Providing & laying in position specified grade of reinforced cement concrete 1: 1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand : 3 graded stone aggregate 20 mm in size)excluding the cost of centering , shuttering,finishing and reinforcement- all work up to plinth level.(As per DSR /5.1.2 / 2007/P.NO 88)	cum	2.83	3732.00	10561.56
d	R.C.C 1: 1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand : 3 graded stone aggregate 20 mm in size)work in walls including attached pilasrters , buttresses, plinth & string courses, fillets, columns, pillars, piers,abutments , posts and struts etc up to floor five level excluding the cost of centering , shuttering,finishing and reinforcement- all work up to plinth level.(As,per DSR /5.2.2 / 2007/P.NO 88)	cum	2.3	4092.35	9412.41
	Centering & shuttering including strutting ,propping etc & removal of firm for foundation, footing, bases of columns, etc for mass concrete.(as per DSR 5.9.1/2007/PAGE NO 89)	sqm	32	119.25	3816.00
f	Mild steel or iron in plain work such as reinforced concrete or reinforced brick work (when not included in over all rates) wrought to required shape as necessary including bending for proper completion of the work and including supply of steel its wastage bend looks and authorized overlapping shall be measured up to floor two levels.((UP PWD SI N0 504 /2008)				
	8 mm dia RING @ 150 C/C	KG	34.76	40.60	1411.26
	12 mm dia @ 150 C/C	KG	83.3	39.00	3248.70
	16 mm dia	KG	197.18	39.00	7690.02
17	**CONSTRUCTION OF BOUNDRY WALL**				
a	Class -150 brick work in 1:3 cement & coarse sand mortar in foundation & plinth including supply of all material ,labour , T&P, and plants etc, required for proper completion of work .(As per PWD SI NO 307/2008)	cum	36.98	2300.00	85054.00

EE

30/2/08
CE

COMMISSIONER FOR OATHS

b	Providing & fixing dholpur stone work for wall lining etc (venner work) 40 mm thick in cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) including cramping joining in white cement mortar 1:2 (1 white cement : 2 stone dust) with an admixture of pigment matching the stone shade.(as per PWD SI NO 1/CH-18/2008)	sqm	372.00	790.00	293880.00
c	Mild steel or iron work in heavy size such as trusses,build up gates,record racks, roof work ,gates etc wrought to required from including drilling holes riveting or welding where necessary and their fixing required for proper complition of work.(As per PWD SI NO 503/2008).Weight of gate @ 17.5 kg/ sqm	KG	6339.4	45.00	285273.00
d	Applying priming coat over new steel and other metal surface up to 10 cm in width or girth or small articles not exceeding 0.1 sqm area after and including preparing the3 surface by throughly cleaning oil, grease, dirt and other foreign matter and scoured with wire brushes, fine steel wood scraper and papering and knotting including cost of all material s, labour,T&P , etc required for roper complition of work.(As per PWD SI NO / 19.4/2008.)	sqm	362.25	22.00	7969.50
e	Painting two coat over priming coat (but excluding cost of priming coat) on steel & other metal sufrface up[to 10 cm width or girth or small articles not exceeding 0.1 sqm in area syntthetic enamel such as luxol-3, higloss apcolite superlac , delux specified brushing to give an even sheadand including cleaning the surfaceof all dirt , dust and other foreign matter sand papering , and stopping including cost of all material s, labour,T&P , etc required for proper complition of work.(As per PWD SI NO / 19.3/2008)	sqm	362.25	62.00	22459.50
18	**CONSTRUCTION OF PARKING AREA**				
a	Earth in cutting or in embankment in ordinary soil excavation to be done form of regular pits not exceeding 1/2 m in depth and work embankment to be in 20 cm layers including ramming & dressing the surface to required levels and also including 4.5 m lift and 30 mt lead. The earth from cutting to be used in making embankment or to be deposited as spoil banks with in 30 mt distance as directed by the Engineer-in-charge(UP PWD SI N0 253 (A) /2008	cum	520.00	29.30	15236.00
b	Construction of embankment with approved material soil-clayey sand with CBRI > 6 obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site , spreading , grading to required slope and compacting to meet requirement of table 300-2.(as per MORTH 305, SR NO 3.16) in attached parking area with Prenasthal	cum	200.00	216.90	43380.00
c	Construction of subgrade and earthen shoulders with Soil -Clayey sand with CBR > 8 obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site , spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of table 300-2 (AS PER MORTH 305/SR NO 3.18)	cum	200.00	254.60	50920.00
d	Construction of granular sub base (GSB) by providing coarse graded material , spreading in uniform layers with motar grader on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC and compacting with vibratory roller to achieve the desired density complete as per MORTH clause 401,Grading-II (table 400-2)	cum	60.00	2016.80	121008.00
e	Providing & laying Lean Cement Concrete 1 : 4 :8 with 40 mm gauge stone ballast : coarse sand : cement over a prepared sub-grade with coarse and fine aggregate. The concrete to be prepared in a batching plant, laid in proper slope and camber and compacted with pin / surface vibrator including curing etc. all complete. (as per PWD SI NO 281 /2008)	cum	60.00	2500.00	150000.00
f	Providing & laying of 125 micron polythene under the C.C.pavement over lean cocncrete surface for antislip tier treatment	sqm	400.0	20.00	8000.00

C.E

g	Providing & laying C.C pavement of mix M25 with ready made mixed concrete from batching plant. The ready mixed concrete shall be laid and finished with screed boared vibrator , vacuum dewatering process and finally finished by floating , brooming with wire brush etc. complete as per specifications and direction of Engineer-in- Charge . (The shuttering work shall be paid for separately.)(As per DSR 16.75 /2007)	cum	60.00	4471.25	268275.00
h	Providing & fixing in position pre-moulded joint filler in expansion joints.(as per DSR 16.45 /2007)Center (20 cm deep & 1.2 cm width)(Panel size 2.5 x 2.5 mt)	RMT	3120.00	72.00	224640.00
i	Centering & shuttering including strutting ,propping etc & removal of firm for foundation, footing, bases of columns, etc for mass concrete.(as per DSR 5.9.1/2007/PAGE NO 89))(Panel size 2.5 x 2.5 mt)	sqm	26.00	119.25	3100.50
j	Cartage for disposal of excavated earth & malba etc including loading & unloading up to 5.0 kms distance.	cum	520.00	83.60	43472.00
19	**CONSTRUCTION OF TOILET, GUARD CABIN, ELECTRICAL ROOM**				
	EARTH WORK				
a	Earth work in excavation in foundations in ordinary soil (loame clay or sand) including lift up to 1.5 mt & lead up 30 mt and including filling watering and ramming of excavated earth in to the trenches or in to the space betwe , the building and the sides of foundation trenches or in to the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by the engineer- in - charge up to a distance of 30 m from the foundation trenches. (as per SI NO 251a)	cum	21.77	40.00	870.80
b	**CONCRETE WORK**				
i	Providing & laying cement concrete 1 : 4 :8 with 40 mm gauge stone ballast coarse sand and cement & curing complete, including cost of form work in foundations and under floors.	cum	2.9	2500.00	7250.00
ii	Concrete with 4.0cm gauge B/Ballast, coarse sand and cement in proportion of 12 : 6 : 1 in foundations and under floors. including supply of all materials , labour Tools & Plants etc. required for proper completion of the work.	cum	3.58	1600.00	5728.00
iii	R.C.C. work with cement , approved coarse sand and 20mm gauge stone grit in proportion of 1 :1.5:3 in lintels of doors & windows excluding supply of reinforcement and its bending but including its fixing and binding the same with 24B.W.G.G.I. binding wire and including necessary centering and shuttering etc and supply of all materials , labour , Tools & plant etc. required for proper completion of the work including cost of winding wire.(as per SI NO 283)				
iv	Lintels over doors & windows	cum	0.43	4000.00	1720.00
v	**AS in item no 283 but for slab.**	cum	3.44	4700.00	16168.00
c	M.S. (tor steel or plain) in plain work such as R.C.C.or R.B. work including for proper shape and including supply of steel & its wastage bend , hooks and authorized overlapping shall be measured and including cost of binding wire.(as per SI NO 504)	KG	304.00	53.00	16112.00
d	**BRICK WORK**				
i	M 150 Brick work in 1 : 6 cement and coarse sand mortor in foundation & plinth including supply of all materials , labour Tools & Plants etc. required for proper completion of the work. (as per SI NO 303)	cum	10.09	2083.00	21017.47

C.B.

ii	M 150 Brick work in 1 : 6 cement and coarse sand mortor in super structure including supply of all materials , labour Tools & Plants etc. required for proper completion of the work. (as per SI NO 310)	cum	8.2	2300.00	18860.00
e	Supply of M.S. sheet 18 gauge (1.25 mm) pressed steel door chaukhat including S/F of iron but hinges of 100 x 3 mm I.S.I. mark with drilling holes for L-droop and pipes 15 x 12 mm C leats for tower,bolt and 40 x 6 mm hold fast 230 mm long including supply of all materials labour T & P carriage upto site required for proper completion of work as per directed by engineer incharge E/I. (S.I. no. 14/2008)				
	Section 100 x 50 mm. for single rebate door chaukhat with 6 hinges.	RMT	30.6	180.00	5508.00
f	S/F of flush doors commercial quality confirming to IS 2202 Part 1 (1983) including fixing .(as per PWD SI NO 70/2008)	sqm	11.34	985.00	11169.90
g	**PLASTERING WORK**				
i	10 mm cement plaster with cement and coarse sand of (1.5 to 1.75)fineness modules in 1:6 over brick work minimum the not to be less than 1cm. Including supply of all materials ,labour , T& P , etc require for proper completion of wo (S.I no 586+ (553-582)	sqm	51.84	72.00	3732.48
i	OUTSIDE (15 mm th) in 1:4 cement & coarse sand mortar	sqm	57.6	90.00	5184.00
h	**FLOORING WORK**				
i	40 mm thick cement concrete flooring 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate of size 20 mm nominal size) laid in one layer finished with floating coat of neat cement).(as per PWD SI NO 665.00/ 14.71 NBO /2008)	sqm	12.96	190.00	2462.40
ii	P/L ceramic tiles 5 mm thick of approved shade of 300 x 200 mm size on walls of toilets over 1:4 cement & coarse sand mortar including grouting.	sqm	59.4	575.00	34155.00
i	**PAINTING WORK**				
	White washing with lime three coat on ceilings surface to give and even shade including thoroughly broomoing the surface to remove all dirt , dust , mortar drops and other foreign matter.(as per PWD NBO 18.11+18.12 /2008)	sqm	89.64	6.50	582.66
20	**ELECTRICAL WORK**				
a	Supplying and erection of factory fabricated decorative steel pole with base plate(7 meter height above ground level portion suitable for fixing of IGUZZINI make street light top mounting bracket in 1:2:4 cement concrete foundation (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 40 mm nominal size) with anchor bolts. The pole shall be cast iron/cost aluminium embelishment and primer coated and galvenised with poly urathane paint of approved colour. The pole shall have service window at the botton portion with in built looping arrangement consisting of 2 nos. 6 Amp S.P. M.C.B 10 KA 'c' curve and 4 way brass connector including wiring the pole with 2 x 3 core 2.5 sq.mm PVC insulated and PVC sheathed copper conducter cable. (Twinkle make claasic or similar)	10.00	Nos.	56800.00	568000.00

A.E. C.B.

b	Supplying, installation, testing and commissioning of IGUZZINI make 1 nos of strret light fixture using 150 watt CDM 330 lamp fixtures body made out of powder coated c/w mounting bracket and lamp .(Philps /osram make) connection as required.	**10.00**	**Nos.**	**92850.00**	**928500.00**
c	Supplying and erection of factory fabricated decorative cost Aluminnum pole with base plate 2.9 mtr height above ground level with built in control box in 1:2:4 cement concrete foundation (1 cement:2coarse sand : 4 graded stone aggregate 40 mm nominal size) with anchor bolts duly primer coated and galvanized with polyurethane paint 1 no., 6 AMP S.P MCB, 10 KA 'c' curve and 2 nos. 4 way brass connector and wiring the pole with 3 core 2.5 sq.m pvc insulated and PVC sheathed copper conductor cable. (Twinkle make cat no GAOR-3145)	**22.00**	**Nos.**	**28700.00**	**631400.00**
d	Supplying, installation, testing and commissioning of decorative post top lantern fitting suitable for 70 watt M H lamp complete with copper wound choke ignitor, condenser and 70 watt MH lamp connection as require (Twinkle make cat . No . TSL 833P)	**22.00**	**Nos.**	**17000.00**	**374000.00**
e	Supplying and laying 1 no.120 mm outer dia double walled corrugated high density polyethylene pipe having corrugation on the outer wall and plain surface inner wall confirming to IS 14930 part I & II complete with necessary HDPE fitting for protection of 1.1 KV grade U.G. cable directly in ground including excavation and refilling as required (Duraline/Rex made)	**200.00**	**Mtr**	**250.00**	**50000.00**
f	Supplying and fixing 100 mm dia PVC tee in c.c. foundation for cable entry in the pole as required.(As per Market rate)	**22.00**	**Mtr**	**75.00**	**1650.00**
g	Supplying and fixing 100 mm dia G.I. pipe (B class) in ground/surface as required (Jindal/T.T. swastic/Surya make) (As per Market rate)	**300.00**	**mt**	**650.00**	**195000.00**
h	Supplying at site following sizes PVC insulated and PVC sheathed XLPE, copper conductor armoured power cable 1.1 KV grade.				
	2 x 10 sq.m (As per Market rate)	**800.00**	**Mtr**	**300.00**	**240000.00**
I	Laying of one number following size PVC insulated and PVC sheathed XLPE, Al. conductor power cable 1.1 KV grade in the following manner as required.				
i	Size not exceeding 25 sq.m in existing pipe.(As per DSR 2007/ ITEM NO 1.7)	**750.00**	**Mtr**	**15.00**	**11250.00**
ii	Size not exceeding 25 sq.m on surface(As per DSR 2007/ ITEM NO 1.11)	**25.00**	**Mtr**	**31.00**	**775.00**
j	Supplying and making end termination with brass compression gland and Al. lugs for following soxe of PVC insulated & PVC sheathed XLPE cable of 1.1 KV grade as required.				
i	2 x 10 sq.m (As per DSR 2007/ ITEM NO 4.1.2)	**44.00**	**Nos.**	**76.00**	**3344.00**

C.E.

290 ~~198~~ 35- (1199) 241

k	Construction of brick masonary gully chamber 50 cm x 45 cm x 60 cm deep with brick of class designated in cement mortar 1:5 (1 cement :5 fine sand) including 73 cm x 68 cm precast R.C.C horizontal cover with m.s angle frame complete with F.P.S bricks.(As per Market rate)	4.00	Nos	1500.00	6000.00
l	Earthing with G.I. earth pipe 4.50 mtr. Long and 40 mm dia i/c accessories and providing masonry enclosure with copper plate having locking arrangement with charcoal & salt complete as required.(As per DSR 2007/ ITEM NO 3.1 + 3.3)	3.00	Set	1971.00	5913.00
m	Providing and fixing 25 mm x 5 mm G.I. strip in 40 mm dia G.I. pipe firm earth electrode as required.(As per DSR 2008/ ITEM NO 3.14)	20.00	Mtr	218.00	4360.00
n	Providing and fixing 25 mm x 5 mm G.I. strip on surface in recess for earth connection as required (As per DSR 2009/ ITEM NO 3.18)	5.00	Mtr	1320.00	6600.00
o	Providing and laying 6 SWG G.I. wire on surface/recess along with the cable for pole earthing as required.(As per DSR 20010/ ITEM NO 4.2.19)	450.00	Mtr	11.00	4950.00
	SUB TOTAL-2				12612013.95
	GRAND TOTAL	Sub total-1 + sub total-2			14437878.47
				SAY	14437878.0
	RS ONE CRORE FOURTY FOUR LACKS THIRY SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDREAD SEVENTY EIGHT ONLY.				

29/8/2018 EE.

21/N 29/8/08 EE

1291 ~~199~~ 36. 1200

242

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2008 (MB)
Sewage Treatment Plant VERSUS State of U.P.
ANNEXURE NO

(1)

	NAME OF PROJECT : PROPOSED PARK AT JIAMAU , LUCKNOW						
	NAME OF CLINET : LUCKNOW NAGAR NIGAM						
	NAME OF WORK : Horticulture and Landscape						
S.NO	DESCRIPTION OF ITEMS	NO	LENGTH	BREADTH	HT/DEPTH	QTY	UNIT
1	Supply & stacking of good earth at site including royality & carriage up to one km (earth measured in stacks will be reduced by 20% for payment .)(as per DSR NO 23.2 /HORTICULTURE /2007)	1	47.00	47.00	0.8	1767.20	CUM
					TOTAL	1767.20	CUM
		EARTH REQUIRED = ITEM NO 1-ITEM				1166.35	CUM
2	Supply & stacking of manure at site from approved source , including carriage up to one km (manure measured in stacks will be reduced by 8% for payment .)(as per DSR NO 23.4 /HORTICULTURE /2007)						
	Screened through sieve of I.S designation 4.75 mm	34 % OF ITEM NO 1				600.85	CUM
3	Fine dressing the ground . as per DSR NO 23.7 /HORTICULTURE /2007)	1	52.00	52.00	s	2704.0	SQM
4	Spreading of sludge, dump manure or/ and good earth in required thickness .(Cost of sludge , dump manure or/and erth to be paid seprately.)(as per DSR NO 23.8 /HORTICULTURE /2007)	1	QTY SAME AS ITEM NO- 2			1767.2	CUM
5	Mixing earth and sludge or manure in proprtion specified or directed.(as per DSR NO 23.9 /HORTICULTURE /2007)	1	ITEM NO1+ITEM NO2			1767.20	CUM
6	Grassing with Selection NO 1 Rajghat grass including watering & maintenance of the lawn for 30 days or more till the grass forms a thick lawn free from weeds and fit for mowing including supplying good earth if needed(the good earth shall be paid seprately .)						
		1	47.00	47		2209.0	SQM
	Digging holes in ordinary soil and refilling the same with the excvated earth mixed with manure or sludge in the ratio of 2:1((2 parts of stacked volume of earth after reduction by 20 % : one part of stcked volume of sludge or manure after reduction by 8%), flooding with water ,dressing including removal of rubbish & surplus erth, if any with all leads &lift (cost of manure,sludge or extra good earth if needed to be paid for seprately).(as per DSR NO 23.14 /HORTICULTURE /2007)						
a	Hole 60 cm dia & 60 cm deep.(as per DSR NO 23.14.2/HORTICULTURE /2007)	1	150			150	Nos
8	Plantation of PALM, AMALTAS ,DELONIX REGIA , GRAVILLA ROBUSTA,BOTTLE PALM, ETC. trees irrigation,weeding, hoeing development up to Six month.Plant size 8 to 10 feet	1	150			150	Nos
9	Providing & fixing m.s flats iron tree guard 60 cm dia. & 2m ht above ground level formed of 4 nos 25x6 mm & 8nos,25x3 mm vertical m.s flats rivetted to 3nos 25x6 mm m.s flat iron ring in two halves, bolted togather with 8mm dia and 30 mm long bolts including painting two coats with paint of approved brand and manufacture over a coat of priming, complete in all respects.(as per DSR NO 23.16 /HORTICULTURE /2007)	1	150	-	-	150	Nos

EE C.E.

1292 37. 1201 243

10	Preparation of floower bed, use of antitermite treatment , use of manure & fertilizer,planing of shrubs(as Hybrid lantana, Dwarf hybrid Bonganvilla, cassia biflora, Exora Chinensis, Zatrofha, Mussandra,etc), irrigation,weeding,hoeing, development up to six month,	1	1000.0				10000.0
B	**CONSTRUCTION OF PARK**						
1	Earth work in cutting or in embankment in ordinary soil excavation to be done form of regular pits not exceeding 1/2 M in depth and work embankment to be in 20 cm layers including ramming and dressing the surface to required levels & slope including royality and cartage of earth from 25 km & complete in all respect.(as per PWD SI NO 253(A))						
		0.5	104.0	32.0	18.0	29952.0	CUM
2	roviding & laying cement concrete 1 : 4 :8 with 0 mm gauge stone ballast coarse sand and cement & curing complete,includingcost of form work in foundations and under floors. (as perPWD SI NO 281 /2008)	1	110	2.00	0.15	33	
		1	104	1.00	0.15	15.6	
		0.5	15	24.00	0.15	27.00	
					Total	48.60	
	Providing & laying at or near ground level factory made kerb stone of M25 grade cement in drain position to the required line,levl & curvature jointed with cement mortar 1:3 (1cement :3 coarse sand) including making joints with or without grooves (thickness of joints except at sharp curve not be less than 5 mm) including making drainage opening whereever required complete etc. as per direction of Engineer - In - Charge (length of finished kerb edging shall be measured payment).(Precast C.C kerb,stone shall be approved by Engineer-In-Charge).(as per DSR 16.69/2007/PAGE NO 251)						
		1	250.0	0.15	0.25	9.4	CUM
		1	250	0.30	0.115	8.6	CUM
					TOTAL	18.0	CUM
4	Chequerred precast cement concrete tiles 22 mm thick in footh path & courtyard of mediam shade using 50 % white cement , 50% ordinary cement jointed with cement slurry mixed with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of the tiles including rubbing and cleaning etc complete on 20 mm thick bed of cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand).(As per DSR 11.20.2 /2007/PAGE NO 175)	2	52.0	1.00		104.0	sqm
		1	110.0	2.00		220.0	sqm
					Total	324.0	sqm
5	Providing & laying 60 mm thick factory made cement concrete interlocking paver block of M 30 grade made by block making machine with strong vibratory compaction and of approved size & design /shape laid in required colour and pattern over and including 50 mm thick compacted bed of coarse sand , filling the joints with coarse sand etc all complete as per the direction of Engineer - in - charge.(as per DSR SI NO 16.68 /2008)	1	0.5	15.00	24.00	180.0	SQM

EE C.E.

a	Earth work in excavation in trenches for foundations , pipers cable etc in ordinary soil (loan clay or sand)nincluding lift up to 1.5 mt lead up to 50 mt and dressing of sides and rammings of bottom and disposal of surplus excavated earth as directed by the Engineer-in charge i.c with in a lead of 50 m.(As per PWD SI NO 251 (1A) /2008	4	1.50	1.50	1.2	10.80	CUM
b	Providing & laying cement concrete 1 : 4 :8 with 40 mm gauge stone ballast coarse sand and cement & curing complete,includingcost of form work in foundations and under floors. (as per SI no 281 /2008)	4	1.50	1.50	0.1	0.90	CUM
c	Providing & laying in position specified grade of reinforced cement concrete 1: 1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand : 3 graded stone aggregate 20 mm in size)excluding the cost of centering , shuttering,finishing and reinforcement- all work up to plinth level.(As per DSR /5.1.2 / 2007/P.NO 88)	4	1.30	1.30	0.3	2.03	CUM
		4	0.50	0.50	0.8	0.80	CUM
					Total	2.83	CUM
d	R.C.C 1: 1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand : 3 graded stone aggregate 20 mm in size)work in walls including attached pilasrters , buttresses, plinth & string courses, fillets, columns, pillars, piers,abutments , posts and struts etc up to floor five level excluding the cost of centering , shuttering,finishing and reinforcement- all work up to plinth level.(As per DSR /5.2.2 / 2007/P.NO 88)	4	0.50	0.50	2.3	2.30	CUM
	Centering & shuttering including strutting ,propping etc & removal of firm for foundation, footing, bases of columns, etc for mass concrete.(as per DSR 5.9.1/2007/PAGE NO 89)	4	6.00		0.3	7.20	SQM
		4	2.00		3.1	24.80	SQM
					Total	32.00	SQM
f	Mild steel or iron in plain work such as reinforced concrete or reinforced brick work (when not included in over all rates) wrought to required shape as necessary including bending for proper completion of the work and including supply of steel its wastage bend looks and authorized overlapping shall be measured up to floor two levels.((UP PWD SI N0 504 /2008)						
	8 mm dia RING @ 150 C/C	44	2.00		0.395	34.76	KG
	12 mm dia @ 150 C/C	4	18.00	1.30	0.89	83.30	KG
	16 mm dia	32	3.90		1.58	197.18	KG
17	**CONSTRUCTION OF BOUNDRY WALL**						
a	Class -150 brick work in 1:3 cement & coarse sand mortar in foundation & plinth including supply of all material ,labour , T&P, and plants etc. required for proper completion of work .(As per PWD SI NO 307/2008)						
	wall	1	196	0.23	0.75	33.81	CUM
	columns	40	0.23	0.46	0.75	3.17	CUM
					Total	36.98	CUM
b	Providing & fixing dholpur stone work for wall lining etc (venner work) 40 mm thick in cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) including pointing joining in white cement mortar 1:2 (1 cement : 2 stone dust) with an admixture of pigment matching the stone shade.(as per PWD SI NO 1/CH-18/2008)						
		2	104	0.75		156.0	SQM
	columns	1	104	0.75		78.0	SQM
		40	1.38	2.5		138.0	SQM
					TOTAL	372.0	SQM

A/c
EE

Dy
C.E.

c	Mild steel or iron work in heavy size such as trusses,build up gates,record racks, roof work ,gates etc wrought to required from including drilling holes riveting or welding where necessary and their fixing required for proper complition of work.(As per PWD SI NO 503/2008).Weight of gate @ 17.5 kg/ sqm	46	4.5	1.75	17.5	6339.4	kg
d	Applying priming coat over new steel and other metal surface up to 10 cm in width or girth or small articles not exceeding 0.1 sqm area after and including preparing the3 surface by throughly cleaning oil, grease, dirt and other foreign matter and scoured with wire brushes, fine steel wood scraper and papering and knotting including cost of all material s, labour,T&P , etc required for proper complition of work.(As per PWD SI NO / 19.4/2008)	46	4.5	1.75		362.25	
e	Painting two coat over priming coat (but excluding cost of priming coat) on steel & other metal sufrface up[to 10 cm width or girth or small articles not exceeding 0.1 sqm in area syntthetic enamel such as luxol-3, higloss apcolite superlac , delux specified brushing to give an even sheadand including cleaning the surfaceof all dirt , dust and other foreign matter sand papering , and stopping including cost of all material s, labour,T&P , etc required for proper complition of work.(As per PWD SI NO / 19.3/2008.)	46	4.5	1.75		362.25	
18	**CONSTRUCTION OF PARKING AREA**						
	Earth in cutting or in embankment in ordinary soil excavation to be done form of regular pits not exceeding 1/2 m in depth and work embankment to be in 20 cm layers including ramming & dressing the surface to required levels and also including 4.5 m lift and 30 mt lead. The earth from cutting to be used in making embankment or to be deposited as spoil banks with in 30 mt distance as directed by the Engineer-in-charge(UP PWD SI N0 253 (A) /2008	1.00	80.00	5.00	1.30	520.00	CUM
b	Construction of embankment with approved material soil-clayey sand with CBRI > 6 obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site , spreading , grading to required slope and compacting to meet requirement of table 300-2.(as per MORTH 305, SR NO 3.16) in attached parking area with Prenasthal.	1.00	80.00	5.00	0.50	200.00	CUM
c	Construction of subgrade and earthen shoulders with Soil -Clayey sand with CBR > 8 obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site , spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of table 300-2 (AS PER MORTH 305/SR NO 3.18)	1.00	80.00	5.00	0.50	200.00	CUM
d	Construction of granular sub base (GSB) by providing coarse graded material , spreading in uniform layers with motar grader on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC and compacting with vibratory roller to achieve the desired density complete as per MORTH clause 401,Grading-II (table 400-2)	1.00	80.00	5.00	0.15	60.00	CUM

EE CE

458

e	Providing & laying Lean Cement Concrete 1 : 4 :8 with 40 mm gauge stone ballast : coarse sand : cement over a prepared sub-grade with coarse and fine aggregate. The concrete to be prepared in a batching plant, laid in proper slope and camber and compacted with pin / surface vibrator including curing etc. all complete. (as per PWD SI NO 281 /2008)	1.00	80.00	5.00	0.15	60.00	CUM
f	Providing & laying of 125 micron polythene under the C.C.pavement over lean cocncrete surface for antislip tier treatment	1.00	80.00	5.00		400.00	SQM
g	Providing & laying C.C pavement of mix M25 with ready made mixed concrete from batching plant. The ready mixed concrete shall be laid and finished with screed boared vibrator , vacuum dewatering process and finally finished by floating , brooming with wire brush etc. complete as per specifications and direction of Engineer-in- Charge . (The shuttering work shall be paid for separately.)(As per DSR 16.75 /2007)	1.00	80.00	5.00	0.20	80.00	CUM
h	Providing & fixing in position pre-moulded joint filler in expansion joints.(as per DSR 16.45 /2007)Center (20 cm deep & 1.2 cm width)(Panel size 2.5 x 2.5 mt)	1.00	80.00			3120.00	RMT
i	Centering & shuttering including strutting ,propping etc & removal of firm for foundation, footing, bases of columns, etc for mass concrete.(as per DSR 5.9.1/2007/PAGE NO 89))(Panel size 2.5 x 2.5 mt)	13.00	10.00		0.20	26.00	SQM
	Cartage for disposal of excavated earth & malba etc including loading & unloading up to 5.0 kms distance.	1.00	SAME AS ITEM NO 1			520.00	CUM
19	**CONSTRUCTION OF TOILET, GUARD CABIN, ELECTRICAL ROOM**						
	EARTH WORK						
a	Earth work in excavation in foundations in ordinary soil (loame clay or sand) including lift up to 1.5 mt & lead up 30 mt and including filling watering and ramming of excavated earth in to the trenches or in to the space between the building and the sides of foundation trenches or in to the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by the engineer- in - charge up to a distance of 30 m from the foundation trenches. (as per SI NO 251a)						
	VERTICAL WALLS , 230 MM TH	3	3.50	0.8	0.75	5.91	cum
		2	1.80	0.8	0.75	2.03	cum
	HORIZONTAL WALLS	2	3.00	0.8	0.75	3.38	cum
		3	3.00	0.8	0.75	5.06	cum
		2	1.20	0.8	0.75	1.35	cum
		2	3.60	0.8	0.75	4.05	cum
					TOTAL	21.77	cum
b	**CONCRETE WORK**						
i	Providing & laying cement concrete 1 : 4 :8 with 40 m. gauge stone ballast coarse sand and cement & curing complete, including cost of form work in foundations and under floors.						
		3	3.50	0.8	0.10	0.79	cum
		2	1.80	0.8	0.10	0.27	cum
		2	3.00	0.8	0.10	0.45	cum
		3	3.00	0.8	0.10	0.68	cum
		2	1.20	0.8	0.10	0.18	cum

C.E

COMMISSIONER FOR OATHS

		2	3.60	0.8	0.10	0.54	cum
					TOTAL	2.90	cum
ii	Concrete with 4.0cm gauge B/Ballast, coarse sand and cement in proportion of 12 : 6 : 1 in foundations and under floors. including supply of all materials , labour Tools & Plants etc. required for proper completion of the work.						
	TOILET	1	3.30	3.3	0.15	1.63	cum
	GUARD ROOM	1	1.80	1.2	0.15	0.32	cum
	ELECTRICAL	1	3.00	3.6	0.15	1.62	cum
					Total	3.58	cum
iii	R.C.C. work with cement , approved coarse sand and 20mm gauge stone grit in proportion of 1 :1.5:3 in lintels of doors & windows excluding supply of reinforcement and its bending but including its xing and binding the same with 24B.W.G.G.I. binding wire and including necessary centering and shuttering etc and supply of all materials , labour , Tools & plant etc. required for proper completion of the work including cost of winding wire.(as per SI NO 283)						
iv	Lintels over doors & windows						
	D1	6	0.90	0.23	0.15	0.19	cum
	V	8	0.90	0.23	0.15	0.25	cum
					TOTAL	0.43	cum
v	**AS in item no 283 but for slab.**						
	TOILET	1	3.75	3.75	0.10	1.41	cum
	GUARD ROOM	1	2.40	1.8	0.10	0.43	cum
	ELECTRICAL	1	3.90	4.1	0.10	1.60	cum
					TOTAL	3.44	cum
c	M.S. (tor steel or plain) in plain work such as R.C.C.or R.B. work including for proper shape and including supply of steel & its wastage bend , hooks and authorized overlapping shall be measured and including cost of binding wire.(as per SI NO 504)	**3.87 x 1.0% x7850= 303.8 KG**					**kg**
d	**BRICK WORK**						
i	M 150 Brick work in 1 : 6 cement and coarse sand mortor in foundation & plinth including supply of all materials , labour Tools & Plants etc. required for proper completion of the work. (as per SI NO 303)						
	TOILET	6	3.30	0.58	0.15	1.71	cum
		6	3.30	0.46	0.15	1.37	cum
		6	3.30	0.23	0.45	2.05	cum
	GUARD ROOM	2	1.80	0.58	0.15	0.31	cum
		2	1.80	0.46	0.15	0.25	cum
		2	1.80	0.23	0.45	0.37	cum
		2	1.20	0.58	0.15	0.21	cum
		2	1.20	0.46	0.15	0.17	cum
		2	1.20	0.23	0.45	0.25	cum
	ELECTRICAL	2	3.00	0.58	0.15	0.52	cum
		2	3.00	0.46	0.15	0.41	cum
		2	3.00	0.23	0.45	0.62	cum
		2	3.60	0.58	0.15	0.62	cum
		2	3.60	0.46	0.15	0.50	cum

		2	3.60	0.23	0.45	0.75	cum
					TOTAL	10.09	cum
ii	M 150 Brick work in 1 : 6 cement and coarse sand mortor in super structure including supply of all materials , labour Tools & Plants etc. required for proper completion of the work. (as per SI NO 310)						
	TOILET	6	3.30	0.23	2.70	12.30	cum
	GUARD ROOM	2	1.80	0.23	2.70	2.24	cum
		2	1.20	0.23	2.70	1.49	cum
	ELECTRICAL	2	3.00	0.23	2.70	3.73	cum
		2	3.60	0.23	2.70	4.47	cum
				Total		8.20	
	Doors, windows & ventilators						
e	Supply of M.S. sheet 18 gauge (1.25 mm) pressed steel door chaukhat including S/F of iron but hinges of 100 x 3 mm I.S.I. mark with drilling holes for L-droop and pipes 15 x 12 mm C leats for tower bolt and 40 x 6 mm hold fast 230 mm long including supply of all materials labour T & P carriage upto site required for proper completion of work as per directed by engineer incharge E/I. (S.I. no. 14/2008)						
	Section 100 x 50 mm. for single rebate door chaukhat with 6 hinges.	6	5.10			30.60	Rmt
f	S / Fixing commercial flush door with teak wood vineer 35 mm th of approved make & shade as per drawing complete. with all require hard ware as approved .						
	Doors (D1)	6	0.90		2.10	11.34	sqm
					TOTAL	11.34	sqm
g	**PLASTERING WORK**						
i	10 mm cement plaster with cement and coarse sand of (1.5 to 1.75)fineness modules in 1:6 over brick work minimum the not to be less than 1cm. Including supply of all materials ,labour , T& P , etc require for proper completion of work.(S.I no 586+ (553-582)						
	INSIDE						
	TOILET	8	3.30		2.70	71.28	sqm
	GUARD ROOM	2	1.80		2.70	9.72	sqm
		2	1.20		2.70	6.48	sqm
	ELECTRICAL	2	3.00		2.70	16.20	sqm
		2	3.60		2.70	19.44	sqm
					TOTAL	51.84	sqm
ii	OUTSIDE (15 mm th) in 1:4 cement & coarse sand mortar						
	TOILET	4	3.30		3.00	39.60	sqm
	GUARD ROOM	2	1.80		3.00	10.80	sqm
		2	1.20		3.00	7.20	sqm
	ELECTRICAL	2	3.00		3.00	18.00	sqm
		2	3.60		3.00	21.60	sqm
					TOTAL	57.60	sqm
h	**FLOORING WORK**						

1299 ~~1308~~ 44.

250

i	40 mm thick cement concrete flooring 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate of size 20 mm nominal size) laid in one layer finished with floating coat of neat cement).(as per PWD SI NO 665.00/ 14.71 NBO /2008)						
	GUARD ROOM	1	1.80	1.20		2.16	
	ELECTRICAL	1	3.00	3.60		10.80	sqm
					Total	**12.96**	**sqm**
ii	P/L ceramic tiles 5 mm thick of approved shade of 300 x 200 mm size on walls of toilets over 1:4 cement & coarse sand mortar including grouting.						
	TOILET	1	3.00	3.00		**9.00**	**sqm**
		8	3.00		2.10	**50.40**	**SQM**
					TOTAL	**59.40**	**SQM**
I	**PAINTING WORK**						
	White washing with lime three coat on ceilings surface to give and even shade including thoroughly broomoing the surface to remove all dirt , dust , mortar drops and other foreign matter.(as per PWD NBO 18.11+18.12 /2008)						
	TOILET	**SAME AS PLASTER**				**24.84**	**sqm**
	GUARD ROOM	**SAME AS PLASTER**				**18.36**	**sqm**
	ELECTRICAL	**SAME AS PLASTER**				**46.44**	**sqm**
					TOTAL	**89.64**	**sqm**

A/E
EE 29.8.08

RV
C.E.
29/8/08
C

pl

1360 ~~1209~~ 95

251

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2008 (M/B)
Sewage Treatment Plant VERSUS State of U.P.
ANNEXURE NO

(2)

NAME OF PROJECT : PROPOSED PARK AT JIAMAU , LUCKNOW					
NAME OF CLINET : LUCKNOW NAGAR NIGAM					
NAME OF WORK : CONSTRUCTION OF RETAINING WALL					
S.NO	DESCRIPTION OF ITEMS	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	Boring , providing and installing bored cast-in -situ renforced cement concrete pile of 1000 diameter and length below the pile cap M35 in cement concrete ,to carry a safe working load not less than specified , excluding the cost of steel reinforcement but including the coat of boring with bentonite solution and temporary casing of appropriate length for setting out and removal of excavated earth with all lifts and leads(length of pile for payment shall be measured up to bottom of pile cap.) As per DSR Sl 20 .2 .7 /2007	1560,0	RMT	6220.05	9703278.0
2	Earth work in excavation in foundations in ordinary soil (loame clay or sand) including lift up to 1.5 mt & lead up 30 mt and including filling watering and ramming of excavated earth in to the trenches or in to the space between the building and the sides of foundation trenches or in to the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by the engineer- in - charge up to a distance of 30 m from the foundation trenches. (as per Sl NO 251a)	1185.1	CUM	40.0	47404.0
3	Providing & laying cement concrete 1 : 4 :8 with 40 mm gauge stone ballast coarse sand and cement & curing complete,includingcost of form work in foundations and under floors. (as perPWD SI NO 281 /2008)	15.6	CUM	2500.0	39000.0
4	Providing & laying inposition machine batched, machine mixed and machine vibrated design mix cement concrete of M35 grade for reinforced cement conctete work including pumping of concrete to site of laying but excluding the cost of centering, shuttering ,finishing and reinforcement,including admixtures in recommended proportion as per IS 9103 to accelerate , retard setting of concrete , improve workability without impairing strength and durability as per direction of Engineer -in -charge.(AS PER DSR Sl NO 5.34.2 /2007)	4316.0	CUM	4245.6	18324009.60
5	Centering & shuttering including strutting , proping etc. removal of form work for				
i	Foundation, fottings, bases of columns etc for mass concrete. As per DSR Sl NO 5.9.1 /2007	436.0	Sqm	119.25	51993
II	Walls of any thickness including attached pilasters, butteresses, plinth and string coarses etc.As per DSR Sl NO 5.9.2 /2007	3924.0	Sqm	180.4	707889.6
6	Mild steel or iron in plain work such as reinforced concrete or reinforced brick work (when not included in over all rates) wrought to required shape as necessary including bending for proper completion of the work and including supply of steel its wastage bend looks and authorized overlapping shall be measured up to floor two levels.((UP PWD SI N0 504 /2008)	11823.5	Qtl	5300.0	62664550.0
7	Providing & fixing 75 mm dia PVC pipe sleeves @ 4.0 meter c/c longitudinally	390.0	RMT	139.0	54210.0

EE

CE

1301 ~~D10~~ 96. 252

8	Providing & fixing steel welded mesh 1"x 2" sixe with 10 ms gauge wire over laid with 22.5-53 mm stone grite approximate 8"x 8" x4" further over laid with over burnt brick ballast 40 mm gauge in size of 12" x12"x6" to work as filter media over weep holes.aggregate as filter media .	312	NOS	40.81	12732.72
9	Filling of avialable excavated earth in trenches, plinth, sides of foundation etc in layers not exceeding 20 cms in depth . Consolidation each deposited layers by ramming and watering including lead up to 50 m and lift up to 1.5 mt .(As per PWD SI NO NBO 4.12/2008)	633.9	CUM	23.0	14579.7
				TOTAL	91619646.6
	RS NINE CRORE SIXTEEN LACKS NINTEEN THOUSAND SIX HUNDREAD FOURTY SEVEN ONLY.			SAY	91619647.0

26/2/2018 EE

27/2/18 C.E.

COMMISSIONER FOR OATHS

1302 (2) 17.253

NAME OF PROJECT : PROPOSED PARK AT JIAMAU , LUCKNOW

NAME OF CLINET : LUCKNOW NAGAR NIGAM

NAME OF WORK : CONSTRUCTION OF RETAINING WALL

S.NO	DESCRIPTION OF ITEMS	NO	LENGTH	BREADTH	HT/DEPTH	QTY	UNIT
1	Boring , providing and installing bored cast-in -situ renforced cement concrete pile of 1000 diameter and length below the pile cap M35 in cement concrete ,to carry a safe working load not less than specified , excluding the cost of steel reinforcement but including the coat of boring with bentonite solution and temporary casing of appropriate length for setting out and removal of excavated earth with all lifts and leads(length of pile for payment shall be measured up to bottom of pile cap.) As per DSR Sl 20 .2 .7 /2007	104			15.0	1560.0	RMT
2	Earth work in excavation in foundations in ordinary soil (loame clay or sand) including lift up to 1.5 mt & lead up 30 mt and including filling watering and ramming of excavated earth in to the trenches or in to the space between the building and the sides of foundation trenches or in to the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by the engineer- in - charge up to a distance of 30 m from the foundation trenches. (as per SI NO 251a)	1	104.0	5.3	2.2	1185.1	CUM
3	Providing & laying cement concrete 1 : 4 :8 with 40 mm gauge stone ballast coarse sand and cement & curing complete,includingcost of form work in foundations and under floors. (as perPWD SI NO 281 /2008)	1	104.0	5.0	0.15	15.6	CUM
4	Providing & laying inposition machine batched, machine mixed and machine vibrated design mix cement concrete of M35 grade for reinforced cement conctete work including pumping of concrete to site of laying but excluding the cost of centering, shuttering ,finishing and reinforcement,including admixtures in recommended proportion as per IS 9103 to accelerate , retard setting of concrete , improve workability without impairing strength and durability as per direction of Engineer -in -charge.(AS PER DSR SI NO 5.34.2 /2007)						
	PILE CAP	1	104.0	5.00	2.00	1040.0	CUM
	RETAINING WALL	1	104.0	(3.0+0.5)/2	18.0	3276.0	CUM
					TOTAL	4316.0	CUM
i	Centering & shuttering including strutting , proping etc. removal of form work for						
	Foundation, fottings, bases of columns etc for mass concrete. As per DSR SI NO 5.9.1 /2007						
		1	218.0		2.0	436.0	sqm
II	Walls of any thickness including attached pilasters, butteresses, plinth and string coarses etc.As per DSR SI NO 5.9.2 /2007						
		1	218.0		18.0	3924.0	sqm
6	Mild steel or iron in plain work such as reinforced concrete or reinforced brick work (when not included in over all rates) wrought to required shape as necessary including bending for proper completion of the work and including supply of steel its wastage bend looks and authorized overlapping shall be measured up to floor two levels.((UP PWD SI N0 504 /2008)						
	Concrete work in pile cap & in retaining wall	as per item no 4				3796.0	CUM
	Concrete work in piles (x-sec area - 3.14x1x1 /4)	104	0.785		15.0	1224.6	CUM

9/8/2018

5/6

C.E.

1303 +2 48 254

						5020.6	CUM
7	Providing & fixing 75 mm dia PVC pipe sleeves @ 4.0 meter c/c longitudinally	5020 .6 x3 % x 7850= 1182351.13 kg				11823.51	Qtls
		1	312	1.25		390	RMT
8	Providing & fixing steel welded mesh 1"x 2" sixe with 10 ms gauge wire over laid with 22.5-53 mm stone grite approximate 8"x 8" x4" further over laid with over burnt brick ballast 40 mm gauge in size of 12" x12"x6" to work as filter media over weep holes.aggregate as filter media .						
		312				312	NOS
9	Filling of avialable excavated earth in trenches, plinth, sides of foundation etc in layers not exceeding 20 cms in depth . Consolidation each deposited layers by ramming, and watering including lead up to 50 m and lift up to 1.5 mt .(As per PWD SI NO NBO 4.12/2008)	as per item no 2				1185.10	CUM

20/8/08 EE

20/2/08 CE

1304

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2008 (MB)
Sewage Treatment Plant VERSUS State of U.P.
ANNEXURE NO 5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं / Ref. No. ८०५९९८ /सी–५/सा०–११/एस०टी०पी०/०८/ दिनांक / Date 22-8-08

सेवा में

अपर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

विषय :–गोमती सेतु के समीप डाले गये कूड़े के निस्तारण हेतु मा०उच्च न्यायालय,लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या डी–३७२/ए०एम०सी०ए०/०८ दिनांक १४–८–२००८ का संदर्भ लेना चाहें। उपरोक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड की तकनीकी समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ टिप्पणी संलग्न की जा रही है।

उक्त के अनुक्रम में यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि चूँकि नीरी, नागपुर के विशेषज्ञों द्वारा पूर्व में स्थल का सर्वेक्षण कर सुझाव दिये गये थे, अतः आप द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव पर क्रियान्वयन से पूर्व नीरी, नागपुर का अभिमत / विशेषज्ञ टिप्पणी प्राप्त किया जाना उचित होगा।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
Swami Nath Ram
(स्वामी नाथ राम)
मु०पर्या०अधिकारी, वृत्त–५

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681

Pickup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681

गोमती सेतु के समीप डालें गये कूडे के निस्तारण के प्रकरण पर नगर निगम के पत्रांक डी–३७२/ ए०एम०सी०ए०/०८ दिनांक १४.०८.२००८ के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर तकनीकी समिति की टिप्पणी

१. नगर निगम के प्रस्ताव में सेक्सन बीबी व सेक्सन एए किस स्थान का है स्पष्ट नहीं है। फिर भी प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर टिप्पणी निम्नवत है:–
यदि आपशन (१) के अनुसार नदी तट पर पडें एमएसडब्लू को नहीं हटाया जाना है तो आपशन (२) के अनुसार पडें हुए वेस्ट से लीचेट के नियंत्रण हेतु नीरी की पृष्ठ ६ की रिपोर्ट के अनुसार रिटेनिंग वाल एवं पूरे कूडे के उपरी सतह पर फाइनल कवर बिछाना उचित होगा। परन्तु इसमें एचडीपीई सीट १.५ मिमी. की जगह २.० मिमी. मोटी इस्तेमाल करना उचित होगा तथा एचडीपीई सीट को रिटेनिंग वाल तथा अन्य साईडस् तक इस प्रकार बिछाई जाए कि कोई गेप न रहे, जिससे पानी percolate न करें।

२. एचडीपीई सीटस् के ज्वाइंट पर हाटवेज वेल्डिंग कराई जाए तथा थर्ड पार्टी टेस्टिंग कराई जाए। रिटेनिंग वाल की स्ट्रेक्चरल डिजाइन थर्ड पार्टी से चेक कराई जाए

३. नीरी के सुझाव कि "a retaining wall must be constructed near the dump to act as barrier between the leachate & contaminated ground water, and the river water. This should be done in consultation with appropriate regulatory agencies, experts in the field, and considering hydro geological properties of the area " के संबंध में नीरी से ही अथवा हाईड्रोजिओलोजिकल एक्सपर्ट से सुझाव प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जाए. क्यों कि रिपोर्ट से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है।

४. एमएसडब्लू रूल्स, २००० के सेड्यूल ३ में दिये गये specification for land fill sites के बिन्दू संख्या ३१ व ३२ जो कि क्लोजर आफ लैण्डफिल साईट एण्ड पोस्ट केयर से सम्बन्धित हैं, का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार बिन्दू संख्या २५ के अनुसार लैण्डफिल गैस कन्ट्रोल सिस्टम स्थापित करने पर विचार किया जाए यदि यह व्यवहारिक हो । परन्तु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि गैस कन्ट्रोल सिस्टम न लगाने की स्थिति में अन्य गम्भीर समस्यायें तो उत्पन्न नहीं होगी।

५. एमएसडब्लू रूल्स के बिन्दु संख्या ३२ को देखते हुए वर्तमान में नगर निगम द्वारा प्रेषित प्लान में वेस्ट के ऊपर दर्शाई गयी पार्किंग की व्यवस्था की अनुमति दिया जाना उचित नहीं होगा क्यों कि इससे एचडीपीई सीट पन्चर हो सकती है।

Swami Nath Ram

स्वामी नाथ राम
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता
उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
लखनऊ

1346

257

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2008 (M/B)
Sewage Treatment Plant VERSUS State of U.P.
ANNEXURE NO 6

बैठक कार्यवृत्त
दिनांक: 30.07.2008

प्रेषक,

आयुक्त,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

प्रेष्य,

1 जिलाधिकारी, लखनऊ।
2 उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3 नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
4 अपर जिलाधिकारी, भू0अध्या0, लखनऊ।
5 प्रभागीय वन अधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
6 प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7 इ0 वीरउदयन बिश्नोई, महाप्रबन्धक, गो0प्र0नि0इ0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8 श्री पी0एन0 टण्डन, क्षे0अभि0 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9 महाप्रबन्धक, जल संस्थान, लखनऊ।

संख्या: 4896/ए0सी0(ए0)/सौ0-प्रदूषण-बैठक/2008, दिनांक: 7 अगस्त, 2008

विषय: गोमती एक्शन प्लान की बैठक दिनांक 30.07.2008 का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

आयुक्त, लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में दिनांक 30.07.2008 को गोमती एक्शन प्लान की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः कृपया संलग्न कार्यवृत्त में अंकित अपने विभाग से सम्बन्धित निर्देशों पर आवश्यक कार्यवाही कराने तथा कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि-

भवदीय,

(शिव श्याम मिश्र)
अपर आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार-

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक यथोपरि-

(शिव श्याम मिश्र)
अपर आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

1307

(126)

52 258

आयुक्त, लखनऊ मण्डल, ल॰ की अध्यक्षता में गोमती एक्शन प्लान तथा लक्ष्मण मेला मैदान से सम्बन्धित याचिका स॰ 5370(एम0बी0)/2008 रमेश कपूर बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य से सम्बन्धित बैठक दिनांक 30.07.2008 को अपरान्ह् 4.30 बजे लाल बहादुर शास्त्री भवन(एनेक्सी) में प्रमुख सचिव, सूचना महोदय के समाकक्ष में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में गोमती एक्शन प्लान तथा लक्ष्मण मेला मैदान से सम्बन्धित याचिका संख्या 5370(एम0बी0)/2008 रमेश कपूर बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य से सम्बन्धित बैठक दिनांक 30.07.2008 का कार्यवृत्त निम्नवत प्रस्तुत है:-

1 बैठक में समस्त सम्बन्धित अधिकारियों की उपस्थिति निम्नवत है:-

- श्री एस0आर0 लाखा, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- श्री चन्द्रभानु, जिलाधिकारी, लखनऊ।
- श्री मुकेश कुमार मेश्राम, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- श्री शिवानन्द ओझा, अपर आयुक्त(प्रशासन), लखनऊ मण्डल।
- श्री शिव श्याम मिश्र, अपर आयुक्त, लखनऊ मण्डल।
- डा0 सी0एस0 भट्ट, सदस्य सचिव, उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड, लखनऊ।
- डा0 अनिल कुमार, अपर जिला मैजिस्ट्रेट(नगर), लखनऊ।
- श्री ए0सी0 सिन्हा, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
- श्री स्वराज कुमार, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम उ0प्र0, लखनऊ।
- श्री वीर उदयन बिश्नोई, महाप्रबन्धक, गोमती, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- श्री आर0के0 सिंह, मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- श्री राम अवध, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
- श्री जय पाल सिंह, मुख्य अभियन्ता, शारदा, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
- श्री राम केवल प्रसाद, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ।
- श्री अशोक मिश्र, प्रभागीय वन अधिकारी, अवध, लखनऊ।
- श्री अनिल कुमार, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
- श्री पी0एन0 टण्डन, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- श्री टी0पी0 वर्मा, तहसीलदार सदर, लखनऊ।

2 लखनऊ नगर के जलोत्सारण की महायोजना के सम्बन्ध में निम्नवत अवगत कराया गया:-

क- सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1- हुसैनाबाद, बालागंज, हरदोई रोड़, कैम्पवेल रोड क्षेत्र इत्यादि के सीवेज शोधन संयंत्र का प्रस्तावित स्थल दौलतगंज है जिसकी प्रस्तावित क्षमता 14 एमएलडी तथा निर्मित क्षमता 42 एमएलडी है।

ख- सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-2- शारदा नगर के दक्षिण के समस्त क्षेत्र तथा सरोजनी नगर, आशियाना, कृष्णा नगर इत्यादि के सीवेज शोधन संयंत्र का प्रस्तावित स्थल ख्वाजापुर है जिसकी प्रस्तावित क्षमता 54 एमएलडी है।

ग- सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-3- यह योजना दो भागों में विरचित की गई है। ट्रांस गोमती क्षेत्र तथा जानकीपुरम, अलीगंज, महानगर, इन्दिरानगर, गोमती नगर इत्यादि के सीवेज शोधन संयंत्र का प्रस्तावित स्थल भरवारा है, जिसकी प्रस्तावित क्षमता 345 एमएलडी है।

घ- सीवरेज डिस्ट्रिक्ट 4 लखनऊ नगर के मुख्य भाग अर्थात गोमती नदी एवं शारदा नहर के मध्य स्थित क्षेत्र यथा राजाजीपुरम, अमीनाबाद, कैसरबाग, राजेन्द्र नगर, हुसैनगंज,

हजरतगंज इत्यादि के सीवेज शोधन संयंत्र का प्रस्तावित स्थल मस्तेमऊ है, तथा प्रस्तावित क्षमता 180 एमएलडी है।

च- बसन्त कुन्ज के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की कार्यवाही दिनांक 31.09.2009 तक पूर्ण कराये जाने हेतु समय निर्धारित किया गया है। यह कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा किया जाना है।

छ- बिजनौर-ख्वाजापुर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की कार्यवाही जल निगम उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किया जाना है।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लविप्रा/महाप्रबन्धक, गोमती,, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ)

3- गोमती कार्य योजना(द्वितीय चरण) के अर्न्तगत निम्नलिखित कार्य की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई। इन कार्यो की प्रगति निम्नवत प्रस्तुत है:-

- एन0ई0आर0 डाउन स्ट्रीम आई/डी कार्य की अनुमानित लागत रू0 95.50 लाख के सापेक्ष रू0 113.00 लाख व्यय किया गया।
- चाइना बाजार नाला आई/डी कार्य की अनुमानित लागत रू0 124.21 लाख के सापेक्ष रू0 107.00 लाख व्यय किया गया।
- ला-प्लास नाल आई/डी कार्य की अनुमानित लागत रू0 135.32 लाख के सापेक्ष रू0 101.00 लाख व्यय किया गया।
- जापलिंग रोड नाला आई/डी कार्य की अनुमानित लागत रू0 123.70 लाख के सापेक्ष 90.10 लाख व्यय किया गया।
- लामार्टिनियर एवं जियामऊ नाला आई/डी कार्य की अनुमानित लागत रू0 207.99 लाख के सापेक्ष रू0 212.00 लाख व्यय किया गया है।
- जी0एच0 कैनाल आई/डी कार्य की अनुमानित लागत रू0 3142.25 के सापेक्ष रू0 11.40 लाख व्यय किया गया है।
- महेशगंज नाला आई/डी कार्य की अनुमानित लागत रू0 98.96 लाख के सापेक्ष रू0 132.00 लाख व्यय किया गया है।
- रूद्रपुर खदरा नाला आई/डी कार्य की अनुमानित लागत रू0 138.17 के सापेक्ष रू0 254.00 लाख व्यय किया गया है।
- मोहन मीकिन नाला आई/डी कार्य की अनुमानित लागत रू0 188.43 लाख के सापेक्ष रू0 352.00 लाख व्यय किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में यह निर्णय पूर्व में ही लिया जा चुका है कि सभी परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कर लिया जाये। योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु समय सीमा का निर्धारण पूर्व में ही किया जा चुका है। इसमें किसी प्रकार का विचलन न हो। जल निगम द्वारा चैनल रिमॉडलिंग हेतु रू0 173.50 लाख एवं इसी प्रकार रू0 195.20 लाख की जो अतिरिक्त धन की माँग की गई है उसे पूर्व में स्वीकृत कार्यो में हुई बचतों से वहन किया जाय। इस बिन्दु पर एम0डी0 जल निगम तथा श्री विश्नोई, जी0एम0, गोमती, जल निगम, लखनऊ ने सहमति जताई है कि वह कोई अतिरिक्त धन की माँग न करके बचतों से ही आवश्यक नये कार्य पूर्ण करायेंगे।

(कार्यवाही: महाप्रबन्धक, गोमती, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ)

4- गोमती एक्शन प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई जिसमें निम्नवत [illegible] प्रगति से अवगत कराया गया है:-

- जौनपुर में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान हेतु डीपीआर तैयार कर शासन में [illegible]त किया जा चुका है।
- सुल्तानपुर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान हेतु डीपीआर तैयार क[illegible]या जा रहा है जो सितम्बर, 2008 तक पूर्ण कर शासन में प्रस्तुत किया जायेगा।

निर्णय लिया गया कि दिनांक 30.08.2008 तक डीपीआर की समस्त कार्यवाही पूर्ण करके शासन में प्रस्तुत किया जाये।

- पीलीभीत, लखीमपुर तथा सीतापुर में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान हेतु किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अवगत कराया गया है कि इन जनपदों में सीवेज का दूषित पानी गोमती में प्रवाहित नहीं कराया जाता है।

(कार्यवाही: महाप्रबन्धक, गोमती, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ)

5- सालिड वेस्ट मैनेजमेंन्ट हेतु 40.19 हे0 हरदोई रोड पर तथा 38.771 हे0 देवा रोड पर भूमि अर्जन की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा की जायेगी।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ)

6- नदी के अन्दर के भूभाग पर अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

निर्णय लिया गया कि अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य सर्वोच्च वरीयता के आधार पर कराया जाय तथा यह भी निर्णय लिया गया कि एक टीम बनाकर स्थल पर भेज दिया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि अवैध कब्जेदार सम्बन्धित स्थल के मूल निवासी है अथवा नहीं, यदि न हो तो उन्हें सर्वोच्च वरीयता के आधार पर हटवा दिया जाये एवं पुनर्वासन की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(कार्यवाही: जिलाधिकारी, लखनऊ)

7- वृक्षारोपण की सम्पूर्ण कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी है। प्रभागीय वन अधिकारी अपने पर्यवेक्षण में यह कार्य निष्पादित करायेंगे यह सुनिश्चित करेंगे कि रिक्त भूमि पर जो भूखण्ड उपलब्ध है, वहाँ तत्काल कार्य प्रारम्भ कर दिया जाये तथा दिनांक 15.08.2008 तक सम्पूर्ण वृक्षारोपण की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये तथा किसी भी स्थिति में और विलम्ब न किया जाये। इस कार्य की समीक्षा दिनांक 16.08.2008 को पुनः की जायेगी।

(कार्यवाही: डीएफओ, लखनऊ)

8- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपनी पाक्षिक आख्या, जिसमें उस जनपद में प्रदूषण की स्थिति की गत पक्ष से तुलनात्मक स्थिति का विवरण सम्मिलित हो, नियमित रूप से परिषद को उपलब्ध कराई जाये। जिन औद्योगिक इकाईयों को निरीक्षण के दौरान ईटीपी न चलाये जाने के कारण बन्द किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जाये कि जब तक प्रदूषण रहित उत्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक इकाई का संचालन नहीं किया जा सकता है।

1310 (72/9) 261

55

Amc (A)

यह निर्णय लिया गया कि औद्योगिक इकाईयों के स्थलों का पुनः सर्वेक्षण करा जाये कि प्रदूषित जल का बहाव निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाये तो औद्योगिक इकाई को तत्काल बन्द करा दिया जाये।

(कार्यवाही: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ)

9- धोबी घाट की स्थापना हेतु नगर निगम, लखनऊ द्वारा चिन्हीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है, इनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी है। यह अवगत कराया गया कि लगभग 570 धोबी है जिनके लिए लगभग 24 स्थानों पर धोबी घाटों का निर्माण किया जाना है। नगर विकास विभाग एक सप्ताह में एक एक्शन प्लान बनाकर विस्थापित धोबियों के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करायेगा। इसकी शुष्क शौचालयों को हटाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ एवं नगर निगम, लखनऊ दो दिन में कार्यवाही प्रारम्भ करायें।

(कार्यवाही: नगर विकास विभाग/जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ एवं नगर निगम, लखनऊ)

10 **अतिरिक्त विषय**

क- कठौता झील की 113 एकड़ भूमि को मत्स्य विभाग से जल निगम को हस्तान्तरण की कार्यवाही शीर्ष त्वरीयता के आधार पर निष्पादित कराई जाये। इस कार्य में किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाये।

(कार्यवाही: जिलाधिकारी, लखनऊ)

ग- गाँधी सेतु के समीपस्थ जिस स्थल पर नगर निगम, लखनऊ द्वारा कूड़ा डाला गया है उक्त स्थल पर बन्धा बनाया जाने के लिए भूअर्जन की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कर ली जाये तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि दिनांक 20.08.2008 तक भू-अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को निर्देश प्रसारित किए जा चुके है।

अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति समस्त औपचारिकताएं माह अगस्त, 2008 तक अनिवार्यतः निष्पादित कर लें।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष/ल0वि0प्रा0/अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति, लखनऊ)

11- उक्त के साथ ही बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त हो गई।

अनुमोदित

(विजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

1311

~~1211~~ 262

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW.

C. M. Application No. of 2008

State of U. P. ----------Applicant

In re

Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

APPLICATION FOR TAKING ON RECORD

The applicant – respondent above named, most respectfully submit as under:

The applicant is filing the affidavit in the above noted writ petition in compliance of the order dated 21.7.2008 passed by this Hon'ble Court, which is expedient in the interest of justice. Hence the same be taken up on the record of the writ petition.

P R A Y E R

Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow the accompanying affidavit to be taken on the record.

Such other and further order which this Hon'ble Court may deem just, fit and proper under the circumstances of the case may also be passed.

Lucknow

Dated: 25.08.2008

ADDL.CHIEF STANDING COUNSEL

(COUNSEL FOR APPLICANT)

1312 (226) 263

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW .

2008 AFFIDAVIT HIGH COURT ALLAHABAD 0217241

Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

AFFIDAVIT OF DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF U.P., IN COMPLINACE OF THIS HON'BLE COURT'S ORDER DATED 21.7.2008.

I, Ram Sahai aged about 56 years, son of Late Sri Saryu, presently posted as Under Secretary , Department of Urban Development , Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as Under Secretary , Department of Urban Development, Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, and as such he is fully conversant with the facts of the case deposed to hereinafter.

2 .That the deponent has read over the writ petition filed by the petitioner and has understood the contents thereof and is submitting some necessary facts, which are expedient in the

1313

264

interest of justice to be submitted before the Hon'ble Court herein under:

3. That the subject matter of the present writ petition relates to improvement of drinking water situation and sewage disposal system in Lucknow city.

4. That it is submitted that instant matter was listed on 21.7.2008 and on the day this Hon'ble Court pleased to pass an order , and directed to the respondents to submit the up-dated status report. This Hon'ble Court also directed to list the matter on 25.8.2008.

5. That in compliance of the order dated 21.7.2008 passed by this Hon'ble Court, instant affidavit is being filed narrating the facts and records relating to the matter in question.

6. That it is submitted that the U. P. Jal Nigam is an implementing agency on behalf of Nagar Nigam Lucknow and Jal Sansthan , Lucknow for execution, planning and design for drinking water supply, river pollution control work as well as the sewage disposal work. Therefore, the separate affidavit is being filed by the Nagar Nigam, Lucknow, U. P. Jal Nigam and Jal Sansthan , Lucknow in compliance of orders passed by this Hon'ble Court. However, the deponent is filing Zone-wise progress report submitted by the U. P. Jal Nigam. The true photostat copy of the progress details relating to the work performed by the U. P. Jal Nigam in different Zones of the Lucknow City till 18.8.2008 along with the letter dated 20.8.2008 are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 1** to this affidavit.

It is submitted that under the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme, an amount of Rs. 40.00 Crores have been released out of which till date total Rs. 40.00 Crores

1314

265

have been spent; the details of work done, under the Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme are being mentioned as under:

(i). The Jal Nigam prepared detail project report under Jawahar Lal Nehru (National) Urban Renewal Mission Programme under which total 40 + 21 new Tube-Wells were proposed to install, out of which till 18.8.2008, 25 + 3 new Tube-Wells have been installed and they are working, and the installation work with regard to 15 + 13 new Tube-Wells are in progress.

Under Jawahar Lal Nehru (National) Urban Renewal Mission Programme total 43 old Tube-Wells were proposed for repairing, out of which till 18.8.2008, 8 old Tube-Wells have been repaired and they are working, and the repairing work with regard to 28 Tube-Wells are in progress.

The Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme covers about 133.31 Km. of distribution system, out of which the work within 26.0 Km have been completed till 18.8.2008.

The Jawahar Lal Nehru (National) Urban Renewal Mission Programme covers about 14.40 Km. of work relating to rising main, out of which the work relating to 28 numbers of Tube-Wells have been completed till 18.8.2008, and rising main work relating to 11 numbers of Tube-Wells are in progress.

(ii). It is significant to submit that in different Zones of Lucknow City, under the Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme total 28 numbers of new tube-wells have been installed and work relating to

Commissioner LUCKNOW

2570

1315 1228 266

installation of 28 numbers of new tube-wells are under progress till 18.8.2008.

In different Zones, under the Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme total 8 numbers of old tube-wells have been rebored and work relating to reboring of 28 number of old tube-wells are under progress.

(iii). It is significant to submit that under the "Drinking Water Scheme" the works relating to installation of 409 numbers of new hand-pumps were proposed, all of them have been installed and they are under working.

Under the "Drinking Water Scheme" the works relating to special repairing / rebore of 670 numbers of hand-pumps were proposed, all of them have been repaired / rebored and they are under working.

Out of aforesaid hand-pumps, under the "Drinking Water Scheme" the works relating to installation of 5 numbers of new hand-pumps, and rebore of 39 other hand-pumps were proposed, out of them 3 have been installed and all have been rebored.

7. That it is submitted that under Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow during the Financial Year 2008 – 09, in reference to the acquisition of 106.866 Hectare land at village Bharawara, Lonapur and Bhaisora for construction of Sewage Treatment Plant of 370 MLD capacity, the possession on the said land for construction of Sewage Treatment Plant has been taken by the Nagar Nigam, on 16.7.2008, and the compensation is being disbursed to the persons concerned.

It is significant to submit that the construction work relating to sanctioned schemes under Gomti Action Plan Phase

Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

25/8

1316 267

– I have been completed except to three schemes , which are under progress.

It is submitted that several works relating to Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow have been completed and remaining are in progress.

It is significant to submit that work relating to Branch Sewer, and Trunk Sewer under the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme (in Lucknow Sewerage District – I) has been completed in 22.5 Km. and 9.50 Km against the proposed work of 289 Km. of Branch Sewer, and 48.0 Km. of Trunk Sewer.

For Sewage Pumping Station (56 MLD capacity) and Sewage Treatment Plant (14 MLD capacity), the works have been awarded under the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme (in Lucknow Sewerage District – I).

It is significant to submit that due to heavy rain, the works relating to sewer as well as pollution eradication work in river Gomti in district Lucknow have been effected.

The true photostat copies of the progress details relating to the work performed by the U. P. Jal Nigam under the Gomti Action Plan Phase – I ; Gomti Action Plan Phase – II and under the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme (in Lucknow Sewerage District – I) till 20.8.2008 with latest physical / financial progress report are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 2** to this affidavit.

8. That it is submitted that under the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme for disposal of the solid wastes, vide Government Order No. 2055 / 9 – 5 –07 – 3 Budget/ 2007 dated 6th July 2007 an amount of Rs. 209.676 Lakhs have

2578

1317 ~~1226~~ 248

been released by the State Government, which include Rs. 174.730 Lakhs as share granted by the Central Government and Rs. 34.946 Lakhs as share of the State Government. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 6th July 2007 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 3** to this affidavit.

Thereafter, under the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme for disposal of the solid wastes, vide Government Order No. 3349 / 9 – 5 –2007 – 55 Budget/ 2006 T.C. dated 18th October 2007 an amount of Rs. 34.946 Lakhs have been released by the State Government. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 18th October 2007 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 4** to this affidavit.

Further, under the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission Programme for disposal of the solid wastes, vide Government Order No. 3351 / 9 – 5 – 2007 – 55 Budget/ 2006 T.C. dated 18th October 2007 an amount of Rs. ~~506.48~~ 506.548 Lakhs have been released by the State Government. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 18th October 2007 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 5** to this affidavit.

9. That as is evident from the letter No. 376 / AMC (A) / 08 dated 19.8.2008 of the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow that the share related to the Nagar Nigam, Lucknow amounting to Rs.321.60 Lakhs has also been released. The true photostat copy of the aforesaid letter dated 19.8.2008 of the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 6** to this affidavit.

Commissioner Lucknow

257

1318

10. That it is submitted that vide aforesaid letter No. 376 / AMC (A) / 08 dated 19.8.2008, the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow informed to the State Government that for disposal of solid waste, in Lucknow City about 120 Hectare land is needed and same shall be demarcated by the Lucknow Development Authority, Lucknow.

It is significant to submit that for management of solid waste, 40.19 Hectare land shall be acquired at Hardoi Road and 38.77 Hectare land shall be acquired at Deva Road, and the proposal for the same have been submitted by the Lucknow Development Authority, Lucknow to District Magistrate, Lucknow for initiation of the proceedings under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for acquiring 40.19 Hectare land at Hardoi Road and 38.77 Hectare land at Deva Road, Lucknow.

It is significant to submit that in reference to the report dated 17.7.2008 submitted by the NEERI, Nagpur, in pursuance to the recommendations contained as Item No. 5, vide aforesaid letter dated 19.8.2008, the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow informed to the State Government that a plan has been prepared for disposal of garbage near *Gandhi Bridge,* Lucknow, and same has been submitted to the U.P. Pollution Control Board, Lucknow for its verification and special comments.

Thereafter, vide letter dated 22.8.2008, the U.P. Pollution Control Board, Lucknow has submitted its report / comments to the Nagar Nigam, Lucknow. The true photostat copy of the aforesaid letter dated 22.8.2008 of the U.P. Pollution Control Board is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 7** to this affidavit.

2578

1319

~~The Lucknow Development Authority, Lucknow has also proposed to acquire land for construction of Bandhas at the site in question near the Gandhi Bridge, and necessary documents for acquisition of land have also been issued to the concerned department.~~

11. That it is most humbly submitted that vide order dated 21.7.2008, this Hon'ble Court directed that the State Government shall come with specific plan, so that the problems, as mentioned in report may be rectified and appropriate steps be taken. In this regard, it is submitted that on 08.7.2008, a meeting of Uttar Pradesh Rajya Salahkar Parishad has been held in the headship of Chairman of the Parishad for eradication of pollution in River Gomati / Gomati Action Plan; wherein it has been decided that for complete removal of *Jalkumbhi* (जलकुम्भी) from the river Gomati and for assessment of necessity of minimum water and their sources thereat , the Committee constituted earlier shall immediately consult with the Central Water and Power Research Station, Kharagwasla, Pune and to initiate the necessary measures.

12. That in view of facts and circumstances stated herein above, it is significant to submit that the Urban Development Department, State of U.P. is taking all necessary steps in the matter in question.

Lucknow

Dated : 25/8/08

Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of the paragraphs 1, 2 of this affidavit are true to my personal knowledge those of

Civil Commissionerate LUCKNOW Civil Secretariat

2570

1320 ~~221~~ ~~1220~~

paragraphs 3 to 11 are true to my information which derived from the records and those of paragraphs 12 are based on legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God.

Lucknow

Dated : 25.8.08

Deponent

I , identify the deponent who has signed before me.

(ओम प्रकाश चौहान)
कमीशन अधिकारी
नगर दीवानी अनुभाग
3-5-(11)-दीवानी (कमीशन)

Civil Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

25/8

0217241

एक सं०
द्वारा प्रस्तुत की गई
जिसका परिचय श्री ओम प्रकाश चौहान
दिनांक 25-8-08 समय 12:25 बजे अपराह्न
बार संख्या 4436 (रजि० की) / 2003
पक्षकार सेवेज इंडिया हर एवार्ड बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एण्ड अन्य
न्यायालय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ पीठ
शपथ की फीस वसूली गई

अभिसाक्षी ने शपथ - पत्र पढ़ लिया है, और इसकी विषय वस्तु समझता है।

25/08/08

(डा० जटाशंकर त्रिपाठी)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-5 (फौजदारी)
उ० प्र० शासन

ANNEXURE NO. A-1

1321 ~~272~~ (1330)

कार्यालय महाप्रबन्धक गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ0 प्र0 जल निगम लखनऊ

पत्रांक 2663 / एम-24 / 31 दिनांक 27.08.08

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0),
उ0 प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

विषय: **जनहित याचिका संख्या-4436(एम/बी) 2003, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाम उ0 प्र0 राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.7.08 का अनुपालन कराये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उक्त याचिका सं. 4436(एम/बी) 2003, से सम्बंधित वॉछित अद्यतन प्रगति विवरण संलग्न कर सादर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार:

भवदीय

(वी यू0 बिश्नोई)
महाप्रबन्धक

पृष्ठांकनसं0एवंदि0यथोक्त:
प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
(1) विशेष सचिव नगर विकास अनुभाग-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
(2) प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

आज प्राप्त
सांय 5.00 बजे

महाप्रबन्धक

1322

273

जनहित याचिका संख्या 4438(एम.बी.)/2003 पर दिनांक 21.07.2008 को मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के सम्बन्ध में आख्या (पेयजल)

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत लखनऊ नगर पेयजल योजना प्रथमचरण, भाग–1, अनुमानित लागत रू. 388.61 करोड़ के अन्तर्गत तृतीय जलकल गोमतीनगर का कार्य प्रस्तावित है। उक्त जलकल से गोमती नदी के पार स्थित गोमती नगर, इन्दिरा नगर एवं उससे सटी हुई अन्य आवासीय कालोनियों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाना है। उक्त जलकल हेतु कच्चे जल के स्रोत के रूप में शारदा सहायक फीडर कैनाल से कच्चा जल उपलब्ध होना है, जिसके लिये सिंचाई विभाग द्वारा रू. 19.01 करोड़ का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजना के विरूद्ध लखनऊ नगर निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई गई धनराशि से रू. 5.00 करोड़ का भुगतान सिंचाई विभाग को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के विरूद्ध किया जा चुका है।

तृतीय जलकल का निर्माण कार्य आदेशित किया जा चुका है। फर्म द्वारा तकनीकी ड्राइंग एवं डिजाइन प्रस्तुत की जानी है। फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। प्राक्कलन के अनुसार द्वितीय जलकल का कार्य वर्ष 2010 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है। परन्तु इस कार्य को और कम समय में पूर्ण किये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा। तृतीय जलकल की चहारदीवारी, साइट ऑफिस एवं जोनल भूमिगत जलाशयों आदि का कार्य प्रगति पर है।

लखनऊ नगर के विभिन्न समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु जे.एन.एन.यू. आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत 40 नग नये नलकूप एवं 43 नग रिबोर नलकूपों का कार्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त योजना में सम्मिलित पांच पाइप पेयजल योजनाओं में 21 नग अतिरिक्त नलकूपों का कार्य भी प्रस्तावित है। योजना में सम्मिलित 40 नग नलकूपों, जिनको पूर्ण करने के उपरान्त केवल राइजिंग मेन बिछाकर वर्तमान में पड़ी हुई वितरण प्रणाली/उच्च जलाशय के माध्यम से चालू किया जाना है, के अन्तर्गत 25 नग नलकूपों को राइजिंग मेन बिछाकर एवं विद्यमान उच्च जलाशयों/वितरण प्रणाली से संयोजन कर चालू किया जा चुका है, शेष 15 नग नलकूपों का कार्य प्रगति पर है जिनके कार्य अतिवृष्टि के कारण प्रभावित है। उक्त प्रगति वाले नलकूपों में से 8 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य भी प्रगति पर है, जिन्हें अतिशीघ्र पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

शेष 21 नग नलकूप, जो विभिन्न पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित है, उन नलकूपों का उपयोग नलकूप के पूर्ण होने के उपरान्त राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली आदि बिछाकर ही किया जा सकेगा। इनमें से 3 नग नलकूपों को चालू कर जलापूर्ति की जा रही है एवं 13 नग नलकूपों का कार्यप्रगति पर है एवं नलकूपों के उपयोग हेतु वितरण प्रणाली बिछाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

2370

1323

~~234~~ 232

योजना में सम्मिलित 43 नग रिबोर नलकूपों में से 8 नग नलकूप चालू किये जा चुके हैं एवं 28 नग पर कार्य प्रगति पर है। नलकूप के यंत्र–संयंत्र की कमी एवं राइजिंग मेन हेतु पाइप की अनुपलब्धता के कारण प्रगति प्रभावित हो रही है। इसको दूर करने हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

पेयजल योजना सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 5 नग नये नलकूपों का कार्य प्रस्तावित था, जिसमें से 3 नग नलकूप क्रमशः फैजुल्लागंज, विनय खण्ड, गोमतीनगर एवं बी–ब्लाक, राजाजीपुरम, रानी लक्ष्मीबाई पार्क चालू किया जा चुका है एवं राजाजीपुरम ब्लाक–ई एण्ड एफ में प्रस्तावित 2 नग नलकूपों में एक नलकूप का कार्य प्रगति पर है। प्रस्तावित 39 नग रिबोर नलकूपों में से समस्त 39 नग रिबोर नलकूपों को चालू किया जा चुका है जिनसे जलापूर्ति की जा रही है।

लखनऊ नगर में नगरीय पेयजल सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 409 नग नये हैण्डपम्प एवं 670 नग हैण्डपम्पों को रिबोर/विशेष मरम्मत द्वारा चालू किया जाना प्रस्तावित था। उक्त के विरूद्ध समस्त 409 नग नये हैण्डपम्प का अधिष्ठापन कार्य किया जा चुका है एवं 670 नग हैण्डपम्पों को रिबोर/विशेष मरम्मत द्वारा चालू किया जा चुका है।

19/8/08

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक(पेयजल)

23/1

पेयजल योजना -

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 19.07.08 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

सामान्य कार्यक्रम

(रू0 लाख में)

क्रमांक	कार्य का विवरण	प्रस्तावित कार्य की मात्रा	दिनांक 19.07.08 तक कुल प्रगति		दिनांक 18.08.08 तक कुल प्रगति		दिनांक 19.07.08 से 18.08.08 तक कुल प्रगति	
1.	नये हैण्डपम्प	409 नग	409 नग	286.80	409 नग	286.80	-	-
2.	विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प	670 नग	670 नग		670 नग		-	
3.	नये नलकूप	5 नग	3 नग चालू	125.00	3 नग चालू तथा 1 नग प्रगति पर।	140.00	1 नग नलकूप प्रगति पर।	15.00
4.	रिबोर नलकूप	39 नग	39 नग चालू	690.00	39 नग चालू	690.00	-	-
	योग			1101.80		1116.80	1 नग नलकूप प्रगति पर।	15.00

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)

महाप्रबन्धक(पेयजल)

1324

पेयजल योजना

माननीय [illegible] न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 19.07.2008 उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम

(रू. लाख में)

क्रमांक	कार्य का विवरण	प्रस्तावित कार्य की मात्रा	दि. 19.07.2008 तक की प्रगति	दिनांक 18.08.08 तक कुल प्रगति	दिनांक 19.07.08 के उपरान्त प्रगति
1.	नये नलकूप (समस्याग्रस्त क्षेत्रों में)	40 नग	22 नग चालू 18 नग प्रगति पर	25 नग चालू 15 नग प्रगति पर	3 नग चालू, कुल 15 नग पर कार्य प्रगति पर
	नये नलकूप (विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत)	21 नग	3 नग चालू 12 नग प्रगति पर	3 नग चालू 13 नग प्रगति पर	1 नग पर कार्य प्रारम्भ, कुल 13 नग पर कार्य प्रगति पर।
2.	रिबोर नलकूप	43 नग	7 नग चालू 22 नग प्रगति पर	8 नग चालू 28 नग प्रगति पर	1 नग चालू, 6 नग पर कार्य प्रारम्भ। कुल 28 नग पर कार्य प्रगति पर।
3.	वितरण प्रणाली	133.31 कि.मी.	17.00 कि.मी.	26.00 कि.मी.	9.00 कि.मी. का कार्य पूर्ण।
4.	राइजिंग मेन	14.40 कि.मी.	22 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू 8 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर	28 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू 11 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर	6 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू, 3 नग नलकूप की राइजिंग मेन का कार्य प्रारम्भ एवं कुल 11 नग नलकूपों की राइजिंग मेन कार्य प्रगति पर।

योजना पर अवमुक्त धनराशि : रू. 40.00 करोड़
योजना पर अब तक व्यय : रू. 40.00 करोड

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

19/8/08
महाप्रबन्धक(पेयजल)

1326

अनूप नगर में जल संस्थान के विभिन्न जोनों में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

227
1235

दिनांक 18.08.08 तक

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
1.	जोन-1, लालबाग	जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	2 नग चालू, 1 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	3 नग चालू, 6 नग प्रगति पर।
2.	जोन-2, एशबाग।	जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	5 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	-
3.	जोन-3, अलीगंज	जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	10 नग चालू, 5 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	4 नग चालू, 8 नग प्रगति पर।
4.	जोन-4, आलमबाग।	जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	6 नग चालू, 9 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	4 नग प्रगति पर
5.	जोन-5, इन्दिरानगर	जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	9 नग चालू, 4 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	1 नग चालू, 4 नग प्रगति पर।
6.	जोन-6, राजाजीपुरम	जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	1 नग पूर्ण, 4 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	6 नग प्रगति पर।
	योग	नया नलकूप	28 नग चालू, 28 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	8 नग चालू, 28 नग प्रगति पर

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)

महाप्रबन्धक(पेयजल)

370

1327

लखनऊ नगर में जल संस्थान के विभिन्न जोनों में नगरीय पेयजल (सामान्य) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

278
1235

दिनांक 18.08.08 तक

दिनांक 01.04.06 से कराये गये कार्य

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
1.	जोन-1, लालबाग	नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	4 नग पूर्ण एवं चालू।
		मिनी नलकूप	2 नग पूर्ण एवं चालू।
2.	जोन-2, ऐशबाग	नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	7 नग पूर्ण एवं चालू।
		मिनी नलकूप	1 नग पूर्ण एवं चालू।
3.	जोन-3, अलीगंज	फैजुल्लागंज पेयजल योजना	
		नया नलकूप	1 नग पूर्ण एवं चालू।
		स्टाफ क्वार्टर	95 प्रतिशत पूर्ण
		नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	12 नग पूर्ण एवं चालू।
4.	जोन 4, आलमबाग	नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	7 नग पूर्ण एवं चालू।
5.	जोन-5, इन्दिरानगर	विनयखण्ड, गोमती नगर में एक नये एवं एक रीबोर नलकूप का कार्य	
		नया नलकूप	1 नग पूर्ण एवं चालू।
		रीबोर नलकूप	1 नग पूर्ण एवं चालू।
6.	जोन-6, राजाजीपुरम्	'बी' ब्लॉक रानीलक्ष्मीबाई पार्क में नलकूप का निर्माण	1 नग पूर्ण एवं चालू।
		राजाजीपुरम् 'ई' एवं 'एफ' ब्लॉक पेयजल योजना	
		नया नलकूप	1 नग प्रगति पर।
		वितरण प्रणाली	1.00 कि.मी.
		नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	9 नग पूर्ण एवं चालू।
	योग	नया नलकूप	3 नग चालू, 1 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	33 नग पूर्ण एवं चालू
		मिनी नलकूप	3 नग पूर्ण एवं चालू
		नया हैण्डपम्प	409 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत हैण्डपम्प	670 नग

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)

महाप्रबन्धक(पेयजल)

1328

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, पेयजल(द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

379
(1237)

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बालू किये गये नलकूपों की सूची

40 नग नये नलकूपों के अन्तर्गत

क्र0 सं0	नलकूपों का नाम एवं स्थल
1	2
1	अलीगंज सेक्टर-एच
2	इन्दिरानगर डी-ब्लॉक
3	विजयखण्ड, गोमतीनगर
4	अलीगंज सेक्टर-डी
5	गुलिस्ता कॉलोनी
6	अहिबरनपुर सीतापुर रोड
7	त्रिवेणी नगर
8	विकासनगर सेक्टर-9
9	सहयोग पार्क, महानगर
10	जानकीपुरम् सेक्टर-एच
11	हिन्द नगर नलकूप, जोन-4
12	तातारपुर सेक्टर-ई, अलीगंज
13	मेहदीटोला, विष्णुपुरी कॉलोनी
14	शिवपुरी पार्क, गणेशगंज
15	कानपुर रोड योजना, सेक्टर-जे, रेलनगर
16	विनीत खण्ड, गोमती नगर
17	साउथ सिटी, सेक्टर-सी-1
18	दामोदरनगर, आलमबाग
19	इन्दिरानगर बी-ब्लॉक
20	मेवा मार्ग, निशातगंज
21	पंचवटी कॉलोनी, रहीमनगर
22	साउथ सिटी, रश्मि खण्ड
23	विवेक खण्ड-4, गोमतीनगर
24	सेक्टर-आई, एल.डी.ए. कॉलोनी
25	अशोकनगर राजाजीपुरम्

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत प्राक्कलन में सम्मिलित पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत

26	शिवनगर सदर जलकल परिसर
27	मानस विहार कॉलोनी, सर्वोदयनगर
28	लिबर्टी पार्क, सर्वोदयनगर

नगरीय पेयजल योजना सामान्य के अन्तर्गत स्वीकृत नलकूप

29	विनयखण्ड, गोमतीनगर
30	फैजुल्लागंज
31	राजाजीपुरम् बी-ब्लॉक, रानी लक्ष्मीबाई पार्क

परियोजना प्रबन्धक

2370

1329 ~~280~~

र्यालय परियोजना प्रबन्धक, गो0प्र0नि0ई0-।।।(वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

(1238)

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 43 नग रिबोर नलकूपों का कार्य

1	डायमण्ड डेरी कॉलोनी
2	महानगर सेक्टर-डी
3	माता मातादीन
4	जवाहरभवन
5	कमलाकपूर पार्क निरालानगर
6	जानकीपुरम् ए-ब्लॉक
7	पेपरमिल कॉलोनी
8	आर्य समाज मन्दिर गणेशगंज

परियोजना प्रबन्धक

370

1330

ANNEXURE NO. A-2

281
1230

जनहित याचिका संख्या 4436 (एम.बी.)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ0प्र0 सरकार में दिनांक 21.07.2008 को हुई सुनवाई के दौरान मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप अनुपालन आख्या का प्रेषण (सीवर)

गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण अनुमानित लागत रू0 263.04 करोड़ जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.06.2008 को स्वीकृत हुई है, में ककरहा के निकट 370 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाये जाने के कार्य सम्मिलित थे। अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की मूल कार्य लागत रू0 104.22 करोड़ थी।

जुलाई 2006 में मूल प्रस्ताव में चिन्हित स्थान ग्राम बाघामऊ एवं भैंसोरा में 120 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी थी, किन्तु उक्त प्रस्ताव लखनऊ महायोजना-2021 में इसके अधिकांश भाग आवासीय उपयोग में निहित होने के कारण दिनांक 25.09.2007 को राजस्व परिषद, लखनऊ द्वारा वापस कर दिया गया। इसके उपरान्त लखनऊ महायोजना-2021 के अनुरूप ग्राम गुरधारा, लोनापुर एवं भैंसोरा में 120 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु नया प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिस पर नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा धारा-4 एवं धारा-6 की कार्यवाही के उपरान्त, जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही दिनांक 16.07.2008 को किया जा चुका है।

एस.टी.पी. हेतु निविदायें फाइनल की जा चुकी है तथा दिनांक 19.07.2008 से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

एस.टी.पी. के निर्माण कार्यों में 1 वर्ष के समय में पूर्ण किये जाने हेतु सम्बन्धित ठेकेदार से आश्वासन लिया गया है। धन की उपलब्धता पर कार्य को समय से पूर्ण किया जायेगा।

गोमती कार्य योजना प्रथम चरण में अवशेष 2 योजनायें एवं गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण के कार्य प्रगति पर हैं एवं उपलब्ध धन के अनुरूप वांछित प्रगति दी जा रही है, जिसका विवरण संलग्न तालिका (संलग्नक -1 व 2) में दिया गया है। लखनऊ नगर में किये जा रहे सीवर कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति संलग्न है। (संलग्नक-3)

वर्तमान में अतिवृष्टि के कारण सीवर एवं गोमती प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित कार्य प्रभावित हैं।

संलग्नक:- यथापरोक्त।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई-1
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

1331

282
(140)

संलग्नक - 1

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 21.7.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति
गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 21.07.08 तक की प्रगति	दिनांक 20.8.08 तक की कुल प्रगति	दिनांक 21.05.2008 से 20.08.2008 तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	आई. एण्ड डी. कार्य - 6 नग	6 नग	5 नग पूर्ण	5 नग पूर्ण	--
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 5 नग	6 नग	5 नग पूर्ण + 1 नग (25%)	1 नग (30%)	1 नग (5%)
3	राइजिंग मेन - 7525 मीटर	7525 मीटर	5120 मीटर	5120 मीटर	--
4	सीवर लाइन - 20 मीटर	20 मीटर	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
5	स्टाफ क्वार्टर - 4 नग	4 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
6	जेनसेट - 8 नग	8 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
7	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग	1 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
8	भूमि अधिग्रहण - जाब	1 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
9	पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग	25 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
10	विद्युत संयोजन - 6 नग	6 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
11	विविध कार्य - जाब	50%	40%	42%	2%
(ब)	वित्तीय प्रगति				
1.	वित्तीय प्रगति (व्यय)	लागत रु. 44.75	34.75	36.10	1.35
2.	प्राप्त धन		33.85	33.85	--

नोट : कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु उ0 प्र0 सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.04.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

d:progress/progressformat.xls sh1

25/10

1332

~~283~~
~~1241~~

संलग्नक - 2

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 21.7.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति
गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 21.07.08 तक की प्रगति	दिनांक 20.8.08 तक की कुल प्रगति	दिनांक 21.07.2008 से 20.08.2008 तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	आई. एण्ड डी. कार्य - 18 नग	18 नग	17 नग (95%) + 1 नग (15%)	17 नग (95%) + 1 नग (20%)	1 नग (5%)
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग	11 नग	11 नग (95%)	11 नग (95%)	
3	राइजिंग मेन - 18955 मीटर	18955 मीटर	8119 मीटर	8134 मीटर	15 मीटर
4	सीवर लाइन - 6092 मीटर	6092 मीटर	3400 मीटर	3460 मीटर	60 मीटर
5	स्टाफ क्वार्टर - 11 नग	11 नग	80%	80%	--
6	जेनसेट - 25 नग	25 नग	100%	100%	--
7	मेन पम्पिंग स्टेशन - 1 नग	1 नग	50%	60%	10%
8	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग	3 नग	6%	8%	2%
9	सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग	7 नग	6 नग (100%) + 1 नग (90%)	6 नग (100%) + 1 नग (90%)	
10	नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग	5 नग	5 नग (95%)	5 नग (95%)	
11	शौचालय का निर्माण - 21 नग	21 नग	6 नग	6 नग	--
12	वनीकरण - जाब	20%	5%	5%	--
13	जनजागरण - जाब	20%	5%	5%	--
14	भूमि अग्रिग्रहण - जाब	100%	95%	100%	5%
15	पम्पिंग प्लान्ट - जाब	58 नग	95%	95%	--
16	विद्युत संयोजन - जाब	30%	70%	70%	--
17	विविध कार्य - जाब	50%	35%	40%	5%
(ब)	वित्तीय प्रगति				
1.	वित्तीय प्रगति (व्यय)	लागत रु. 263.04	94.48	103.20	8.72
2.	प्राप्त धन		92.768	108.433	15.665

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

d:progress/progressformat.xls sh1

2510

1333

284

संलग्नक - 3

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 21.7.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति
जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 21.07.08 तक की प्रगति	दिनांक 20.8.08 तक की कुल प्रगति	दिनांक 21.07.2008 से 20.08.2008 तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज	289 कि.मी.	20 कि.मी.	22.5 कि.मी.	2.5 कि.मी.
2	ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.)	48 कि.मी.	3.00 कि.मी.	9.50 कि.मी.	6.50 कि.मी.
3	सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.)	1 नग	10%	12%	डिज़ाइन प्रस्तुत 2%
4	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.)	1 नग	10%	12%	डिजाइन प्रस्तुत 2%
5	राइजिंग मेन - 1000 एम.एम.	45 मीटर	0	0	इसकी आवश्यकता वर्ष 2009-10 में है।
(ब)	वित्तीय प्रगति				
1.	वित्तीय प्रगति (व्यय)	लागत रु. 236.23	17.84	21.00	3.16
2.	प्राप्त धन		30.00	30.00	--

नोट :
1. योजना दिनांक 17.8.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रु. 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को एवं रु. 15.00 करोड़ की द्वितीय किश्त दिनांक 20.4.2008 को निर्गत की गयी।
3. लगभग 180 कि.मी. सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम.एल.डी. के कार्य दिनांक 19.5.2008 से प्रारम्भ/ 18 माह की कार्य अवधि।
5. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य एवार्ड/कार्य 01.06.2008 से प्रारम्भ करा दिया जायेगा।
6. अति वृष्टि के कारण सीवर लाइन डालने की प्रगति धीमी है।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

d:progress/progressformat.xls sh1

2570

1334

285
1243

U.P. JAL NIGAM

DETAILS OF FUNDS RELEASED BY GOVT. OF INDIA AND GOVT. OF U.P. UNDER GANGA ACTION PLAN
(31.07.2008 तक की स्थिति)

S.No.	G.O No. & Date	Amount (Rs. in Crores) Gomti Action Plan Lucknow						
		Phase-I			Phase-II			
		G.O.I.	GoUP	Total	G.O.I.	GoUP		Total
						Matching Grant 30%	Only for Land	
1	For Land of Daulatganj		2.61	2.61				
2	M-12036/1/2000-NRCD-II dated 14.11.2000			0.00				0.00
3	M-12036/1/96-NRCD-II dated 11.01-2001	2.75		2.75				0.00
4	M-12036/1/96-NRCD-II dated 14.03.2001	2.43		2.43				0.00
5	M-12036/1/96-NRCD-II dated 19.09-2001	5.00		5.00				0.00
6	M-12036/1/96-NRCD-II dated 27.5.2002	6.50		6.50				0.00
7	M-12036/1/96-NRCD-II dated 03.9.2002	7.10		7.10				0.00
8	M-12036/1/96-NRCD-II dated 30.06.2003	3.00		3.00				0.00
9	M-11014/2/2002-NRCD-II dated 30.6.2003			0.00	18.00			18.00
10	GoUP letter No. 143/नौ-5-2004-46 बजट/98/नगर विकास अनुभाग-5/लखनऊ dated 23.01.04			0.00		7.71		7.71
11	M-12036/1/96-NRCD-II dated 31.08.2005	2.19		2.19				0.00
12	M-12036/1/96-NRCD-II dated 23.03.2006	1.74		1.74				0 00
13	M-11014/3/2003-NRCD-II dated 14.6.2006			0.00	11.40			11.40
14	GoUP G.O.I. UO278/मा-5-2006 9(2)/90/सी नगर विकास अनुभाग-5 dated 20.09.06			0.00		4.89		4.89
15	5861/नौ-5-2006-9(1)/97 TC dated 16.02.07.							
16	M-12036/1/96-NRCD-II dated 16.3.07.	0.53		0.53				
17	M-14014/3/2003-NRCD-II dated 26.3.07.				3.45			3.45
18	M-14014/3/2003-NRCD-II dated 4/8.5.2007 for F.Y. 2007-08 (Plan)	--	--	--	2.31			2.31
19	उ.प्र.शासन के पत्र संख्या UO-130/नौ-5-2007-9(2)/50/ dated 20.07.2007					1.48		1.48
20	उ.प्र.शासन के पत्र संख्या 664/CGA/9-5-07-119(162) /2000/ dated 03.10.2007					0.99		0.99
21	उ.प्र.शासन के पत्र संख्या 2279/9-5-2008-11(162) 2000 T.C. dated 31.03.2008 रु. 31.5942 करोड़ अवमुक्त 5.6.2008						31.5942	31.5942
22	M-14014/3/2003-NRCD-II dated 28.3.2008	--	--	--	4.65			4.65
23	उ.प्र.शासन के पत्र संख्या 3933/नौ-5-2008-11(162)/2000 T.C. dated 21.05.2008 रु. 1.270 करोड़ के लिए						1.270	1.270
24	3932/सी.जी.ए./नौ-5-2008/11(162)/2000 दिनांक 21.5.2008	--	--	--		1.199		1.199
25	M-14014/3/2003-NRCD-II dated 3.6.2008 for F Y. 2008-09 (Plan)	--	--	--	13.640			13.640
26	4701/नौ-5-2008/11(162)/2000 टी.सी. दिनांक 07.7.2008					5.850		5.850
	TOTAL	31.240	2.610	33.850	53.450	22.119	32.864	108.433

d:progress/fundsdemand.xls sh 31.7 2008

257

ANNEXURE NO. A-3

1335

संख्या-2055 /9-5-07-3बजट/07

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार,
युक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 06 जुलाई, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2006-07 में भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 से आहरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-जीआई-45/9-5-07-3बजट/07, दिनांक 30 मार्च, 2007 का कृपया अवलोकन करें, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में रू0 36.1450 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जो उ0प्र0 जल निगम के पी0एल0ए0 में रखी गई है। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई रू0 10.3263 करोड़ के सापेक्ष राज्यांश सहित निम्नानुसार धनराशि पी0एल0ए0 में उपलब्ध रू0 36.1450 करोड़ के सापेक्ष रू0 [illegible] करोड़ की धनराशि आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।-

क्र0सं0	नगर का नाम	योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम किस्त (करोड़ रू0)	राज्य सरकार का अंश (करोड़ रू0)
23.01.07	1- नगर निगम, मेरठ	स्यूनिसिपल सालिडवेस्ट मैनेजमेंट	2.8243	0.56486
	2- नगर निगम, कानपुर	-तदैव-	2.3943	0.47886
	3- नगर निगम, लखनऊ	-तदैव-	1.7473	0.34946
	4- नगर निगम, आगरा	-तदैव-	1.3772	0.27544
23.01.07	5- नपा0प0मथुरा	-तदैव-	1.9832	0.19832
		योगः	10.3263	1.86694

सहमत
Deepak
04/8/07
(नीलिमा श्रीवास्तव)
अनु सचिव

5/10

2570

1336

287

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8 /दस-07, दिनांक 1915 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, कोषागार, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
5- वरि0 लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

2370

संख्या - 3349 /नौ-5-07-55बजट/06टीसी

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 18 अक्टूबर, 2007

विषयः **वित्तीय वर्ष 2006-07 में भारत सरकार द्वारा कियान्वित 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 से आहरित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- जी0आई-45/9-5-07-3 बजट/07, दिनांक 30 मार्च 2007 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा कियान्वित जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में रू0 3614.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है, जो उ0प्र0 जल निगम के पी0एल0ए0 में रखी गयी है। शासनादेश संख्या- 2055/9-5-07-3बजट/07 दिनांक 6 जुलाई 2007 के द्वारा पी0एल0ए0 में उपलब्ध रू0 3614.50 लाख के सापेक्ष भारत सरकार के पत्रांक- एफ.न.44/पीएफ-1/2006-228, दिनांक 23.01.07 तथा भारत सरकार के पत्रांक- एफ.न.44(1)/ पीएफ-1/2006-304, दिनांक 31.03.07 द्वारा अवमुक्त रू0 1032.63 लाख केन्द्रांश के रूप में तथा रू0 186.694 लाख राज्यांश के रूप में कुल 1219.324 लाख आहरण की अनुमति प्रदान की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में योजनान्तर्गत जारी गाइड-लाइन के अनुसार कुल लागत का 50 प्रतिशत केन्द्र, 20 प्रतिशत राज्य तथा 30 प्रतिशत स्थानीय निकाय (मथुरा को छोड़कर) का अंशदान होगा, जबकि मथुरा नगर हेतु 80 प्रतिशत केन्द्र, 10 प्रतिशत राज्य तथा 10 प्रतिशत स्थानीय निकाय का अंशदान होगा। तदनुसार भारत सरकार से उक्त शासनादेशों द्वारा प्राप्त केन्द्रांश रू0 1032.63 लाख के सापेक्ष राज्यांश रू0 358.514 लाख देय है, जबकि राज्यांश के रूप में पूर्व में रू0 186.694 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है और रू0 171.82 लाख की धनराशि राज्यांश के रूप में स्वीकृत किया जाना शेष है। अतएव राज्यांश की अवशेष धनराशि के रूप में निम्नलिखित निकायों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित धनराशि अर्थात कुल **रू0 1,71,82,000/- (रू0 एक करोड़ इक्हत्तर लाख बयासी हजार मात्र)** की धनराशि जल निगम के पी0एल0ए0 से आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 स0	नगर का नाम	योजना का नाम	योजना की लागत	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम किश्त	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम किश्त के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश	अनुमन्य राज्यांश के सापेक्ष पूर्व में स्वीकृत धनराशि	अवशेष राज्यांश की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर निगम मेरठ	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	2259.40	282.43	112.972	56.486	56.486
2	नगर निगम कानपुर	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	4788.64	239.43	95.772	47.886	47.886
3	नगर निगम लखनऊ	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	3494.60	174.73	69.892	34.946	34.946
4	नगर निगम आगरा	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	2754.46	137.72	55.088	27.544	27.544
5	न0पा0प0 मथुरा	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	991.60	198.32	24.79	19.832	4.958
		योग		**1032.63**	**358.514**	**186.694**	**171.82**

1370

3- उक्त धनराशि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एस.एल.एन.ए.) के खाते में रखी जायेगी तथा उसमें संबंधित निकायों का अंश प्राप्त करने एवं अन्य शर्तों/प्रतिबंधों की पूर्ति के उपरान्त ही व्यय की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8-1864-दस/07, दिनांक 16.09.07 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, आगरा व मथुरा।
4- नगर आयुक्त नगर निगम, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, आगरा ।
5- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
8- मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
10- वरिष्ठ लेखा अधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
11- अनुसचिव, शहारी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12- नियोजन अनुभाग-3/4
13- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

270

1339

ANNEXURE NO A-5

संख्या– 3351/नौ–5–2007–55बजट/06टीसी

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–5

लखनऊः दिनांक : 18 अक्टूबर, 2007

विषयः **भारत सरकार द्वारा कियान्वित जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की स्वीकृति प्रदान किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या– 44(1)/पी.एफ.–1/2006–304, दिनांक 31.03.2007 द्वारा नगर निगम, कानपुर, लखनऊ एवं आगरा की सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना हेतु अनुमन्य केन्द्रांश की प्रथम किश्त की कुल धनराशि 1379.715 लाख के सापेक्ष स्वीकृत केन्द्रांश रू0 551.88 लाख तथा राज्यांश रू0 220.752 लाख की स्वीकृति शासनादेश संख्या–2055/नौ–5–07, दिनांक 06.07.2007 एवं शासनादेश संख्या– 3349/नौ–5–07–55बजट/07–टीसी– I, दिनांक 18.10.2007 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

2– तत्क्रम में भारत सरकार के पत्र संख्या–44(1)/पी.एफ.–1/2006–308, दिनांक 31.3.2007 द्वारा नगर निगम, कानपुर, लखनऊ एवं आगरा की सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना हेतु अवमुक्त प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि **रू0 827.84** लाख तथा उसके सापेक्ष राज्यांश **रू0 331.136 लाख** अर्थात कुल धनराशि **रू0 1158.976 लाख**, की स्वीकृति प्रदान की जानी है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	नगर एवं योजना का नाम	योजना की अनुमानित लागत	अनुमन्य केन्द्रांश की प्रथम किश्त	प्रथम किश्त के सापेक्ष अवमुक्त अवशेष केन्दांश	केन्द्रांश के प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1.	कानपुर सालिड वेस्ट मैनेजमेंट	4788.64	598.580	359.15	143.66
2.	लखनऊ सालिड वेस्ट मैनेजमेंट	3494.60	436.825	262.10	104.84
3.	आगरा सालिड वेस्ट मैनेजमेंट	2754.46	344.310	206.59	82.636
	योग	11037.70	1379.715	827.84	331.136

3– इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ.नं0–59/2–पी0एफ0–1/2007–124, दिनांक 29.8.2007 द्वारा कानपुर, लखनऊ एवं आगरा की उक्त परियोजनाओं की पूर्व अनुमोदित लागत को पुनरीक्षित करते हुये केन्द्रांश की प्रथम किश्त की अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष केन्द्रांश **रू0 245.31** लाख एवं राज्यांश **रू0 98.124** लाख की निम्नांकित

290

1340 ~~1249~~ ~~1291~~ 291

विवरणानुसार कुल धनराशि रू0 **343.434 लाख** की स्वीकृति प्रदान की जानी है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क0	नगर एवं योजना का नाम	योजना की पुनरीक्षित लागत	पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष केन्द्रांश की प्रथम किश्त की अतिरिक्त धनराशि	प्रथम कि[illegible] की अतिरिक्त [illegible]नराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जाने वाली राज्यांश की धनराशि
1.	कानपुर सालिड वेस्ट मैनेजमेंट	5623.79	104.40	41.760
2.	लखनऊ सालिड वेस्ट मैनेजमेंट	4292.37	99.72	39.888
3.	आगरा सालिड वेस्ट मैनेजमेंट	3083.99	41.19	16.476
	योग		245.31	98.124

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में उपर्युक्त प्रस्तर-2 व 3 में अंकित विवरणानुसार वांछित कुल रू0 **15,02,41,000/-** (रू0 पन्द्रह करोड़ दो लाख इक्तालीस हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्या-जी.आई.-45/नौ-5-07-3बजट/07, दिनांक 30.03.07 द्वारा उ0प्र0 जल निगम के पी0एल0ए0 में अवस्थित धनराशि रू0 **3614.50** लाख में से आहरित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5- उक्त सम्पूर्ण धनराशि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एस.एल.एन.ए.) के खाते में रखी जायेगी तथा संबंधित स्थानीय नागर निकाय का अंश प्राप्त होने पर एवं अन्य शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन ही व्यय की जायेगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8-1864(1)-दस/2007, दिनांक 16.10.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, कानपुर, लखनऊ, आगरा।
4- नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर, लखनऊ, आगरा।
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
8- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
9- वरिष्ठ लेखा अधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
10- अनुसचिव, शहारी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11- नियोजन अनुभाग-3/4
12- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

270

ANNEXURE NO 11

6132/9.5.8

नगर निगम लखनऊ

4/12/07

प्रेषक : अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ	सेवा में : अनुसचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ
संख्या : 376/AMC(A)/08	
दिनांक : 19/01/2008	नत्थी :

विषय : रिट याचिका संख्या–6748 (एम/बी)/2008 पी0आई0एल0, बनवारी लाल बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में स्वकीय कार्यलय के पत्र संख्या–44रिट/9–5–2008–4रिट/2007 दिनांक 18–08–2008 का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04–08–2008 के अनुपालन में निम्नानुसार अवगत् कराया जाना है ।

1. जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत लखनऊ महानगर के ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु धनांक रू0 4292 लाख की योजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है । अनुमोदित योजना के सापेक्ष अब तक वित्तीय वर्ष 2008–09 में केन्द्रांश की धनराशि रू0 536 लाख तथा राज्यांश की धनराशि 278.33 लाख एवं लखनऊ नगर निगम का अंशदान रू0 321.60 अवमुक्त किया जा चुका है, इस प्रकार इस योजना में अबतक कुल 1135.93 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ।
2. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के निस्तारण हेतु शहर की चारों दिशाओं में कुल 120 हेक्टेयर भूमि चिन्हित करनें की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जानी है । गोमती एक्शन प्लान एवं लक्ष्मण मेला मैदान से सम्बन्धित याचिका संख्या 5370(एम0बी0)/2008 के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव सूचना महोदय के सभाकक्ष में सम्पन्न बैठक दिनांक 30–07–2008 के सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त संख्या 4896 दिनांक 07–08–2008 के पैरा–5 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु 40.19 हेक्टेयर भूमि हरदोई रोड पर तथा 38.771 हेक्टेयर देवा रोड पर भूमि अर्जन की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जानें का निर्णय लिया गया था ।
3. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सम्बन्ध में दिनांक 14–08–2008 को श्री नवनीत सहगल, सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जल निगम गेस्ट हाउस में बैठक ली गयी जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया कि देवा रोड व हरदोई रोड पर भूमि अर्जन का प्रस्ताव बनाकर जिलाधिकारी लखनऊ को धारा–4 की कार्यवाही किये जानें हेतु प्रेषित किया जा चुका है । इस सम्बन्ध में सचिव महोदय द्वारा तत्काल दूरभाष पर जिलाधिकारी लखनऊ से अर्जन हेतु धारा 4 की कार्यवाही शीघ्र किये जानें के निर्देष दिये गये तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण को तत्काल जिलाधिकारी लखनऊ से इस कार्यवाही हेतु सम्पर्क करनें हेतु निर्देश दिये गये ।
4. इसी याचिका में गांधी सेतु के समीप नदी सीमा के अन्दर पड़े कूड़े के निस्तारण के सम्बन्ध में नीरी द्वारा रिट याचिका संख्या 4436 के सम्बन्ध में दी गई अपनी रिपोर्ट दिनांक 17–07–2008 में दिये गये विकल्पों में से बिन्दु संख्या–5 पर की गई संस्तुतियों में विकल्प–2 के आधार पर नगर निगम लखनऊ द्वारा कार्यवाही करते हुए लैण्ड स्केपिंग (पार्क) की योजना नीरी द्वारा निर्धारित किये गये मानक के अनुसार तैयार कर मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को परीक्षण एवं विशेषज्ञ टिप्पणी प्राप्त किये जानें हेतु दिनांक 14–08–2008 को पत्र द्वारा प्रेषित की जा चुकी है ।

उपरोक्त के साथ नीरी की रिपोर्ट दिनांक 17–07–2008 की प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ से अवगत् होनें व अग्रतर कार्यवाही हेतु आख्या प्रेषित है ।

भवदीय

(ए0सी0 सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

प्रतिलिपि : निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ ।

भवदीय

~~1251~~ 1342

ANNEXURE NO A-7

~~1250~~ 293

C0४९९८ /सी-५/सा०-११/एस०टी०पी०/०८/ २२-८-०८

सेवा में

अपर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

विषय :-गोमती सेतु के समीप डाले गये कूड़े के निस्तारण हेतु मा०उच्च न्यायालय,लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या डी-३७२/ए०एम०सी०ए०/०८ दिनांक १४-८-२००८ का संदर्भ लेना चाहें। उपरोक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड की तकनीकी समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ टिप्पणी संलग्न की जा रही है।

उक्त के अनुक्रम में यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि चूँकि नीरी, नागपुर के विशेषज्ञों द्वारा पूर्व में स्थल का सर्वेक्षण कर सुझाव दिये गये थे, अतः आप द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव पर क्रियान्वयन से पूर्व नीरी नागपुर का अभिमत / विशेषज्ञ टिप्पणी प्राप्त किया जाना उचित होगा।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

Swami Nath Ram

(स्वामी नाथ राम)
मु०पर्या०अधिकारी, वृत्त-५

Read
G. N. Col

Rangeel

257

1343 ~~1202~~ 294

गोमती सेतु के समीप डालें गये कूडे के निस्तारण के प्रकरण पर नगर निगम के पत्रांक डी–३७२/ ए०एम०सी०ए०/०८ दिनांक १४.०८.२००८ के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर तकनीकी समिति की टिप्पणी

१. नगर निगम के प्रस्ताव में सेक्सन बीबी व सेक्सन एए किस स्थान का है स्पष्ट नहीं है। फिर भी प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर टिप्पणी निम्नवत है:–
यदि आपशन (१) के अनुसार नदी तट पर पडें एमएसडब्लू को नहीं हटाया जाना है तो आपशन (२) के अनुसार पडें हुए वेस्ट से लीचेट के नियंत्रण हेतु नीरी की पृष्ठ ६ की रिपोर्ट के अनुसार रिटेनिंग वाल एवं पूरे कूडे के उपरी सतह पर फाइनल कवर बिछाना उचित होगा। परन्तु इसमें एचडीपीई सीट १.५ मिमी. की जगह २.० मिमी. मोटी इस्तेमाल करना उचित होगा तथा एचडीपीई सीट को रिटेनिंग वाल तथा अन्य साईडस् तक इस प्रकार बिछाई जाए कि कोई गैप न रहे, जिससे पानी percolate न करें।

२. एच०डी०पी०ई शीट के ज्वाइंट पर हाटवेज वेल्डिंग कराई जाए तथा थर्ड पार्टी टेस्टिंग कराई जाए। रिटेनिंग वाल की स्ट्रेक्चरल डिजाइन थर्ड पार्टी से चेक कराई जाए

३. नीरी के सुझाव कि "a retaining wall must be constructed near the dump to act as barrier between the leachate & contaminated ground water, and the river water. This should be done in consultation with appropriate regulatory agencies, experts in the field, and considering hydro geological properties of the area " के संबंध में नीरी से ही अथवा हाईड्रोजिओलोजिकल एक्सपर्ट से सुझाव प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जाए क्यों कि रिपोर्ट से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है।

४. एम०एस०डब्लू० रूल्स, २००० के सेड्यूल ३ में दिये गये specification for land fill sites के बिन्दू संख्या ३१ व ३२ जो कि क्लोजर आफ लैण्डफिल साईट एण्ड पोस्ट केयर से सम्बन्धित हैं, का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार बिन्दू संख्या २५ के अनुसार लैण्डफिल गैस कन्ट्रोल सिस्टम स्थापित करने पर विचार किया जाए यदि यह व्यवहारिक हो । परन्तु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि गैस कन्ट्रोल सिस्टम न लगाने की स्थिति में अन्य गम्भीर समस्यायें तो उत्पन्न नहीं होगी।

५. एम०एस०डब्लू रूल्स के बिन्दु संख्या ३२ को देखते हुए वर्तमान में नगर निगम द्वारा प्रेषित प्लान में वेस्ट के ऊपर दर्शाई गयी पार्किंग की व्यवस्था की अनुमति दिया जाना उचित नहीं होगा क्यों कि इससे एच०डी०पी०ई शीट पन्चर हो सकती है।

25/9

25/9/08

(डा० अटलशंकर त्रिपाठी)
अपर आयुक्त एवं अधिकारी
न्याय अनुभाग-1 (फौजदारी)

1- 1344 ~~193~~ 295

IN THE HONBLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
SITTING AT LUCKNOW.

W/P No. 4436 (M/B)/2003

Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF HON'BLE COURT'S ORDER DATED 21-7-2008 ON BEHALF OF UP JAL NIGAM

I, V.U. Bishnoi, aged about 56 years, son of late Sri P.C. Bishnoi presently posted as General Manager, Gomti Pollution Control Unit, UP. Jal Nigam, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as General Manager, Gomti Pollution Control Unit, in U.P. Jal Nigam, Lucknow, and he has been authorized to swear and file this affidavit on behalf of UP Jal Nigam as such he is fully conversant with the facts and circumstances of the case and on the basis of record. The deponent submits as under.

2. That on 21-7-2008 an affidavit was filed by U.P. Jal Nigam in compliance of the Order of this Hon'ble court but this Hon'ble court was pleased to direct to file a complete report regarding the projects proposed to be undertaken, funds released and utilized and the work done .

3. That it is submitted that after receiving the funds hectic efforts have been done by UP Jal Nigam to complete the work. It is submitted that so far installation of the 61 tube wells is concerned, which are to be completed under JNNURM scheme, in which work of installation of 40 tube wells is also included, the work of 25 tube wells has been commissioned and the work of remaining 15 tube wells are in progress, where water supply system is available and the work would be completed expeditiously, a chart has been prepared in this regard. A photo copy of the chart, wherein details have been given, is being annexed as **Annexure no.1** to this affidavit.

4. That so far installation of 21 tube wells is concerned , the work has been completed for 3 tube wells. There is no water supply system available, so after completing the work of the installation of tube wells it will take some time and would be commissioned after laying of distribution system. The work of 13 tube wells are under progress. A photo copy of the chart in respect of installation of 21 tube wells is being annexed as **Annexure no.2** to this affidavit.

5. That it is submitted that so far re-boring of 43 tube wells is concerned; the work has been competed for 8 tube wells and the work is in progress for 28 tube wells. A photo copy of progress chart in respect of re-boring of 43 tube wells is being annexed as **annexure no.3** to this affidavit.

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

6. That it is submitted that target of installation of 409 new handpumps and re-boring / special repair of 670 handpumps was fixed under District Plan (urban). Out of which all the 409 new hand pumps and re-boring / special repair of 670 handpumps has been completed. A photo copy of progress chart in detail, including new installed hand pumps is being annexed as **Annexure no.4** to this affidavit.

7. That it is further submitted that in addition to JNNURM UP Jal Nigam has worked under Urban Water Supply (normal) programme for which fund has been provided by State Government for the work of installation of tube wells, re-boring of tube wells and other works. Out of 5 proposed tube wells, the works for 3 tube wells have been completed and the work for 1 tube wells is in progress. out of proposed 39 rebore tube wells all the 39 tube wells has been commissioned. A photo copy of progress chart in this respect is being annexed as **Annexure no.4** to this affidavit.

8. That it is also submitted that establishment of 3rd Water works project is concerned, the work for finalization of tender process has been completed and the date of start has been given to the Firm. The technical drawing and design is to be submitted by the firm. The Work of Boundry Wall , site office and Zonal Underground water storage tanks are in progress. As per Approved estimate the work is to be completed by 2010, efforts will be made to complete the work before time.

9. That so far cleaning of Gomati river is concerned, it is submitted that the land for construction of 345mld STP has been acquired by Nagar Nigam, Lucknow, on 16.07.2008 and after finalization of tendering process, the work for STP has been started on 19.07.2008. It is further submitted that the work done under Gomati action plan phase-I, II and JawaharLal Nehru National Urban Renewal Programme is

1347 298

concerned, detail updated chart is being annexed as **Annexure no.5, 6, 7 and 8** to this affidavit.

Place : Lucknow

Date : 25/8/08

Deponent

Verification

I, the deponent named above do hereby verify that the content of para 1 to 9 of this affidavit filed in support of the writ petition, are true to the best of my knowledge, while those of para ..x.... are believed to be true being based on legal advice. No part of it is false. Nothing material has concealed. So help me God.

Place : Lucknow

Date : 25/8/08

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me on 25/8/08 at 11.20. a.m./p.m. by Shri V.U. Bishnoi who is identified by Shri I.P. Singh, Advocate, High Court, Lucknow Bench,Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the facts of this affidavit which have been read over and explained to him by me.

OATH COMMISSIONER

Dinesh Kumar Misra, Advocate
Oath Commissioner High Court
Allahabad, Lucknow Bench
Date 25/8/08 22364

Annexure – 1

299

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई तृतीय(वि0/यॉ0), उ0प्र0,जल निगम , लखनऊ

दिनांक 18.8.2008 तक की प्रगति

~~257~~ 348

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित किये जाने वाले 40 नलकूपों का निर्माण-:

लक्ष्य- 40 नग नये नलकूपों

उपलब्धि - 25 नग (जलापूर्ति प्रारम्भ)

क्र सं.	नलकूपों का नाम और जल स्त्राव ली. प्रति मिनट	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि. /स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जलापूर्ति प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि	जलापूर्ति प्रारम्भ करने की निर्धारित तिथि	प्रति वृद्धि एम. एल.डी में	वर्तमान की प्रगति	टिप्पणी
			संभावित	वास्तविक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अलीगंज सेक्टर-एच जोन-3 (1500 ली.प्र. मि.)	1.1.07		6.5.08	16.5.08		1.5		
2	इंदिरानगर डी ब्लाक, जोन-5 (1000 ली..प्र.मि.)	15.12.07		1.5.08	12.5.08		1.00		
3	विजय खण्ड, जोन-5 (1000 ली.प्र.मि.)	5.3.08		12.5.08	17.5.08		1.00		
4	अलीगंज सेक्टर -सी/डी, जोन-3 (1000 ली.प्र.मि.)	17.3.08		7.5.08	17.5.08		1.00		
5	सुल्तान कालोनी, जोन-1 (1000 ली.प्र.मि.)	18.3.08		18.5.08	18.5.08		1.00		
6	शिवपुरी जोन 3 (1000 ली.प्र.मि)	30.3.08		8.5.08	31.5.08		1.00		
7	त्रिवेणी नगर, जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	17.3.08		8.5.08	7.6.08		1.00		
8	निराला नगर, सेक्टर-9 (1000 ली.प्र.मि)	19.4.08		19.5.08	11.6.08		1.00		
9	सहयोग पार्क, महानगर जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	29.4.08		21.5.08	20.6.08		1.00		
10	चानक्यपुरम सेक्टर-एच ,अलीगंज जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	15.4.08		2.6.08	17.6.08		1.00		
11	हिन्द नगर नलकूप जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	11.3.08		10.6.08	17.6.08		1.00		
12	नानारपुर सेक्टर-ई अलीगंज जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	13.4.08		29.5.08	18.6.08		1.00		
13	मेहदी टोला,विष्णुपुरी कालोनी जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	9.5.08		7.6.08	18.6.08		1.00		
14	शिवपुरी पार्क गणेश गंज, जोन-1 (1000 ली.प्र.मि)	15.4.08		16.6.08	22.6.08		1.00		
15	कानपुर रोड योजना सेक्टर-जे, जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	10.4.08		20.6.08	23.6.08		1.00		
16	निशीत खण्ड, जोन-5 (1000 ली.प्र.मि)	24.3.08		15.6.08	28.6.08		1.00		
17	साउथ सिटी सेक्टर-सी-1 जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	21.4.08		26.6.08	4.7.08		1.00		
18	दामोदर नगर,आलमनगर, जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	13.4.08		30.6.08	4.7.08		1.00		
19	इंदिरा नगर बी- ब्लाक जोन-5 (1000 ली.प्र.मि)	15.3.08		16.6.08	8.7.08		1.00		
20	मेया नर्सरी निशातगंज , जोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	5.5.08		15.6.08	10.7.08		1.00		
21	पंचवटी कालोनी, रहीम नगरोन-3 (1000 ली.प्र.मि)	19.5.08		15.6.08	11.7.08		1.00		

COMMISSIONER FOR OATHS HIGH COURT, ALLAHABAD

Advocate,
Counsel for Deponent

6 1349 ~~1258~~ 300

	नलकूपों का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि. /सा.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जलापूर्ति प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि	जलापूर्ति प्रारम्भ करने की निर्धारित तिथि	जल वृद्धि एम.एल. डी में	वर्तमान की प्रगति	टिप्पणी
			सम्भावित	वास्तविक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	साउथ सिटी रशिम खण्ड, जोन-4 (1000 ली.प्र.मि)	9.5.08		30.6.08	18.7.08		1.00		
23	विवेक खण्ड -4 गोमती नगर जोन-5 (1000 ली.प्र.मि)	15.4.08		21.6.08	30.7.08		1.00		
24	सेक्टर-आई, एल.डी.ए. कालोनी आलमबाग, जोन -4	29.4.08		3.7.08	11.8.08		1.00		
25	अशोकनगर रा.जा.जीपुरम जोन-6	29.4.08		11.8.08	14.8.08		1.00		
26	जानक रम सेक्टर-सी, जोन-3	9.5.08		17.6.08		20.8.08		पम्प सेट चालू	राइजिंग मेन जोडा जाना है।
27	सोसाइटी पार्क नरही, जोन-1	9.5.08		26.6.08		20.8.08		तदैव	तदैव
28	वडा वरुआ, आनन्दनगर, जोन-4	8.5.08		7.7.08		20.8.08		तदैव	तदैव
29	ब्रह्म नगर, जोन-4	8.5.08		8.7.08		20.8.08		तदैव	तदैव
30	इंदिरानगर सेक्टर-14, जोन-5	5.5.08	15.7.08			25.8.08		ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य पूर्ण	
31	मातादीनशेरवाली कोठी,सहादतगंज जोन-6	13.4.08	5.7.08			25.8.08		तदैव	
32	विशाल खण्ड गोमतीनगर, जोन-5	6.6.08	19.7.08			25.8.08		तदैव	
33	हुसैनाबाद शिवपुरी , जोन-2	19.5.08	16.7.08			27.8.08		ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	
34	विनय खण्ड-1, गोमतीनगर , जोन-5	6.6.08	18.7.08			27.8.08		कम्प्रेसर से विकास कार्य पूर्ण	
35	आनन्द नगर वरुआ रोड , जोन-4	10.6.08	25.7.08			31.8.08		तदैव	
36	वजीरबाग वदरअली तकिया शाह जोन-6	30.5.08	20.7.08			31.8.08		तदैव	
37	सरी पुरा, आलमनगर जोन-6	30.5.08	17.7.08			15.9.08		पाइप लाइन डालने के लिए की गयी खुदाई के कारण कम्प्रेसर कार्यस्थल तक नही पहुँच सकी।	
38	सर्वर कालोनी सैक्टर-9 इंदिरा नगर , जोन-5	20.5.08	15.7.08			15.9.08		कम्प्रेसर से विकास कार्य पानी भरा होने के कारण नही किया जा सका।	
39	आलमदगंज पजावा , जोन-2	5.7.08	29.7.08			7.9.08		लोअरिंग पूर्ण	
40	जलील पुर, जोन-6	1.7.08	29.7.08			11.9.08		तदैव	

नोट :-

1. चालू नलकूपों की संख्या - 25 नग , जलावृद्धि - 25.5 एम.एल.डी.
2. निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या - 15 नग
3. नलकूपों की संख्या जिनके पम्प सेट चालू है राइजिंग मेन जोडा जाना है। - 4 नग, सम्भावित जलावृद्धि - 4 एम.एल.डी.

29/11
परियोजना प्रबंधक

COMMISSIONER FOR OATHS
सत्यमेव जयते
High Court, ALLAHABAD

Advocate,
Counsel for Deponent

-7-

1259 1350

Annexure - 2

301

दिनांक 18.8.2008 तक की प्रगति

एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ शहर के विभिन्न पेयजल योजनाओं के विरूद्ध प्रस्तावित 21 नलकूप का विवरण

लक्ष्य - 21नग नये नलकूप

उपलब्धि - 3 नग नलकूप

सं.	नलकूपो का नाम स्त्राव लीटर प्रति मिनट	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जलापूर्ति प्रारम्भ करने की तिथि	जल वृद्धि एम.एल.डी. में	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			संम्भावित	वास्तविक				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	**लिवटी कालोनी कुर्मान्चल नगर पेय जल योजना -: 2 नग , जोन-3**							
	1.कुर्मान्चल नगर(मानसखिहार)नलकूप-1 1000 ली.प्र.मि.	10.2.08		8.5.08	18.5.08	1.00		
	2.कुर्मान्चल नगर(लिवटी कालोनी) नलकूप-2	17.3.08		22.6.08	17.7.08	1.00		
2	**शिव नगर पेयजल योजना :- 4 नलकूप जोन-3**							
	3. नलकूप सं.-1 1000 ली.प्र.मि.	10.11.07		8.5.08	28.5.08	1.00		
	4. नलकूप संख्या -2(कुम्हार टोला)	30.5.08		10.8.08			पम्प सेट चालू	राईजिंग मेन जोड़ा जाना है।
	5							
	6							
3	**भारतनगर पेय जल योजना :- 3 नलकूप , जोन-3**						पम्प सेट चालू	तदैव
	7. सत्यलोक कालोनी	15.3.08		20.5.08		-	तदैव	तदैव
	8. महाराजा अग्रसेन पार्क	30.4.08		21.6.08		-	तदैव	तदैव
	9. भगत सिंह पार्क	28.4.08		21.6.08				
4	**गढीकनौरा पुनगर्ठन पेयजल योजना :- 6 नलकूप , जोन-2**						लोअरिंग पूर्ण	
	10. पी.टी.सी. , मिल के पास,	30.4.08	15.7.08				तदैव	
	11. नलकूप संख्या-2, तालकटोरा	21.5.08	31.7.08				कार्य प्रगति पर	
	12. करहटा नगर निगम स्टोर	3.8.08	31.9.08					
	13.							
	14.							
	15.							
5	**खरिका वार्ड पेयजल योजना :- 6 नलकूप , जोन-4**						लोअरिंग पूर्ण	
	16. नलकूप संख्या-1(लौंगा खेड़ा)	3.5.08	15.7.08				तदैव	
	17. नलकूप संख्या-2(झंडे वाला पार्क)	13.5.08	25.7.08				तदैव	
	18. नलकूप संख्या 3(नलदेव विहार पार्क)	17.5.08	25.7.08				तदैव	
	19. नलकूप संख्या-3(गोप स्कूल के पीछे)	30.5.08	30.7.08				तदैव	
	20. नन्द विहार कालोनी पार्क	18.6.08	4.8.08				तदैव	
	21. डिफेन्स कालोनी	18.6.08	30.7.08					

नोट :

1. कुल प्रस्तावित नलकूपों की संख्या - 21 नग
2. चालू नलकूपों की संख्या - 3 नग , जलापूर्ति 3.00 एम.एल.डी.
3. निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या - 13 नग
4. नलकूपों की संख्या जिनके पम्प सेट चालू है राईजिंग मेन जोड़ा जाना है। - 4 नग, संम्भावित जलापूर्ति - 4 एम.एल.डी.

परियोजना प्रबन्धक

Advocate,
Counsel for Deponent

Annexure – 3

दिनांक 18.8.2008 तक की प्रगति

~~1260~~ 1351 302

जे.एन.एन.यू.आर.एम के अन्तर्गत 43 नग री-बोर नलकूपो का निर्माण कार्य-:
लक्ष्य- 43 री-बोर नलकूपों को चालू करने की सम्भावित तिथि 31.12.08
उपलब्धि - 9 नग

क्र स.	नलकूपों का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (राइजिंग मेन पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जल वृद्धि एम.एल.डी. में	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			वास्तविक	सम्भावित			
1	2	3	4	5	6	7	
1	डायमंड डेरी, जोन-1	1.3.08	29.4.08		1.00	जलापूर्ति प्रारम्भ	
2	महानगर सेक्टर-डी, जोन-3	6.4.08	1.5.08		1.00	तदैव	
3	हातामातादीन, जोन-1	20.3.08	13.5.08		0.60	तदैव	
4	जवाहर भवन, जोन-1	17.4.08	30.5.08		1.00	तदैव	
5	कमला कपूर पार्क निशात नगर जोन-3	10.5.08	3.6.08		1.00	तदैव	
6	जानकी पुरम, ए-ब्लाक, जोन-3	28.5.08	23.6.08		1.00	तदैव	
7	पेपर मिल कालोनी नलकूप जोन-3	20.5.08	25.6.08		1.00	तदैव	
8	आर्यसमाज मंदिर गणेश गंज जोन-1		12.8.08		1 00	तदैव	
9	पत्रकार पुरम गोमतीनगर जोन-5	5.5.08	13.8.08		1.00	तदैव	
10	कोनेश्वर मंदिर, जोन-3	6.6.08		20.8.08		पम्प लोअर	
11	मुरली नगर , जोन-3	1.6.08		25.8.08		तदैव	
12	कपूरथला, नलकूप जोन-3	28.6.08		20.8.08		ओ.पी. यूनिट से विकास पूर्ण	
13	शिया कालोनी, जोन-3	6.6.08		25.8.08		ओ.पी.यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	
14	डायमंड डेरी, जोन-1	1.6.08		25.8.08		तदैव	
15	लालबाग ,जोन-1	30.6.08		20.8.08		तदैव	
16	बाबूगंज, जोन-3	24.5.08		30.8.08		तदैव	
17	से.-11 राजाजीपुरम जोन-6	28.6.08		25.8.08		तदैव	
18	आनन्द नगर, जोन-4	28.5.08		10.9.08		कम्प्रेसर से प्रगति पर	
19	अलीगंज से.-6 जोन-3	6.6.08		10.9.08		लोअरिंग पूर्ण	
20	ओल्ड स्पीकर, जोन-1	15.6.08		5.9.08		तदैव	
21	नैपियर रोड, जोन-6	11.6.08		5.9.08		तदैव	
22	इंदिरानगर से.-54 जोन-5	3.5.08		10.9.08		तदैव	
23	अलीगंज से.-7 जोन-3	10.6.08		10.9.08		तदैव	
24	समर विहार, जोन-4	28.5.08		10.9.08		तदैव	
25	खिन्नी पार्क, जोन-3	21.6.08		10.9.08		तदैव	
26	कर्बला तालकटोरा रोड, राजाजीपुरम, जोन-6	23.6.08		15.9.08		तदैव	
27	खुशीदबाग, जोन-6	28.6.08		15.9.08		तदैव	
28	विजय खण्ड, जोन-5	3.7.08		20.8.08		तदैव	
29	गाँधीनगर जोन-1	17.6.08		20.8.08		तदैव	
30	कृष्णा नगर, जोन-4	20.7.08		15.9.08		तदैव	
31	डालीगंज नलकूप, जोन-3	24.7.08		30.8.08		तदैव	
32	सेक्टर-14 राजाजीपुरम जोन-6	25.7.08		30.8.08		तदैव	
33	हातारसूल खाँ, जोन-1	22.7.08		30.8.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	
34	भवानीगंज, जोन-6	26.7.08		30.8.08		तदैव	
35	आजाद नगर, जोन-4	26.7.08		15.9.08		तदैव	
36	इंदिरा नगर संख्या 53	10.8.08		10.10.08		तदैव	

~~1267~~ 1352 303

1.	कुल प्रस्तावित री-बोर नलकूपों की संख्या	- 43 नग
2.	चालू नलकूपों की संख्या	- 9 नग , जलावृद्धि 9.00 घन.फुट.सी.
3.	निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या	- 27 नग

30/11
परियोजना प्रबन्धक

पेयजल योजना

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 19.07.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम

(रू. लाख में)

क्रमांक	कार्य का विवरण	प्रस्तावित कार्य की मात्रा	दि. 19.07.2008 तक की प्रगति	दिनांक 18.08.08 तक कुल प्रगति	दिनांक 19.07.08 के उपरान्त प्रगति
1.	नये नलकूप (समस्याग्रस्त क्षेत्रों में)	40 नग	22 नग चालू 18 नग प्रगति पर	25 नग चालू 15 नग प्रगति पर	3 नग चालू, कुल 15 नग पर कार्य प्रगति पर
	नये नलकूप (विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत)	21 नग	3 नग चालू 12 नग प्रगति पर	3 नग चालू 13 नग प्रगति पर	1 नग पर कार्य प्रारम्भ, कुल 13 नग पर कार्य प्रगति पर।
2.	रिबोर नलकूप	43 नग	7 नग चालू 22 नग प्रगति पर	8 नग चालू 28 नग प्रगति पर	1 नग चालू, 6 नग पर कार्य प्रारम्भ। कुल 28 नग पर कार्य प्रगति पर।
3.	वितरण प्रणाली	133.31 कि.मी.	17.00 कि.मी.	26.00 कि.मी.	9.00 कि.मी. का कार्य पूर्ण।
4.	राइजिंग मेन	14.40 कि.मी.	22 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू 8 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर	28 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू 11 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर	6 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू, 3 नग नलकूप की राइजिंग मेन का कार्य प्रारम्भ एवं कुल 11 नग नलकूपों की राइजिंग मेन कार्य प्रगति पर।

योजना पर अवमुक्त धनराशि : रू. 40.00 करोड़
योजना पर अब तक व्यय : रू. 40.00 करोड

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

19/8/08
महाप्रबन्धक(पेयजल)

1/10/1

1253

1262

304

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, पेयजल(द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

305

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में चालू किये गये नलकूपों की सूची

1354

40 नग नये नलकूपों के अन्तर्गत

क्र0 सं0	नलकूपों का नाम एवं स्थल
1	2
1	अलीगंज सेक्टर-एच
2	इन्दिरानगर डी-ब्लॉक
3	विजयखण्ड, गोमतीनगर
4	अलीगंज सेक्टर-डी
5	गुलिस्ता कॉलोनी
6	अहिबरनपुर सीतापुर रोड
7	त्रिवेणी नगर
8	विकासनगर सेक्टर-9
9	सहयोग पार्क, महानगर
10	जानकीपुरम् सेक्टर-एच
11	हिन्द नगर नलकूप, जोन-4
12	तातारपुर सेक्टर-ई, अलीगंज
13	मेंहदीटोला, विष्णुपुरी कॉलोनी
14	शिवपुरी पार्क, गणेशगंज
15	कानपुर रोड योजना, सेक्टर-जे, रेलनगर
16	विनीत खण्ड, गोमती नगर
17	साउथ सिटी, सेक्टर-सी-1
18	दामोदरनगर, आलमबाग
19	इन्दिरानगर बी-ब्लॉक
20	मेवा नर्सरी, निशातगंज
21	पंचवटी कॉलोनी, रहीमनगर
22	साउथ सिटी, रश्मि खण्ड
23	विवेक खण्ड-4, गोमतीनगर
24	सेक्टर-आई, एल.डी.ए. कॉलोनी
25	अशोकनगर राजाजीपुरम्

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत प्राक्कलन में सम्मिलित पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत

26	शिवनगर खदरा जलकल परिसर
27	मानस विहार कॉलोनी, सर्वोदयनगर
28	लिवटी पार्क, सर्वोदयनगर

नगरीय पेयजल योजना सामान्य के अन्तर्गत स्वीकृत नलकूप

29	विनयखण्ड, गोमतीनगर
30	फैजुल्लागंज
31	राजाजीपुरम बी-ब्लॉक, रानी लक्ष्मीबाई पार्क

परियोजना प्रबन्धक

-12-

1355

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, गो0प्र0नि0ई0-।।।(वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

~~12.1~~ 3.06

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 43 नग रिबोर नलकूपों का कार्य

1	डायमण्ड डेरी कॉलोनी
2	महानगर सेक्टर-डी
3	हाता मातादीन
4	जवाहरभवन
5	कमलाकपूर पार्क निरालानगर
6	जानकीपुरम् ए-ब्लॉक
7	पेपरमिल कॉलोनी
8	आर्य समाज मन्दिर गणेशगंज

परियोजना प्रबन्धक

सत्यमेव जयते
High Court, ALL

1356

लखनऊ नगर में जल संस्थान के विभिन्न जोनों में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

~~1265~~ 307

दिनांक 18.08.08 तक

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
1.	जोन-1, लालबाग	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	2 नग चालू, 1 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	3 नग चालू, 6 नग प्रगति पर।
2.	जोन-2, ऐशबाग	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	5 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	-
3.	जोन-3, अलीगंज	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	10 नग चालू, 5 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	4 नग चालू, 8 नग प्रगति पर।
4.	जोन-4, आलमबाग	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	6 नग चालू, 9 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	4 नग प्रगति पर,
5.	जोन-5, इन्दिरानगर	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	9 नग चालू, 4 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	1 नग चालू, 4 नग प्रगति पर।
6.	जोन-6, राजाजीपुरम	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	1 नग पूर्ण, 4 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	6 नग प्रगति पर।
	योग	**नया नलकूप**	**28 नग चालू, 28 नग प्रगति पर**
		रीबोर नलकूप	**8 नग चालू, 28 नग प्रगति पर**

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)

18/8/08
महाप्रबन्धक(पेयजल)

पेयजल योजना

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 19.07.08 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

सामान्य कार्यक्रम

(रू0 लाख में)

क्रमांक	कार्य का विवरण	प्रस्तावित कार्य की मात्रा	दिनांक 19.07.08 तक कुल प्रगति		दिनांक 18.08.08 तक कुल प्रगति		दिनांक 19.07.08 से 18.08.08 तक कुल प्रगति	
1.	नये हैण्डपम्प	409 नग	409 नग	286.80	409 नग	286.80	-	-
2.	विशेष मरम्मत/रिबांर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प	670 नग	670 नग		670 नग		-	
3.	नये नलकूप	5 नग	3 नग चालू	125.00	3 नग चालू तथा 1 नग प्रगति पर।	140.00	1 नग नलकूप प्रगति पर।	15.00
4.	रिबांर नलकूप	39 नग	39 नग चालू	690.00	39 नग चालू	690.00	-	-
	योग			1101.80		1116.80	1 नग नलकूप प्रगति पर।	15.00

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)

महाप्रबन्धक(पेयजल)

Annexure - 4

1357

308

15- 1358 ~~1267~~

309

लखनऊ नगर में जल संस्थान के विभिन्न जोनों में नगरीय पेयजल (सामान्य) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

दिनांक 18.08.08 तक

दिनांक 01.04.06 से कराये गये कार्य

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
1.	जोन-1, लालबाग	नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	4 नग पूर्ण एवं चालू।
		मिनी नलकूप	2 नग पूर्ण एवं चालू।
2.	जोन-2, ऐशबाग	नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	2 नग पूर्ण एवं चालू।
		मिनी नलकूप	1 नग पूर्ण एवं चालू।
3.	जोन-3, अलीगंज	**फैजुल्लागंज पेयजल योजना**	
		नया नलकूप	1 नग पूर्ण एवं चालू।
		स्टाफ क्वार्टर	95 प्रतिशत पूर्ण
		नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	12 नग पूर्ण एवं चालू।
4.	जोन 4, आलमबाग	नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	7 नग पूर्ण एवं चालू।
5.	जोन-5, इन्दिरानगर	**विनयखण्ड, गोमती नगर में एक नये एवं एक रीबोर नलकूप का कार्य**	
		नया नलकूप	1 नग पूर्ण एवं चालू।
		रीबोर नलकूप	1 नग पूर्ण एवं चालू।
6.	जोन-6, राजाजीपुरम्	**'बी' ब्लॉक रानीलक्ष्मीबाई पार्क में नलकूप का निर्माण**	1 नग पूर्ण एवं चालू।
		राजाजीपुरम् 'ई' एवं 'एफ' ब्लॉक पेयजल योजना	
		नया नलकूप	1 नग प्रगति पर।
		वितरण प्रणाली	1.00 कि.मी.
		नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	9 नग पूर्ण एवं चालू।
	योग	**नया नलकूप**	**3 नग चालू, 1 नग प्रगति पर**
		रीबोर नलकूप	**33 नग पूर्ण एवं चालू**
		मिनी नलकूप	**3 नग पूर्ण एवं चालू**
		नया हैण्डपम्प	**409 नग**
		रीबोर/विशेष मरम्मत हैण्डपम्प	**670 नग**

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)

महाप्रबन्धक(पेयजल)

~~1268~~ 1359

Annexure - 5

310

संलग्नक - 1

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 21.7.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति
गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 21.07.08 तक की प्रगति	दिनांक 20.8.08 तक की कुल प्रगति	दिनांक 21.05.2008 से 20.08.2008 तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	आई. एण्ड डी. कार्य - 6 नग	6 नग	5 नग पूर्ण	5 नग पूर्ण	--
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 5 नग	6 नग	5 नग पूर्ण + 1 नग (25%)	1 नग (30%)	1 नग (5%)
3	राइजिंग मेन - 7525 मीटर	7525 मीटर	5120 मीटर	5120 मीटर	--
4	सीवर लाइन - 20 मीटर	20 मीटर	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
5	स्टाफ क्वार्टर - 4 नग	4 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
6	जेनसेट - 8 नग	8 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
7	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग	1 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
8	भूमि अधिग्रहण - जाब	1 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
9	पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग	25 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
10	विद्युत संयोजन - 6 नग	6 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
11	विविध कार्य - जाब	50%	40%	42%	2%
(ब)	वित्तीय प्रगति				
1.	वित्तीय प्रगति (व्यय)	लागत रु. 44.75	34.75	36.10	1.35
2.	प्राप्त धन		33.85	33.85	--

नोट : कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु उ0 प्र0 सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.04.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

d:progress/progressformat.xls sh1

सत्यमेव जयते
Court, a!!

~~1269~~ 1360

Annexure - G

311

संलग्नक - 2

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 21.7.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति
गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 21.07.08 तक की प्रगति	दिनांक 20.8.08 तक की कुल प्रगति	दिनांक 21.07.2008 से 20.08.2008 तक की प्रगति
1)	भौतिक प्रगति				
	आई. एण्ड डी. कार्य - 18 नग	18 नग	17 नग (95%) + 1 नग (15%)	17 नग (95%) + 1 नग (20%)	1 नग (5%)
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग	11 नग	11 नग (95%)	11 नग (95%)	
3	राइजिंग मेन - 18955 मीटर	18955 मीटर	8119 मीटर	8134 मीटर	15 मीटर
4	सीवर लाइन - 6092 मीटर	6092 मीटर	3400 मीटर	3460 मीटर	60 मीटर
5	स्टाफ क्वार्टर - 11 नग	11 नग	80%	80%	--
6	जेनसेट - 25 नग	25 नग	100%	100%	--
7	मेन पम्पिंग स्टेशन - 1 नग	1 नग	50%	60%	10%
8	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग	3 नग	6%	8%	2%
9	सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग	7 नग	6 नग (100%) + 1 नग (90%)	6 नग (100%) + 1 नग (90%)	
10	नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग	5 नग	5 नग (95%)	5 नग (95%)	
11	शौचालय का निर्माण - 21 नग	21 नग	6 नग	6 नग	--
12	वनीकरण - जाब	20%	5%	5%	--
13	जनजागरण - जाब	20%	5%	5%	--
14	भूमि अधिग्रहण - जाब	100%	95%	100%	5%
15	पम्पिंग प्लान्ट - जाब	58 नग	95%	95%	--
16	विद्युत संयोजन - जाब	30%	70%	70%	--
17	विविध कार्य - जाब	50%	35%	40%	5%
	वित्तीय प्रगति				
1.	वित्तीय प्रगति (व्यय)	लागत रु. 263.04	94.48	103.20	8.72
2.	प्राप्त धन		92.768	108.433	15.665

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

d:progress/progressformat.xls sh1

Annexure - 7

~~1270~~ 1361

312

संलग्नक - 3

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 21.7.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति
जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 21.07.08 तक की प्रगति	दिनांक 20.8.08 तक की कुल प्रगति	दिनांक 21.07 2008 से 20.08.2008 तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज	289 कि.मी.	20 कि.मी.	22.5 कि.मी.	2.5 कि.मी.
2	ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.)	48 कि.मी.	3.00 कि.मी.	9.50 कि.मी.	6.50 कि.मी.
3	सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.)	1 नग	10%	12%	डिजाइन प्रस्तुत 2%
4	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.)	1 नग	10%	12%	डिजाइन प्रस्तुत 2%
5	राइजिंग मेन - 1000 एम.एम.	45 मीटर	0	0	इसकी आवश्यकता वर्ष 2009-10 में है।
(ब)	वित्तीय प्रगति				
1.	वित्तीय प्रगति (व्यय)	लागत रु. 236.23	17.84	21.00	3.16
2.	प्राप्त धन		30.00	30.00	--

नोट :
1. योजना दिनांक 17.8.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रु. 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को एवं रु. 15.00 करोड़ की द्वितीय किश्त दिनांक 20.4.2008 को निर्गत की गयी।
3. लगभग 180 कि.मी. सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम.एल.डी. के कार्य दिनांक 19.5.2008 से प्रारम्भ/ 18 माह की कार्य अवधि।
5. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य एवार्ड/कार्य 01.06.2008 से प्रारम्भ करा दिया जायेगा।
6. अति वृष्टि के कारण सीवर लाइन डालने की प्रगति धीमी है।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

d:progress/progressformat.xls sh1

1362 Annexure - 8

~~1271~~ 313

U.P. JAL NIGAM

DETAILS OF FUNDS RELEASED BY GOVT. OF INDIA AND GOVT. OF U.P UNDER GANGA ACTION PLAN

(31.07.2008 तक की स्थिति)

S.No.	G O No. & Date	Amount (Rs. in Crores)						
		Gomti Action Plan						
		Lucknow						
		Phase-I			Phase-II			
		G.O.I.	GoUP	Total	G O.I.	GoUP		Total
						Matching Grant 30%	Only for Land	
1	For Land of Daulatganj		2.61	2.61				
2	M-12036/1/2000-NRCD-II dated 14.11.2000			0.00				0.00
3	M-12036/1/96-NRCD-II dated 11.01-2001	2.75		2.75				0.00
4	M-12036/1/96-NRCD-II dated 14.03.2001	2.43		2.43				0.00
5	M-12036/1/96-NRCD-II dated 19.09-2001	5.00		5.00				0.00
6	M-12036/1/96-NRCD-II dated 27.5.2002	6.50		6.50				0.00
7	M-12036/1/96-NRCD-II dated 03.9.2002	7.10		7.10				0.00
8	M-12036/1/96-NRCD-II dated 30.06.2003	3.00		3.00				0.00
9	M-11014/2/2002-NRCD-II dated 30.6.2003			0.00	18.00			18.00
10	GoUP letter No. 143/नी-5-2004-46 बजट/98/नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ dated 23.01.04			0.00		7.71		7.71
11	M-12036/1/96-NRCD-II dated 31.08.2005	2.19		2.19				0.00
12	M-12036/1/96-NRCD-II dated 23.03.2006	1.74		1.74				0.00
13	M-11014/3/2003-NRCD-II dated 14.6.2006			0.00	11.40			11.40
14	GoUP G.O.I. UO278/मा-5-2006 9(2)/90/सी नगर विकास अनुभाग-5 dated 20.09.06			0.00		4.89		4.89
15	5861/नी-5-2006-9(1)/97 TC dated 16.02.07.							
16	M-12036/1/96-NRCD-II dated 16.3.07.	0.53		0.53				
17	M-14014/3/2003-NRCD-II dated 26.3.07.				3.45			3.45
18	M-14014/3/2003-NRCD-II dated 4/8.5.2007 for F.Y. 2007-08 (Plan)	--	--	--	2.31			2.31
19	उ.प्र.शासन के पत्र संख्या UO-130/नी-5-2007-9(2)/50/ dated 20.07.2007					1.48		1.48
20	उ.प्र.शासन के पत्र संख्या 664/CGA/9-5-07-119(162) /2000/ dated 03.10.2007					0.99		0.99
21	उ.प्र.शासन के पत्र संख्या 2279/9-5-2008-11(162) 2000 T.C. dated 31.03.2008 रु. 31.5942 करोड़ अवमुक्त 5.6.2008						31.5942	31.5942
22	M-14014/3/2003-NRCD-II dated 28.3.2008	--	--	--	4.65			4.65
23	उ.प्र.शासन के पत्र संख्या 3933/नी-5-2008-11(162)/2000 T.C. dated 21.05.2008 रु. 1.270 करोड़ के लिए						1.270	1.270
	3932/सी.जी.ए./नी-5-2008/11(162)/2000 दिनांक 21.5.2008	--	--	--		1.199		1.199
25	M-14014/3/2003-NRCD-II dated 3.6.2008 for F.Y. 2008-09 (Plan)	--	--	--	13.640			13.640
26	4701/नी-5-2008/11(162)/2000 टी.सी. दिनांक 07.7.2008					5.850		5.850
	TOTAL	31.240	2.610	33.850	53.450	22.119	32.864	108.433

d:progress/fundsdemand.xls sh 31.7.2008

1363 314

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW.

C. M. Application No. of 2008

State of U. P. ----------Applicant

In re

Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

APPLICATION FOR TAKING ON RECORD

The applicant – respondent above named, most respectfully submit as under:

The applicant is filing the affidavit in the above noted writ petition in compliance of the order dated 25.8.2008 passed by this Hon'ble Court, which is expedient in the interest of justice. Hence the same be taken up on the record of the writ petition.

P R A Y E R

Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow the accompanying affidavit to be taken on the record.

Such other and further order which this Hon'ble Court may deem just, fit and proper under the circumstances of the case may also be passed.

Lucknow

Dated: 16.10.08

ADDL.CHIEF STANDING COUNSEL

(COUNSEL FOR APPLICANT)

1364 TZ B 315

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW .

Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

AFFIDAVIT OF DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF U.P., IN COMPLINACE OF THIS HON'BLE COURT'S ORDER DATED 25.8.2008.

I, Surya Prakash Mishra aged about 50 years, son of Late Sri R. P. Mishra, presently posted as Special Secretary, Department of Urban Development , Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as Special Secretary , Department of Urban Development , Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, and as such he is fully conversant with the facts of the case deposed to hereinafter.

2 .That the deponent has read over the writ petition filed by the petitioner and has understood the contents thereof and is

1365 316 ~~1214~~

submitting some necessary facts, which are expedient in the interest of justice to be submitted before the Hon'ble Court herein under:

3. That the subject matter of the present writ petition relates to improvement of drinking water situation and sewage disposal system in Lucknow city.

4. That it is submitted that instant matter was listed on 25.8.2008 and on the day this Hon'ble Court pleased to pass an order , and directed to the respondents to submit the up-dated status report. This Hon'ble Court also directed to list the matter on 16th October 2008.

5. That in compliance of the order dated 25.8.2008 passed by this Hon'ble Court, instant affidavit is being filed narrating the facts and records relating to the matter in question.

6. That it is submitted that the U. P. Jal Nigam is an implementing agency on behalf of Nagar Nigam Lucknow and Jal Sansthan , Lucknow for execution, planning and design for drinking water supply, river pollution control work as well as the sewage disposal work. Therefore, the separate affidavit is being filed by the Nagar Nigam, Lucknow, U. P. Jal Nigam and Jal Sansthan , Lucknow in compliance of orders dated 25.8.2008 passed by this Hon'ble Court. However, the deponent is filing the progress report submitted by the U. P. Jal Nigam with regard to the '*Sewage Work*' and '*Water Supply Works*' . The true photostat copy of the progress details relating to the work performed by the U. P. Jal Nigam in different Zones of the Lucknow City till 15.10.2008 are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 1** to this affidavit. It is submitted that the master planning of water supply and sewerage works for the year

Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

1366 ~~1275~~ 317

2040 has been done and same has been approved by the Government of India under the Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme.

It is submitted that the details of work done under the Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme are being mentioned as under:

(i). The Jal Nigam prepared detail project report under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme under which total 40 + 21 new Tube-Wells were proposed to install, out of which till 15.10.2008, 28 + 3 new Tube-Wells have been installed and they are working, and the installation work with regard to remaining Tube-Wells are in progress.

Under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme total 43 old Tube-Wells were proposed for repairing, out of which till 15.10.2008, 25 old Tube-Wells have been repaired and they are working, and the repairing work with regard to 18 Tube-Wells are in progress.

The Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme covers about 133.31 Km. of distribution system, out of which the work within 36.0 Km have been completed till 15.10.2008.

The Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme covers about 14.40 Km. of work relating to rising main, out of which the work relating to 31 numbers of Tube-Wells have been completed till 15.10.2008, and rising main work relating to 16 numbers of Tube-Wells are in progress.

(ii). It is significant to submit that under the "Drinking Water Scheme" the works relating to installation of 409 numbers

Addl. Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

1367

of new hand-pumps were proposed, all of them have been installed and they are under working condition.

Under the "Drinking Water Scheme" the works relating to special repairing / rebore of 670 numbers of hand-pumps were proposed, all of them have been repaired / rebored and they are under working condition.

In addition to aforesaid hand-pumps, under the "Drinking Water Scheme" the works relating to installation of 5 numbers of new Tube-wells, and rebore of 39 other Tube-wells were proposed, out of them 3 new Tubewells have been installed and all have been rebored.

7. That it is submitted that as per report of the U.P. Jal Nigam, the work for finalisation of tender for establishment of 3rd water works has been completed and the date of start has been given to the Firm. The technical drawing and design of few units has been submitted by the contractor and are under evaluation.

8. That in Master Planning of Sewerage Works, Lucknow town is divided into four Sewerage Districts. Sewerage District – 1 estimate amounting to Rs. 236.234 Crore has been sanction by the Government of India. It is submitted that the Sewerage Scheme of District – 1 covers approximately 337 Km of sewer laying , construction of one Sewage Pumping Station of 56 mld capacity and one number STP of 14 mld at Daulatganj and other relevant works. It is submitted that 50.0 Km. of sewer line has been laid and the work of construction of Sewage Pumping Station and STP has been started after tendering process. As per report of the U.P. Jal Nigam, an expenditure amounting to Rs. 37.587 Crores has been made for the purposes. It is submitted that necessary repairing work in 42

Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

1368 319

mld STP at Daulatganj has also been done, resulting improvement in quality of effluent in STP, which is in accordance with the norms prescribed by the U.P. Pollution Control Board. The true photostat copy of a chart showing physical and financial progress of work under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 2** to this affidavit.

The construction work for Kukrail Nala Sewage Pumping Station has been started after shifting the place of Pumping Station. It is submitted that up to June 2008, 30 % work of Sewage Pumping Station has been completed; however, due to heavy rain and flood in Gomati River, the further progress could not be achieved.

9. That it is submitted that the detailed project report for Sewerage District – III (Part – 1 amounting to Rs. 362.84 Crore and Part – II amounting to Rs. 286.40 Crore) has been prepared and sent to the Government of India for its approval through Director, Local Bodies , U.P., Lucknow vide letter dated 25.8.2008; the true photostat copy whereof is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 3** to this affidavit.

10. That under the Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme the detailed project report of Sewerage District – II and IV of Lucknow City are under preparation and the same shall be submitted to the Government of India for its approval. The true photostat copy of the project report of Sewerage District – II and IV , Lucknow is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 4** to this affidavit.

Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

1369 320

11. That it is significant to submit that under Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow during the Financial Year 2008 – 09, at village Bharawara, Lonapur and Bhaisora for construction of Sewage Treatment Plant of 370 mld capacity, the possession has been taken by the Nagar Nigam, on 16.7.2008, and after finalisation of tendering process, the work for construction of STP has been started on 19.7.2008. However, due to heavy rain and flood in Gomati River, the required progress could not be achieved.

It is significant to submit that vide Government Order No. 5510 / Nine – 5 – 2008 – 264 Budget / 08 dated 10th October 2008 , the State Government has sanctioned an amount of Rs. 18,60,00,000.00 for construction of 345 mld capacity Sewage Treatment Plant at village Bharawara, Lucknow. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 10th October 2008 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 5** to this affidavit.

It is significant to submit that the construction work relating to sanctioned schemes under Gomti Action Plan Phase – I have been completed except to three schemes , which were under progress. However, due to heavy rain and flood in Gomati River, the required progress could not be achieved.

It is submitted that several works relating to Gomti Action Plan Phase – II at Lucknow have been completed and remaining are in progress.

It is most humbly submitted that due to heavy rain, the works relating to sewer as well as pollution eradication work in river Gomti in district Lucknow have been effected.

The true photostat copies of the progress details relating to the work performed by the U. P. Jal Nigam under the Gomti

Oath Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

1370 ~~1219~~ 321

Action Plan Phase – I ; Gomti Action Plan Phase – II and under the Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme (in Lucknow Sewerage District – I) till 15.10.2008 with latest physical / financial progress report are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 6** to this affidavit.

12. That it is significant to submit that in the Financial Year 2008 – 09, as share of State Government under the JNNURM / UIDSSMT Programs, vide Government Order No. 4210 / Nine – 5 – 2008 – 21 J / 2008 dated 29th September 2008 , the State Government has sanctioned an amount of Rs. 480.589 Crores for sewerage works and an amount of Rs. 790.620 for Drinking Water works in Lucknow City. The true photostat copy of the aforesaid Government Order dated 29th September 2008 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 7** to this affidavit.

13. That it is submitted that for compliance of order dated 25.8.2008 passed by this Hon'ble Court vide the letter dated 03.10.2008, the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow has been directed by the State Government to receive the report of NEERI, Nagpur at earliest, and to ensure the work according to the report of NEERI, Nagpur. The true photostat copy of the aforesaid letter dated 03.10.2008 of the State Government is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 8** to this affidavit.

It is submitted that in pursuance to the aforesaid letter dated 03.10.2008 of the State Government, vide letter dated 14.10.2008, the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow informed to the State Government that after preliminary examination, the NEERI, Nagpur has submitted

its 'Expert Report' on 14.10.2008. The true photostat copies of the aforesaid letter dated 14.10.2008 of the Addl. Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow and 'Expert Report dated 14.10.2008 of the NEERI, Nagpur' are being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 9** and **ANNEXURE No. A – 10** to this affidavit.

14. That it is submitted that the '*Expert Report dated 14.10.2008 of the NEERI, Nagpur*' recommended for environmental assessment of the lands selected for the purposes of utilizing as sites for disposal of solid waste in Lucknow City, to avoid any further problems of environmental pollution.

It is significant to submit that for management of solid waste, 40.19 Hectare land shall be acquired at Hardoi Road and 38.77 Hectare land shall be acquired at Deva Road, and the proposal for the same have been submitted by the Lucknow Development Authority, Lucknow to District Magistrate, Lucknow for initiation of the proceedings under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for acquiring 40.19 Hectare land at Hardoi Road and 38.77 Hectare land at Deva Road, Lucknow. It is significant to submit that in reference to the aforesaid report dated 14.10.2008 submitted by the NEERI, Nagpur, the sites for disposal of solid waste shall be finalized at the level of competent body after environmental assessment of the selected lands.

15. That in view of facts and circumstances stated herein above, it is significant to submit that the Urban Development Department, State of U.P. is taking all necessary steps in the matter in question.

Lucknow

Dated : 15-10-08

Deponent

1372 ~~1281~~ 323

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of the paragraphs 1, 2 of this affidavit are true to my personal knowledge those of paragraphs 3 to 14 are true to my information which derived from the records and those of paragraphs 15 are based on legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God.

Lucknow

Dated : 15-10-2008

Deponent

I , identify the deponent who has signed before me.

(ओम प्रकाश चौहान)
लिपिक आधिकारी
नगर विकास अनुभाग-5
उ.प्र. सचिवालय लखनऊ

Commissioner Civil LUCKNOW Civil Secretariat

300/00

शपथ सं. .....
द्वारा शपथ ली गई .....
जिनका परिचय श्री .....
दिनांक 15-10-08 समय .....
वाद संख्या .....
पक्षकार .....
न्यायालय .....
शपथ की फीस वसूली गई .....

अभिसाक्षी ने शपथ - पत्र पढ़ लिया है, और इसकी विषय वस्तु समझता है।

15/X/08

(डा० जटाशंकर त्रिपाठी)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-5 (फौजदारी)
उ० प्र० शासन

ANNEXURE NO A-1

1373 ~~202~~ 324

Progress of Sewer Works in Compliance of HON'BLE COURT'S ORDER DATED 25-8-2008 in W/P No. 4436 (M/B)/2003

1. UP Jal Nigam is an implementing agency on behalf of local body i.e. Nagar Nigam Lucknow/ Jal Sansthan for execution, planning and design for drinking water supply and the sewage disposal. Jal Nigam is preparing detail project report under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme under which funding pattern is 50% by Government of India, 20% by State Government and rest 30% by local bodies. Master planning of water supply and sewerage works for the year 2040 has been done for Lucknow town and has been approved by the Govt. of India under JNNURM Programme.

2. In Master Planning of Sewerage Works, Lucknow town is divided into 4 Sewerage Districts. Sewerage District-I estimate amounting to Rs. 236.234 Crore has been sanctioned by Govt. of India. Detailed Project Report for Sewerage District-III (Part-I amounting to Rs. 362.84 Crore and Part-II amounting to Rs. 286.40 Crore) has been prepared and sent to Govt. of India for approval through Local Body wide letter no. tak cell/2147/38(I) 08 dated 25.08 2008 A Photocopy of this letter is annexed as ANNEXURE -I.

Oath Commissioner LUCKNOW

1374 ~~1285~~ 325

3 The Detailed Project Report of Sewerage District-II & IV are under preparation which will be soon submitted to Govt. of India. The details of work proposed in different Sewerage District is annexed as ANNEXURE-II .

4 Government of India has issued fund released order for Rs.29.53 crore on 3-10-2007 in favour of Government of UP against detailed project report of sewage district-I (amounting to Rs.236.23 crore). Matching grant 50%, 20% and 30% has been released by Central, State Government and Local body respectively. A photo copy of the letter dated 3.10.2007 issued by Government of India, Ministry of Finance Department of Expenditure is being annexed as ANNEXURE-III .

5 Sewerage scheme of District-I covers approximately 337 Km of sewer laying, construction of one sewage pumping station of 56 mld capacity and one No. STP of 14 mld at Daulatganj and other relevant works. 50.0 Km of sewer line has been laid and the work of construction of sewage pumping station and STP has been started after tendering process. An expenditure of Rs. 37.587 Crore has been made against release of Rs. 43.037 Crore (Rs. 15.00 Crore on 19.03.2008 and Rs. 15.00 Crore on 22.04.2008 and Rs13.037 Crore on 06.10.2008). A chart showing Physical and Financial progress of works under JNNURM Programme is being annexed as ANNEXURE-IV.

Oath Commissioner LUCKNOW

1375 ~~1284~~ 326

6 The construction work for Kukrail Nala Sewage pumping Station has been started after shifting the place of Pumping Station. Upto June 2008 30% work of Pumping station has been completed and due to heavy rainfall and flood in Gomti River, the further progress could not be achieved.

7 In cleaning of Gomti River, the land for construction of 345 mld STP has been acquired by Nagar Nigam, Lucknow on 16.7.2008 and after finalization of tendering process, the work for STP has been started on 19.7.2008. The required progress of STP could not be achieved due to heavy rainfall and flood in Gomti River.

8 Necessary repairing works in 42 mld STP at Daulatganj has been done resulting improvement in quality of effluent in STP which is in accordance of norms of U.P. Pollution Control Board. Test report of influent and effluent sample dated 22.02.2008, 25.03.2008, 06.05.2008, 26.05.2008, 31.07.2008 & 29.08.2008 is being annexed as ANNEXURE-V .

9 It is further submitted that the work done under Gomti Action Plan Phase-I and Phase-II detailed up to date chart has been prepared and is annexed as ANNEXURE-VI .

15/1/09

Project Manager
Gomti Pollution Control Unit-I/Temp.
U.P.Jal Nigam, Lucknow

15/1/09

General Manager
Gomti Pollution Control Unit
U.P.Jal Nigam, Lucknow

Oath Commissioner
LUCKNOW

1376 ~~1285~~ 327

Progress of Water Supply Works in Compliance of HON'BLE COURT'S ORDER DATED 25-8-2008 in W/P No. 4436 (M/B)/2003

10. That so far installation of 21 tube wells is concerned , the work has been completed for 3 tube wells. There is no water supply system available, so after completing the work of the installation of tube wells it will take some time and would be commissioned after laying of distribution system. The work of 14 tube wells are under progress. A photo copy of the chart in respect of installation of 21 tube wells is being annexed as **Annexure no.VIII**.

11. Target of Re-boring under JNNURM Programmeis is 43 tube wells.The work has been competed for 25 tube wells and the work is in progress for 18 tube wells. A photo copy of progress chart in respect of re-boring of 43 tube wells is being annexed as **Annexure no.IX**.

12. Target of installation of 409 new handpumps and re-boring / special repair of 670 handpumps was fixed under District Plan (urban). Out of which all the 409 new hand pumps and re-boring / special repair of 670 handpumps has been completed. A photo copy of progress chart in detail, including new installed hand pumps is being annexed as **Annexure no.X** .

Oath Commissioner LUCKNOW

 1377 ~~1286~~ 328

13. In addition to JNNURM, UP Jal Nigam has worked under Urban Water Supply (normal) programme for which fund has been provided by State Government for the work of installation of tube wells, re-boring of tube wells and other works. Out of 5 proposed tube wells, the works for 3 tube wells have been completed and the work for 1 tube wells is in progress. Out of proposed 39 rebore tube wells all the 39 tube wells has been rebored. A photo copy of progress chart in this respect is being annexed as **Annexure no.X** .

14. The work for finalization of tender for establishment of 3rd Water works has been completed and the date of start has been given to the Firm. The technical drawing and design of few units has been submitted by the contractor and are under evaluation . The Work of excavation of foundation of Central CWR , Boundry Wall , and Zonal Underground water storage tanks are in progress. As per Approved estimate the work is to be completed by 2010, efforts will be made to complete the work before time.

15. The progress of water supply schemes under different Programme as per Order of HON'BLE COURT on 20August 07,27 March 2008 &21July 2008 is annexed as ANNEXURE No.XI & XII.

16. Present status of Master Plan of Lucknow Water Supply is annexed as ANNEXURE No. XIII.

15/10/08

Project Manager
Payjal –II
U.P.Jal Nigam, Lucknow

General Manager
(PAYJAL)
U.P.Jal Nigam, Lucknow

Commissioner LUCKNOW

पेयजल योजना

ANNEXURE No A-2

(रू0 करोड़ में)

329

क्र0 सं0	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दि. 20.08.07 तक प्रगति	20.08.07 से 27.03.08 की प्रगति	दि. 27.03.08 से दि. 21.07.08 तक प्रगति	दि. 21.07.08 से दि. 15.10.08 तक प्रगति	दि. 15.10.08 तक कुल प्रगति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम							
1.	नये नलकूप(समस्याग्रस्त क्षेत्रों मे)	40 नग	-	9 नग प्रगति में	22 नग चालू, 18 नग प्रगति पर।	6 नग चालू।	28 नग चालू, 12 नग प्रगति पर।	सूची संलग्न
	नये नलकूप(विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत)	21 नग	-	4 नग प्रगति में	3 नग चालू, 12 नग प्रगति पर।	2 नग पर कार्य प्रारम्भ तथा प्रगति पर।	3 नग चालू, 14 नग प्रगति पर।	
2.	रिबोर नलकूप	43 नग	-	2 नग प्रगति में	7 नग चालू, 22 नग प्रगति पर।	10 नग चालू, नये 12 नगों पर कार्य प्रारम्भ तथा प्रगति पर।	25 नग चालू, 18 नग प्रगति पर।	
3.	वितरण प्रणाली	133.31 कि.मी.	-	-	17.00 कि.मी.	19.00 कि.मी.	36.00 कि.मी.	
4.	राइजिंग मेन	14.40 कि.मी.	-	-	22 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू, 18 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर।	9 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू तथा 8 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रारम्भ।	31 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 16 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर।	
	सामान्य कार्यक्रम							
1.	नये हैण्डपम्प	409 नग	53 नग	69 नग	287 नग	-	409 नग	
2.	विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प	670 नग	153 नग	86 नग	431 नग	-	670 नग	
3.	नये नलकूप	5 नग	2 नग	1 नग प्रगति पर।	1 नग	1 नग पर कार्य प्रारम्भ	3 नग चालू तथा 1 नग प्रगति पर।	शेष 1 नग पर स्थल विवादित होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।
4.	रिबोर नलकूप	39 नग	17 नग	8 नग	14 नग	-	39 नग।	

Oath Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

परियोजना प्रबन्धक

महाप्रबन्धक(पेयजल)

ANNEXURE No.A-3

~~1288~~ 330
1379

निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0,
8वां तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ

सेवा में,
श्री नितिन आर0 गोकर्ण
निदेशक,
शहरी विकास मन्त्रालय (निर्माण भवन),
भारत सरकार, नई दिल्ली।

संख्या- क0 सेल/2143/38(1)/09 लखनऊ दिनांक 27/08/2009
विषय- JNNURM योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में।

महोदय,

JNNURM योजना के UIG कार्यान्श में निम्न योजनायें स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी को प्राप्त हुई हैं इन योजनाओं की स्वीकृति वित्त एवं कार्य समिति उ0प्र0 शासन से भी प्राप्त हो चुकी है।

सं0	योजना का नाम	योजना लागत(करोड़ रु)
1	JNNURM योजना के अन्तर्गत लखनऊ शहर में सीवरेज कार्य (डिस्ट्रिक्ट-3, पार्ट-1)	362.34
2	JNNURM योजना के अन्तर्गत लखनऊ शहर में सीवरेज कार्य (डिस्ट्रिक्ट-III पार्ट-2)	286.40
3	वाराणसी के ट्रान्स गोमती क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था	253.82
4	JNNURM योजना के अन्तर्गत वाराणसी की पेयजल योजना (सिस वरूणा क्षेत्र)	90.70
5	इलाहाबाद पेयजल योजना भाग-2	211.43

उक्त डी0पी0आर0 की प्रति एवं अप्रेजल रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त योजनाओं का अप्रेजल CPHEEO से कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक।

प्रतिलिपिः-
1- विशेष सचिव नगर विकास अनुभाग-5 को सूचनार्थ प्रेषित।
2- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम 6 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त योजनाओं का प्रस्तुतीकरण कराने का कष्ट करें।
3- नगर आयुक्त लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद एवं कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक।

Commissioner LUCKNOW

1380

ANNEXURE No. A-4

331

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर की सीवरेज योजना के मुख्य बिन्दु

दिनांक 15.10.2008 तक

क्र.सं.	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट	आच्छादित क्षेत्र	परिकल्पित जनसंख्या			उत्पन्न होने वाला दूषित जल (मिलियन लीटर प्रतिदिन)			अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)		प्रति व्यक्ति लागत (सी.डी.पी. के अनुसार रु. में)		प्रति व्यक्ति लागत (डी.पी.आर. के अनुसार रु में)		प्रस्तावित मुख्य कार्य	एस.टी.पी. की प्रस्तावित क्षमता एवं स्थान	अद्यतन स्थिति
			2010	2025	2040	2010	2025	2040	सी.डी.पी. के अनुसार	डी.पी.आर के अनुसार	2010	2040	2010	2040			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-I (भारत सरकार दि. 17.8.2007 को स्वीकृत)	चौक, हरदोई रोड, कैम्पवेल रोड, दुबग्गा आदि क्षेत्र	287335	448634	565069	36	55	70	229.55	236.23	7988.93	4062.34	8221.35	4180.52	ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - 150 से 1800 मिमी साइज लगभग 337 कि.मी. सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग राइजिंग मेन - 50 मीटर एस0टी0पी0 (14 एम.एल.डी.) - 1 नग विविध कार्य - जाब	दौलतगंज में निर्मित 42 एम.एल.डी. एस.टी.पी. की क्षमता 14 एम.एल.डी बढ़ाकर 56 एम.एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए) प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2040 के लिए 70 एम. एल.डी.।	निर्माणाधीन
2	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-II	अमौसी, सरोजनी नगर, कानपुर रोड तथा शारदा कैनाल के पार का क्षेत्र	225975	442125	884500	28	54	108	489.98	--	21682.93	5539.63			ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - लगभग 3180 किमी सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग राइजिंग मेन - 50 मीटर एस0टी0पी0 (108 एम.एल.डी.) - 1 नग विविध कार्य - जाब	ग्राम ख्वाजापुर में वर्ष 2040 के लिए 108 एम. एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए 54 एम.एल.डी.)	विरचन अन्तर्गत
3.1	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III (पार्ट -I)	गोमती नदी के पार सीतापुर रोड, त्रिवेणी नगर एवं कुकरैल नाले के दाई ओर के क्षेत्र	709558	1130121	1765143	87	138	216	276.03	308.80	3890.16	1563.80	4351.96	1749.41	ट्रंक/ ब्रान्च सीवर 150मिमी से 2600 मिमी - लगभग 485 किमी राइजिंगमेन 800 मिमी - 3000 मी. सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग एस.टी.पी. - नही विविध कार्य - जाब	ग्राम भरवारा के निकट गोमती कार्य योजना में प्रस्तावित 345 एम.एल.डी के एस.टी.पी. पर्याप्त है	विरचित कर दि. 25.8.08 को भारत सरकार को प्रेषित

Commissioner Civil Secretariat LUCKNOW

1381

332

क्र.सं	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट	आच्छादित क्षेत्र	परिकल्पित जनसंख्या			उत्पन्न होने वाला दूषित जल (मिलियन लीटर प्रतिदिन)			अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)		प्रति व्यक्ति लागत (सी.डी.पी. के अनुसार रु. में)		प्रति व्यक्ति लागत डी.पी.आर. के अनुसार रु में)		प्रस्तावित मुख्य कार्य	एस.टी.पी. की प्रस्तावित क्षमता एवं स्थान	अद्यतन स्थिति
			2010	2025	2040	2010	2025	2040	सी.डी.पी. के अनुसार	डी.पी.आर के अनुसार	2010	2040	2010	2040			
3.2	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III (पार्ट-II)	गोमती नदी के पार, कुकरैल नाले के बाई तरफ इन्दिरा नगर, चिनहट एवं गोमती नगर के क्षेत्र	465860	716805	1059143	57	88	130	165.03	244.03	3542.48	1558.15	5238.27	2304 03	ट्रंक/ ब्रान्च सीवर 150मिमी से 1600 मिमी - लगभग 350 किमी राइजिंगमेन - 3375 मी. सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 3 नग एस.टी.पी. - नहीं विविध कार्य - जाब	ग्राम भरवारा के निकट गोमती कार्य योजना में प्रस्तावित 345 एम.एल.डी के एस.टी.पी. पर्याप्त है	विरचित कर दि. 25.8.08 को भारत सरकार को प्रेषित
4	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-IV	शहर का मुख्य क्षेत्र, इजरतगंज, अमीनाबाद, गऊघाट, गऊघाटीपुरम् आदि	1114272	1505315	2148145	136	184	263	955.08	--	8571.34	4446.07			ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - लगभग 4030 किमी सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 2 नग एस0टी0पी0 (270 एम.एल.डी.) - 1 नग विविध कार्य - जाब	ग्राम मस्तेमऊ में वर्ष 2040 के लिए 270 एम. एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए 180 एम.एल.डी.)	विरचन अन्तर्गत
	TOTAL		2803000	4243000	6422000	344	519	787	2115.67		7547 88	3294.41				787 MLD	

सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-I की डी.पी.आर. अनुमानित लागत रु. 277.57 करोड़ दिनांक 17 08.2007 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में रु. 236.23 करोड़ के लिए पारित हो चुकी है। इसका क्षेत्र गऊघाट पेयजल इनटेक के पास का है तथा इसके क्रियान्वयन से गोमती नदी की जल गुणता पर पर्याप्त सुधार आयेगा, जिससे पेयजल हेतु लिये जा रहे कच्चे जल की गुणता में भी सुधार आयेगा। अक्टूबर 2008 तक लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट की योजना पर नगर निगम से रु. 43.037 करोड़ जल निगम को प्राप्त हो चुके हैं।

d.aks/NURM xls sh7

(प्र. अ. सिंचाई)
वि. प्रबन्धन
जल निगम
लखनऊ

संख्या- 5510/नौ-5-2008-264बजट/08

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 10 अक्टूबर, 2008

विषयः गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत लखनऊ नगर के भरवारा गांव में 345 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या 1/कैम्प-जीएम गोमती-1 दिनांक 03.06.08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत लखनऊ नगर के भरवारा गांव में 345 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु आगणन रू0 16970.71 लाख पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए राज्यांश की बढ़ी हुई धनराशि में से रू0 18,60,00,000/- (रू0 अट्ठारह करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2008-09 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है :-

1. उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा विशेष सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बिल प्रस्तुत करके लखनऊ कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
2. प्रश्नगत धनराशि भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है। उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक में नहीं रखा जायेगा।
4. विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्तें निर्धारित की गयी थीं, उन्हीं शर्तो के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
5. प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। अन्य कार्यों पर नहीं किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर फेजिंग के अनुसार दो माह के अन्तराल में तीन समानुपातिक किश्तों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-106-वायु एवं जल प्रदूषण निवारण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-03-नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम (70 प्रतिशत केन्द्र सहायतित)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8-3498/दस-08, दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग।
8. नियोजन अनुभाग-3, 4।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

1385 1384

ANNEXURE NO. A-1

335 सलग्नक-

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति
गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दि. 20.8.2007 तक प्रगति	20.8.2007 से 27.3.2008 की प्रगति	दि. 27.3.2008 से 21.7.20008 तक प्रगति	दि. 21.7.2008 से दि. 15.10.08 तक प्रगति	दि. 15.10.2008 तक कुल प्रगति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(अ)	भौतिक प्रगति							
1.	आई. एण्ड डी. कार्य - 6 नग	6 नग	5 नग	--	--	--	--	
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 5 नग	6 नग	5 नग	1 नग (10%)	1 नग (15%)	1 नग (5%)	5 नग पूर्ण, 1 नग (30%)	माह जुलाई-08 से वर्षा के कार्य की प्रगति प्रभावित।
3	राइजिंग मेन - 7525 मीटर	7525 मीटर	4780 मीटर	330 मीटर	10 मीटर	10 मीटर	5120 मीटर	〃
4	सीवर लाइन - 20 मीटर	20 मीटर	20 मीटर	--	--	--	पूर्ण	
5	स्टाफ क्वार्टर - 4 नग	4 नग	4 नग	--	--	--	पूर्ण	
6	जेनसेट - 8 नग	8 नग	8 नग	--	--	--	पूर्ण	
7	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग	1 नग	1 नग	--	--	--	पूर्ण	
8	भूमि अधिग्रहण - जाव	1 नग	1 नग	--	--	--	पूर्ण	
9	पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग	25 नग	25 नग	--	--	--	पूर्ण	
10	विद्युत संयोजन - 6 नग	6 नग	5 नग	--	--	--	पूर्ण	
11	विविध कार्य - जाव	100%	50%	20%	20%	2%	42%	〃
(ब)	वित्तीय प्रगति							
	वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड़)	44.75						
1.	वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़)		33.177	0.715	0.861	1.803	36.556	
2.	प्राप्त धन (रु. करोड़)		33.850	--	--	--	33.850	

नोट : कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण स्थल सेना के साथ विवादग्रस्त था। दिनांक 31.10.2008 को नगर निगम द्वारा दूसरा निर्माण स्थल उपलब्ध कराया गया जिस पर कार्य प्रारम्भ किया गया। पुनः दिनांक 4.2.2008 को सिंचाई विभाग द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया। उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.4.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी। जुलाई के अन्तिम सप्ताह से कार्य गोमती नदी में बाढ़ के कारण बाधित हुआ जिसके कारण पम्पिंग स्टेशन की प्रगति धीमी थी।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

1385

~~संलग्नक~~

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रु. करो

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दि. 20.8.2007 तक प्रगति	20.8.2007 से 27.3.2008 की प्रगति	दि. 27.3.2008 से 21.7.20008 तक प्रगति	दि. 21.7.2008 से दि. 15.10.08 तक प्रगति	दि. 15.10.2008 तक कुल प्रगति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(अ)	भौतिक प्रगति							
1	आई. एण्ड डी. कार्य - 18 नग	18 नग	17 नग 80%	17 नग 5%	17 नग 10%	--	17 नग 95%	
				1 नग 5%	1 नग 10%	1 नग 5%	1 नग 20%	
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग	11 नग	10 नग 95%	1 नग 5%	1 नग 25%	--	10 नग 95% 1 नग 30%	
3	राइजिंग मेन - 18955 मीटर	18955 मीटर	8000 मीटर	41 मीटर	78 मीटर	15 मीटर	8134 मीटर	
4	सीवर लाइन - 6092 मीटर	6092 मीटर	3200 मीटर	110 मीटर	90 मीटर	60 मीटर	3460 मीटर	
5	स्टाफ क्वार्टर - 11 नग	11 नग	80%	--	--	--	80%	
6	जेनसेट - 25 नग	25 नग	80%	--	20%	--	100%	
7	मेन पम्पिंग स्टेशन - 1 नग	1 नग	10%	21%	19%	20%	70%	
8	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग	3 नग	--	1 नग 3%	1 नग 3%	1 नग 4%	1 नग 10%	
9	सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग	7 नग	6 नग	1 नग 5%	1 नग 40%	--	6 नग 100% 1 नग 90%	
10	नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग	5 नग	--	5 नग 55%	5 नग 40%	--	1 नग 90%	
11	शौचालय का निर्माण - 21 नग	21 नग	--	6 नग	--	--	6 नग	
12	वनीकरण - जाब	20%	--	--	5%	--	5%	
13	जनजागरण - जाब	20%	--	--	5%	--	5%	
14	भूमि अधिग्रहण - जाब	100%	10%	--	90%	--	100%	
15	पम्पिंग प्लान्ट - जाब	58 नग	90%	--	5%	--	95%	
16	विद्युत संयोजन - जाब	100%	60%	5%	5%	--	70%	
17	विविध कार्य - जाब	100%	20%	5%	10%	5%	40%	
(ब)	वित्तीय प्रगति							
	वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड़)	263.04						
1.	वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़)		42.847	8.596	43.041	13.948	108.432	
2	प्राप्त धन (रु. करोड़)		49.239	0.99	42.539	15.665	108.433	

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

~~1295~~ ANNEXURE No. A-7

~~1387~~ 1386

संख्याः 4210/नौ-5-2008-21ज/2008

~~337~~

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 29 ~~26~~ सितम्बर, 2008

विषयः- वित्तीय वर्ष 2008-09 में जेएनएनयूआरएम/यूआईडीएसएसएमटी योजनान्तर्गत निकायों के अंश की धनराशि 'मा0 कांशीराम जी नगर विकास योजना' से ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 722/तकनीकी सेल-76/2006, दिनांक 26.05.08 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वाल्लू वित्तीय वर्ष 2008-09 में जेएनएनयूआरएम/यूआईडीएसएसएमटी योजनान्तर्गत आच्छादित नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों में पेयजल/सीवरेज/रोड और फ्लाई ओवर निर्माण हेतु **'मा0 कांशीराम जी नगर विकास योजना'** से कुल रू0 28,95,42,000/- (रू0 अट्ठाईस करोड़ पच्चान्नबे लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्नलिखित कार्यों एवं शर्तों/उपबन्धों के अधीन स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	परियोजना का नाम	भा/स द्वारा अनुमोदित लागत	भा/स द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि	प्रथम किश्त के सापेक्ष अवमुक्त राज्यांश	निकाय का कुल अंश	निकाय के अंश के सापेक्ष गत वर्ष स्वीकृत ब्याज रहित ऋण	वित्तीय वर्ष 2008-09 में स्वीकृत ब्याज रहित ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
	यूआईजी						
1	लखनऊ सीवरेज योजना	23623.00	2952.87	1181.148	1771.722	1291.133	**480.589**
2	लखनऊ पेयजल योजना	38861.00	4857.63	1943.052	2914.578	2123.958	**790.620**
3	आगरा सीवरेज योजना	2162.00	270.25	108.100	162.150	118.147	**44.003**
4	कानपुर पेयजल योजना	27094.89	2709.49	1083 796	1625.694	1178.924	**446.770**
	यूआईडीएसएसएमटी						
5	रामपुर नगर में रामपुर रोड और फ्लाई ओवर निर्माण	8958.00	3583.20	447.90	447.900	84.500	**363.400**
6	बरूआसागर पेयजल योजना	718.62	287.45	35.93	35.930	0.000	**35.930**
7	लोनी सीवरेज योजना	7341.24	2936.50	367.06	734.108	0.000	**734.108**
						योग	**2895.420**

(रू0 अट्ठाईस करोड़ पच्चान्नबे लाख बयालीस हजार मात्र)

1. उक्त धनराशि संबंधित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी, अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित निकाय की औपचारिक सहमति/अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2. आवंटित धनराशि आहरित कर यथाप्रक्रिया निहित प्रयोजन हेतु व्यय की जायेगी।
3. प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. जिन कार्यो के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाए।
6. स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था तथा जिलाधिकारी का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।
7. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
8. उपरोक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश जारी/निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पाक्षिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुए प्रगति विवरण प्रत्येक पक्ष में निदेशक, स्थानीय निकाय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।
11. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त न कर दो-दो माह का फेजिंग/अंतराल के अनुसार तीन समानुपातिक किश्तों में आहरित की जायेगी।
12. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार उ.प्र., इलाहाबाद एवं शासन को 31 मार्च, 2009 तक तक उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक अनुदान की संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"6215 जलापूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मलजल तथा सफाई-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-05-मा0 कांशीराम नगर विकास योजना के अन्तर्गत ऋण-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8- 3438-दस/08, दिनांक 25.09.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

GORF-(08-09)-S1.doc

1388 339

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. संबंधित महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
10. संबंधित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/नगर विकास अनुभाग-5।
12. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

ANNEXURE No. A-8

1389

340

मा0उच्च न्यायालय में सुनवाई की तिथि दिनांक 16.10.2008

सूर्य प्रकाश मिश्र,

विशेष सचिव ।

अर्द्धशा.पत्रसं.-49रिट(1)/नौ-5-2008-4रिट/07

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 03 अक्टूबर, 2008

प्रिय महोदय,

रिट याचिका संख्या-4436(एमबी)/2003 "सीवेज ट्रीटमन्ट प्लान्ट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य" तथा रिट याचिका संख्या-7648(एमबी)/2008 बनवारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य" में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.8.2008 को पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने के संबंध में शासन के पत्र संख्या-49रिट/नौ-5-2008-4रिट/07 दिनांक 17.9.2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में नीरी से रिपोर्ट प्राप्त कर मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.10.2008 को प्रस्तुत की जानी है ।

3- इस संबंध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का सम्पूर्ण अनुपालन कराते हुए प्रकरण में किसी विज्ञ अधिकारी को नीरी (नागपुर) भेजकर रिपोर्ट प्राप्त करने का कष्ट करें एवं उक्त रिपोर्ट के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)

o/c

श्री शैलेश कुमार सिंह,
नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

DC Chauhan

1390

ANNEXURE No. A-9

7543(9.5.9

341

मा. उच्च न्यायालय प्रकरण/अति आवश्यक

नगर निगम लखनऊ

प्रेषक,	सेवा में,
अपर नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ।	परियोजना प्रबन्धक सी.एण्ड.डी.एस. उत्तर प्रदेश, जल निगम लखनऊ।
संख्याः- D-526/amc-Apo8 दिनांकः- 14-10-2008	नत्थी

—: विषय :—

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2000 के अनुसार प्रस्तावित लैण्ड फिल साईटों के संबंध मे।

महोदय,

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अंतर्गत लखनऊ नगर की स्वीकृत रु. 42.92 करोड़ की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2000 के प्राविधानो के अनुसार सेनेटरी लैण्ड फिल साईट का विकास किये जाने हेतु हरदोई रोड एवं देवा रोड पर भूमि चिन्हीकरण/अधिग्रहण की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।

शासन स्तर पर इस संबंध में आयोजित बैठक मे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तीव्र गति से कराये जाने हेतु विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है एवं इस संदर्भ में चिन्हित भूमि का एनवॉयरमेंटल असेसमेन्ट कराये जाने के भी निर्देश दिये गये है।

मा. उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 4436(एम./बी.)/2003 में दिनांक 25.08.2008 को पारित अंतरिम आदेश के क्रम में नगर निगम द्वारा उक्त चिन्हित भूमियों के विवरण नीरी, नागपुर को प्रेषित किये गये थे जिनका प्रारम्भिक परीक्षण किये जाने के पश्चात् नीरी ने अपने पत्र संख्या एसडब्ल्यूएमयू/एचक्यू/2008 दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 द्वारा विशेषज्ञ आख्या प्रेषित की है, जो पत्र के साथ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

तद्क्रम में कृपया हरदोई रोड एवं देवा रोड पर चयनित किये गये लैण्ड फिल साईटों के एनवॉयरमेंटल असेसमेंट तत्काल कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि भूमियों की उपयुक्तता के अनुसार नीरी की अंतिम संस्तुति प्राप्त की जा सके।

भवदीय

(ए.सी. सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

प्रतिलिपिः—

1. श्री एच.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ।
2. श्री एस.पी. मिश्र, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग, लखनऊ।
3. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
4. मुख्य पर्यावरण अभियंता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(ए.सी. सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

1392
1391
1390

ANNEXURE No. A-10

342

National Environmental Engineering Research Institute
Nehru Marg, Nagpur 440 020

Dr. A.N. Vaidya **Tele**
Assistant Director
Solid Waste Management Unit

{ phone : 0712-2249752 (direct)
{ : 0712-2249885 (6 lines) Extn. 287
{ fax : 0712-2249752
{ gram : NEERI, Nagpur-20
{ email : an_vaidya@neeri.res.in

SWMU/HQ/2008
October 14, 2008

Fax No. 0522-2622440

To,

Municipal Commissioner,
Lucknow Nagar Nigam.
Lucknow

Subject: MSW dumping on the Gomati river bank near Gandhi Setu, Lucknow

Sir,

This has refcrence to your letter No.31 /नगर/अ.अ dated September 19, 2008 and which was received in this office on September 30, 2008. The said letter is accompanied by the following documents.

1. Proposal for park and retaining wall(Bandha) at site of M.S.W. dumping on the Gomati river bed near Gandhi setu, Lucknow
2. Statement of Directives from Hon'ble High Court for Writ Petition No. 4436(MB) of 2005
3. Comments on the above proposal by Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB)

After the preliminary examination of these documents following comments are offered.

- Retaining wall has been suggested in both the options delineated in NEERI's report to protect ground water contamination and river water contamination. This is duly considered in the proposal. However design and construction of the retaining wall must be examined in the context of hydro-geological data, ground water gradient, and topography of the area. This information is not included explicitly in the proposal. However, these designs should be vetted by competent agencies like State Public Works Department, State Irrigation Department, or Jal Nigam, which are actively involved in such activities.

1392 1393 343

- The Closure of the dumping site should necessarily follow MSW 2000 rules as referred in the proposal and the comments offered by UPPCB in this regard should also be considered.

- As regards the site selection for the Sanitary Landfill site, it is suggested that the concerned authorities should identify few sites, considering all necessary statutory requirements. NEERI will assist in finalizing the site selection on the basis of environmental impacts. The budget requirements for NEERI for conducting such studies could be finalized at a later date.

With regards,

Yours faithfully,

(A.N.Vaidya) 14/10/08

(2) of (2)

15/X/09

(डा० जटाशंकर त्रिपाठी)
अपर आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग–5 (फौजदारी)
उ० प्र० शासन

Oath Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat

1393 1502 344

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

IN RE:

Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant ----------Petitioner

Versus

State of U.P. and others ----------Opposite parties

AFFIDAVIT ON BEHALF OF NAGAR NIGAM, LUCKNOW IN COMPLIANCE OF THE ORDER 25.08.2008 PASSED BY THIS HON'BLE COURT

I, Shailesh Kumar Singh, aged about 52 years, son of Late Subedar Singh, presently working as Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow; the deponent do hereby solemnly affirms and state on oath as under:-

1. That the deponent is impleaded in the aforesaid Writ Petition as Opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed hereinafter.

2. That this writ petition was last listed on 25.08.2008 whereby this Hon'ble Court was pleased to pass the following order:-

"We, therefore, direct that the proposal given by the State Government and the Nagar Nigam be forwaded to NEERI and also the necessary details of the land, which has been selected or is likely to be selected for dumping of municipal solid waste, be also forwarded to NEERI so that they may give their expert opinion on the aforesaid issue, keeping in mind necessary regulations and provisions of law and of course maximum safety to the ground water as well as to the river water before putting the proposal into execution."

3. That in compliance of the aforesaid direction made by this Hon'ble Court on 25.08.2008 the present affidavit is being filed mentioning therein the steps taken at the end of Nagar Nigam, Lucknow in compliance of the same.

4. That in compliance of the said order the Nagar Nigam, Lucknow has issued a letter No. 7286/AMC/08 dated 28.09.2008 addressed to Additional District Magistrate (Land Acquisition), Lucknow thereby giving reference of letter issued by Special Secretary, Government of U.P., Nagar Vikas Anubhag-5, which was numbered as letter No. 49 writ/Nau-5-2008-4 writ/2007 and further informing about the said order dated 25.08.2008 passed by this Hon'ble Court thereby directing with regard to selection of land for dumping of municipal solid waste and subsequently the same be forwarded to NEERI so that they may give their expert opinion on the aforesaid issue in light of M.S.W Rules 2000 appendix (1).

It was further informed that for disposal of municipal solid waste, land on the Deva Road and Hardoi Road has been selected by the Lucknow Development Authority, and for acquiring the same a proposal has been sent. Perhaps on the said matter the farmers have raised certain dispute because of which location of land has been changed and for acquiring the said land a join team comprising of District Administration and Lucknow Development Authority, was to be carried out in compliance of which for selection of the said land on Deva Road an inspection has been carried out by the District Administration, Lucknow Development Authority, Jal Nigam and Nagar, Nigam. In light of above it was requested from the A.D.M. (Land Acquisition) to inform about the actual position of the land selected for disposal of municipal solid waste so that the said proposal for inspection of the land in question can be forwarded to NEERI. A copy of the said letter was also

COMMISSIONER FOR OATHS ... ALLAHABAD

forwarded to Special Secretary Nagar Vikas and Vice Chairman Lucknow Development Authority, Lucknow. A photocopy of said letter dated 28.09.2008 is annexed herewith as **Annexure No. 1** to this affidavit.

5. That subsequently in compliance of order dated 25.08.2008 the Nagar Nigam addressed a letter No. 7287/A.M.C./2008 dated 29.09.2008 to the Special Secretary, Government of U.P., Nagar Vikas Anubhag-5, giving reference of its letter dated 28.09.2008, secondly that the Jal Nigam has to submit its report with regard to action taken under the Sewage Treatment Plant and further with regard to disposal of garbage dumped near Gandhi Setu, in light of NEERI'S report dated 17.08.2008 (option-2) by Nagar Nigam, Lucknow with regard to which a proposal for inspection has been sent to Director NEERI vide its letter No. 31/C/Na.Aa./08 dated 19.09.2008 and it was further mention that as soon as the report is received at the end of NEERI the same shall be made available to the government.

6. That the Nagar Nigam, Lucknow further issued a letter No. D-526/A.M.C.-A/08 dated 14.10.2008 addressed to Pariyojana Prabandhak, C & D.C. U.P. Jal Nigam, Lucknow with regard to Land Fill Sites in light of Urban Solid Waste Management Rules-2000 under the JNNURN Scheme. A photocopy of said letter dated 14.10.2008 is annexed herewith as **Annexure No. 2** to this affidavit.

7. That thereafter, the Nagar Nigam Lucknow received a letter No. SWMU/HQ/2008 dated October 14, 2008 from the end of NEERI with regard to MSW dumping on the Gomti River Bank, Near Gandhi Setu, Lucknow in response to its letter dated September 19, 2008 and thus after the preliminary examination of the documents annexed by Nagar Nigam, Lucknow the following comments have been offered by NEERI;



1396 347

- Retaining wall has been suggested in both the options delineated in NEERI's report to protect ground water contamination and river water contamination. This is duly considered in the proposal. However design and construction of the retaining wall must be examined in the context of hydro-geological data, ground water gradient, and topography of the area. This information is not included explicitly in the proposal. However, these designs should be vetted by competent agencies like State Public Works Department, State Irrigation Department, or Jal Nigam, which are actively involved in such activities.

- The Closure of the dumping site should necessarily follow MSW 2000 rules as referred in the proposal and the comments offered by UPPCB in this regard should also be considered.

- As regards the site selection for the Sanitary Landfill site, is suggested that the concerned authorities should identify few sites, considering all necessary statutory requirements. NEERI will assist in finalizing the site selection on the basis of environmental impacts. The budget requirements for NEERI for conducting such studies could be finalized at a latter date.

8. That for implementation of the said project, the land has to be acquired by the said authorities who are taking all relevant steps for acquiring the said land.

9. That it is further pertinent to mention over here that the Nagar Nigam, Lucknow has filed its compliance affidavit in light of each and every order issued by this Hon'ble Court in the above said petition from time to time.

10. That from the narration made herein above it is established that the Nagar Nigam, Lucknow has taken all relevant steps in compliance of order dated 25.08.2008 passed by this Hon'ble

1397 348

Court and the deponent further undertakes that he will carry out every direction issued to him by this Hon'ble Court from time to time.

Lucknow

Dated : 16.10.2008

DEPONENT

Verification

I, the deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 10 of this affidavit are true to my personal knowledge. No part of its is false and nothing material has been concealed.

So help me God.

Lucknow

Dated : 16.10.2008

DEPONENT

I identify the deponent who has signed before me.

(Namit Sharma)
Advocate

Solemnly affirm before me on 16-10-2008 at about 8-30 a.m. /p.m. by, the deponent who is identified by Sri Namit Sharma, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of the affidavit which have been read over and explained to him by me.

OATH COMMISSIONER FOR OATHS HIGH COURT ALLAHABAD 16/10/08

Oath Commissioner

Shailendra Kumar
Advocate Oath Commissioner
Hon'ble High Court, Allahabad
Comm No. 38564
16/10/08

IN THE HON'BLE HIGH COURT JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH LUCKNOW
W.P. No. 4436 (MB) of 2008

.....Petitioners

VERSUS

....Opposite Parties

Annexure No. 1

1307 (6) 349

1398

नगर निगम लखनऊ

प्रेषक,	सेवा में,
अपर नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ	अपर जिला अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) लखनऊ
पत्र संख्या --7286/AM-C/08 दिनांक --29/9/2008	नत्थी ----------

विषयः- रिट याचिका संख्या-4436(एम0 बी0)/02 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं0 6748 (एम0 बी0)/2008 बनवारी लाल बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य मे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 25-08-08 को पारित आदेशों के अनुपालन में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-5 के पत्र सं0-49 रिट/नौ-5-2008-4 रिट/2007(छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ में उक्त वाद में आगामी सुनवाई 16 अक्टूबर /2008 को नियत है मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25-08-2008 को पारित आदेश के क्रम में म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट के डिस्पोजल के सम्बन्ध में एम0 एस0 डब्लू0 रुल्स 2000 की अनुसूची-।।।के अनुसार भूमि का चयन करते हुऐ नीरी की विशेष परामर्श प्राप्त करते हुए, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

आप अवगत है कि म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट के निस्तारण हेतु देवा रोड एवं हरदोई रोड पर भूमियों का चयन करते हुऐ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भू-अर्जन प्रस्ताव आपको प्रस्तुत किया गया था । सम्भवतःउक्त विषयों पर किसानों द्वारा विवाद उत्पन्न कर दिये जाने के कारण स्थल परिवर्तित कर भूमियों के अधिग्रहण की कार्यवाही जिला प्रशासन एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रुप से की जानी थी इस सम्बन्ध में देवा रोड पर स्थल चयन हेतु जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण, जल निगम एवं नगर निगम द्वारा निरीक्षण भी किया जा चुका है ।

अतः उपरोक्त के क्रम में म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट डिस्पोजल हेतु चयनित भूमियों की स्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें जिससे उक्त भूमि के निरीक्षण हेतु नीरी को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सके ।

भवदीय

(ए0सी0 सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

प्रतिलिपि :-1-विशेष सचिव नगर विकास अनुभाग-5 उ0 प्र0 लखनऊ में उनके पत्र सं0-49 रिट/नौ-5-2008-4-रिट/2007दि0 17 सितम्बर 2008 के क्रम मे सूचनार्थ।

2-उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ के चयनित स्थलों के परीक्षण हेतु प्रस्ताव नीरी को प्रेषित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से आदेशित करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(ए0सी0 सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

IN THE HON'BLE HIGH COURT JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH LUCKNOW
W.P. No. 4436 of 2008 (M/B)

1308 (7) 350
1399

.....Petitioners

VERSUS

....Opposite Parties

Annexure No. 2

नगर निगम लखनऊ

प्रेषक, अपर नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ पत्र संख्या 72887/A.m.c/08 दिनांक 29/09/2008	सेवा में, विशेष सचिव,30 प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग-5 नत्थी ----------

विषयः- रिट याचिका संख्या-4436(एम0 बी0)/02 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम 30 प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं0 6748 (एम0 बी0)/2008 बनवारी लाल बनाम 30 प्र0 राज्य व अन्य' मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 25-8-2008 को पारित आदेशो के अनुपालन सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र सं0-49 रिट/नौ-5-2008-4 रिट/2007 दिनॉक 17सितम्बर 2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 25-08-08 के अनुपालन मे उल्लखित बिन्दुओं पर नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही स्थिति निम्नानुसार हैः-

बिन्दु सं0-1 म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट के निस्तारण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में देवा रोड एवं हरदोई रोड पर भूमि का चयन कर सूचना मा0 उच्च न्यायालय को दी गई थी, सम्भवत् चयनित भूमि के प्रस्ताव पर किसानों द्वारा विवाद के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण ,जिला प्रशासन द्वारा स्थलों का बदलाव कर नये सिरे से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है जिसके क्रम में स्थलों के निरीक्षण हेतु जिला प्रशासन के निर्देश पर संयुक्त निरीक्षण में नगर निगम के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे।निरीक्षण उपरान्त अभी स्थल चयन कर लखनऊ विकास प्राधिकरण/जिला प्रशासन द्वारा सूचना नगर निगम को नही दी गई है,क्योकि स्थल का चयन म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट रुल्स 2000 की अनुसूची ।।। के अनुसार किया जाना है तथा उनका परीक्षण नीरी द्वारा कराये जाने के उपरान्त ही भूमि अर्जन किया जाना उचित होगा ।इस सम्बन्ध में शासन स्तर से भी लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस आशय से निर्देश देने का कष्ट करें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण स्थलों चयन के सम्बन्ध में म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट डिस्पोजल रुल्स 2000 के अनुसूची के अनुसार स्थल चयन का प्रस्ताव नीरी को प्रेषित कर उस पर उनकी विशेषज्ञ राय की प्राप्ति के उपरान्त कार्यवाही की जाय इस सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा जिला प्रशासन एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण को पत्र सं0 72886/A.m.c दिनॉक 28-9-2008 द्वारा अनुरोध किया चुका है जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

बिन्दु सं-2 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में कार्यवाही कार्यदायी संस्था जल निगम के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है ।

बिन्दु सं-3 गॉधी सेतु के पास गोमती नदी के तटपर रखे गये कूडा कचरा के निस्तारण हेतु नीरी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 17-08-08 में उल्लखित विकल्प संख्या-2 पर कार्यवाही कराते हुऐ नगर निगम द्वारा कार्य योजना तैयार की गई जिसका परीक्षण किये जाने हेतु कार्यालय पत्र सं0 31/सी0/न0आ0/08 दिनांक 19-09-08 द्वारा निर्देशक नीरी को प्रेषित किया जा चुका है जिसकी रिपोर्ट नीरी से प्राप्त होने पर शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।

भवदीय

(एस0पी0 सिन्हा)

IN THE HON'BLE HIGH COURT JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH LUCKNOW
W.P. No. 4436 of 2003 (M/B)

.....Petitioners

VERSUS

.....Opposite Parties

Annexure No. 3

1309 (8) 351 1400

मा. उच्च न्यायालय प्रकरण/अति आवश्यक

नगर निगम लखनऊ

प्रेषक, अपर नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ। संख्याः- D-526/AMG/08 दिनांकः- 14-10-2008	सेवा में, परियोजना प्रबन्धक सी.एण्ड.डी.एस. उत्तर प्रदेश, जल निगम लखनऊ। नत्थी

—: विषय :—

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2000 के अनुसार प्रस्तावित लैण्ड फिल साईटों के संबंध मे।

महोदय,

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अंतर्गत लखनऊ नगर की स्वीकृत रु. 42.92 करोड की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2000, के प्राविधानो के अनुसार सेनेटरी लैण्ड फिल साईट का विकास किये जाने हेतु हरदोई रोड एवं देवा रोड पर भूमि चिन्हीकरण/अधिग्रहण की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।

शासन स्तर पर इस संबंध में आयोजित बैठक मे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तीव्र गति से कराये जाने हेतु विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है एवं इस संदर्भ में चिन्हित भूमि का एनवॉयरमेंटल असेसमेन्ट कराये जाने के भी निर्देश दिये गये है।

मा. उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 4436(एम./बी.)/2003 में दिनांक 25.08.2008 को पारित अंतरिम आदेश के क्रम में नगर निगम द्वारा उक्त चिन्हित भूमियों के विवरण नीरी, नागपुर को प्रेषित किये गये थे जिनका प्रारम्भिक परीक्षण किये जाने के पश्चात् नीरी ने अपने पत्र संख्या एसडब्ल्यूएमयू/एचक्यू/2008 दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 द्वारा विशेषज्ञ आख्या प्रेषित की है, जो पत्र के साथ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

तद्क्रम में कृपया हरदोई रोड एवं देवा रोड पर चयनित किये गये लैण्ड फिल साईटों के एनवॉयरमेंटल असेसमेंट तत्काल कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि भूमियों की उपयुक्तता के अनुसार नीरी की अंतिम संस्तुति प्राप्त की जा सके।

भवदीय

(ए.सी. सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

प्रतिलिपिः—

1. श्री एच.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ।
2. श्री एस.पी. मिश्र, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग, लखनऊ।
3. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
4. मुख्य पर्यावरण अभियंता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(ए.सी. सिन्हा)
अपर नगर आयुक्त

1401 ~~1310~~ (9) ~~35~~

IN THE HON'BLE HIGH COURT JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH LUCKNOW
W.P. No. 4436 of 2005 (M/B)

.....Petitioners

VERSUS

....Opposite Parties

Annexure No. 4

National Environmental Engineering Research Institute
Nehru Marg, Nagpur 440 020

Dr. A.N. Vaidya
Assistant Director
Solid Waste Management Unit

Tele { phone : 0712-2249752 (direct)
{ : 0712-2249885 (6 lines) Extn. 287
{ fax : 0712-2249752
{ gram : NEERI, Nagpur-20
{ email : an_vaidya@neeri.res.in

SWMU/HQ/2008
October 14, 2008

Fax No. 0522-2622440

To,

Municipal Commissioner,
Lucknow Nagar Nigam,
Lucknow

Subject: MSW dumping on the Gomati river bank near Gandhi Setu, Lucknow

Sir,

This has reference to your letter No.31 /नि/अ.अ/08 dated September 19, 2008 and which was received in this office on September 30, 2008. The said letter is accompanied by the following documents.

1. Proposal for park and retaining wall(Bandha) at site of M.S.W. dumping on the Gomati river bed near Gandhi setu, Lucknow
2. Statement of Directives from Hon'ble High Court for Writ Petition No. 4436(MB) of 2005
3. Comments on the above proposal by Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB)

After the preliminary examination of these documents following comments are offered.

- Retaining wall has been suggested in both the options delineated in NEERI's report to protect ground water contamination and river water contamination. This is duly considered in the proposal. However design and construction of the retaining wall must be examined in the context of hydro-geological data, ground water gradient, and topography of the area. This information is not included explicitly in the proposal. However, these designs should be vetted by competent agencies like State Public Works Department, State Irrigation Department, or Jal Nigam, which are actively involved in such activities.

(1) of (2)

16/10/08

1402 ~~1311~~ (10) ~~355~~

- The Closure of the dumping site should necessarily follow MSW 2000 rules as referred in the proposal and the comments offered by UPPCB in this regard should also be considered.

- As regards the site selection for the Sanitary Landfill site, it is suggested that the concerned authorities should identify few sites, considering all necessary statutory requirements. NEERI will assist in finalizing the site selection on the basis of environmental impacts. The budget requirements for NEERI for conducting such studies could be finalized at a later date.

With regards,

Yours faithfully,

AN Vaidya 14/10/08

(A.N.Vaidya)

(2) of (2)

1403 ~~1310~~ 354

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

IN RE:
Writ Petition No. 4436 (M/B) of 2003

Sewage Treatment Plant ----------Petitioner

Versus

State of U.P. and others ----------Opposite Parties

AFFIDAVIT ON BEHALF OF JAL SANSTHAN, LUCKNOW IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 25.08.2008 PASSED BY THIS HON'BLE COURT

I, D.K. Sharma, aged about 55 years, son of Late D.L. Sharma, presently working as General Manager, Lucknow Jal Sansthan, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirms and state on oath as under:-

1. That the deponent is impleaded in the aforesaid Writ Petition as Opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed hereinafter.

2. That this writ petition was last listed on 25.08.2008 whereby this Hon'ble Court was pleased to pass the following order, relevant portion of the same is being reproduced herein as under:-

"By the next date was listing orders dated 20th August, 2007, 27th March 2008 and 21st July 2008 passed by this Court be complied with and progress report of the work done be submitted. Sri D.K. Upadhyaya says that he will submit necessary report as per the aforesaid orders by the next date".

"We, therefore, direct that the proposal given by the State Government and the Lucknow Jal Sansthan be forwaded to NEERI and also the necessary details of the land, which has been selected or is likely to be selected for dumping of municipal solid waste, be also forwarded to NEERI so that they may give their expert opinion on the aforesaid issue, keeping in mind necessary

1404 355

regulations and provisions of law and of course maximum safety to the ground water as well as to the river water before putting the proposal into execution."

3. That in compliance of the aforesaid direction made by this Hon'ble Court on 25.08.2008 the present affidavit is being filed mentioning therein the steps taken at the end of Lucknow Jal Sansthan, Lucknow in compliance of the same, thereby mentioning the details of work undertaken by the authorities under the JNNURM and others.

4. That it is submitted that so for as the installation of 61, Tubewells are concerned which are to be completed under the JNNURM Scheme, in which work of installation of 40 Tubewells is also included, out of the same work of 28 Tubewells has been commissioned and work of remaining 12 Tubewells are in progress where water supply system is available and the work would be completed expeditiously. The chart has been prepared in this regard by U.P. Jal Nigam . A photocopy of the said chart is being filed herewith as **Annexure No. 1** to this affidavit.

5. That so far as installation of 21 Tubewells is concerned, the work has been completed on 3 Tubewells. There is no water supply system available, so after completing the work of the installation of Tubewells it will take some time and would be commissioned after laying of distribution system. The work of 14 Tubewells are under progress. A photocopy of the chart in respect of installation of 21 Tubewells is being annexed as **Annexure No. 2** to this affidavit.

6. That it is submitted that so far as reboring of 43 Tubewells is concerned the work has been completed on 25 Tubewells whereas the work is in progress on 18 Tubewells. A photocopy of the progress chart in respect of re-boring of 43 Tubewells is being annexed herewith as **Annexure No. 3** to this affidavit.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD 4/11/08

1405 1344 356

7. That it is further submitted that from the target of installation of 409 new handpums and re-boring/special reboring of 670 handpums was vested under the URBAN DISTRICT PLAN out of the said 409 new handpumps and reboring/special re-boring of 670 handpumps has already been completed. A photocopy of progress chart in detail is being annexed herewith as **Annexure No. 4** to this affidavit.

8. That it is further relevant to submit over here that under URBAN WATER SUPPLY (NORMAL) PROGRAMME out of five proposed Tubewells three Tubewells has been completed and work on one Tubewell is in progress and further out of 39 reboring of Tubewell all 39 has been commissioned. A photocopy of progress report in this regard is already being annexed herewith as **Annexure No. 5** to this affidavit.

9. That with regard to work of finalization of tender for establishment of the third water works has been completed and the date of start has been given to the concerned Firm. The work of excavation of foundation of Central CWR, Boundary Wall, and Zonal underground water storage tanks are still in progress.

10. That the Sewerage Scheme of District-I covers approximately 337 Km of swer laying, construction of one Sewerage pumping station of 56 mld capacity and one No. STP of 14 Mld at Daulatganj, Lucknow and other relevant works. Further it is pertinent to mention over here that 50.00 Km. of sewer line has been laid down and the work of construction of Sewage Pumping Station and STP has been started after completion of the tendering process.

11. That it is further pertinent to mention over here that the Lucknow Jal Sansthan, Lucknow has filed its compliance affidavit in light of each and every order passed by this Hon'ble Court in the above said petition from time to time.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD 16/1/08

1406 ~~1315~~ 357

12. That from the narration made herein above it is established that the Lucknow Jal Sansthan, Lucknow has taken all relevant steps in compliance of order dated 25.08.2008 passed by this Hon'ble Court and the deponent further undertakes that he will carry out every direction issued to him by this Hon'ble Court from time to time.

Lucknow

Dated : 16.10.2008 **DEPONENT**

Verification

I, the deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 12 of this affidavit are true to my personal knowledge. No part of its is false and nothing material has been concealed.

So help me God.

Lucknow

Dated : 16.10.2008 **DEPONENT**

I identify the deponent who has signed before me.

(Namit Sharma)
Advocate

Solemnly affirm before me on 16-10- 2008 at about 9-00 a.m. /p.m. by, the deponent who is identified by Sri Namit Sharma, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of the affidavit which have been read over and explained to him by me.

HIGH COURT ALLAHABAD 16/10/08

Oath Commissioner
Shailendra Kumar
Advocate Oath Commissioner
Hon'ble High Court, Allahabad
Date 16-10-08 Coopy No 385160

1407
1316
(5)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

358

W. P. No. 4436 (M/B) of 2003

Versus

Annexure No. 1

I

लखनऊ जल संस्थान

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत 40 नये नलकूपों की दिनांक 03–10–2008 तक की प्रगति

28 नग नलकूप चालू

क्र0 सं0	जोन का नाम	क्षेत्र का नाम	क्षमता ली0प्र0मि0	टिप्पणी
1	जोन–1	गुलिस्तां कालोनी	1000	कार्यपूर्ण
2	जोन–1	शिवपुरी पार्क, गणेशगंज	1000	कार्यपूर्ण
3	जोन–1	सोसाइटी पार्क, नरही	–	कार्यपूर्ण
4	जोन–2	हुसैनाबाद, शिवपुरी	–	कार्य प्रगति पर
5	जोन–2	अहमदगंज, पजावा	–	कार्य प्रगति पर
6	जोन–3	अलीगंज सेक्टर–एच	1500	कार्यपूर्ण
7	जोन–3	अलीगंज सेक्टर–सी/डी	1000	कार्यपूर्ण
8	जोन–3	अहिबरनपुर	1000	कार्यपूर्ण
9	जोन–3	त्रिवेणीनगर	1000	कार्यपूर्ण
10	जोन–3	सहयोग पार्क महानगर	1000	कार्यपूर्ण
11	जोन–3	जानकीपुरम सेक्टर–एच	1000	कार्यपूर्ण
12	जोन–3	तातारपुर सेक्टर–ई	1000	कार्यपूर्ण
13	जोन–3	मेंहदीटोला कृष्णपुरी कालोनी	1000	कार्यपूर्ण
14	जोन–3	मेवा नर्सरी	1000	कार्यपूर्ण
15	जोन–3	पंचवटी कालोनी रहीमनगर	1000	कार्यपूर्ण
16	जोन–4	कानपुर रोड़ योजना से0–जे, रेलनगर	–	कार्यपूर्ण
17	जोन–4	हिन्द नगर नलकूप	1000	कार्यपूर्ण
18	जोन–4	दामोदर नगर, आलमनगर	1000	कार्यपूर्ण
19	जोन–4	सेक्टर–आई, एल0डी0ए0 कालोनी, आलमबाग	1000	कार्यपूर्ण
20	जोन–4	बड़बरहा, आनन्द नगर	–	कार्य प्रगति पर
21	जोन–4	ब्रहमनगर,	–	कार्यपूर्ण
22	जोन–4	आनन्द बरहा	–	कार्य प्रगति पर
23	जोन–5	इन्दिरा नगर डी–ब्लाक	1000	कार्यपूर्ण
24	जोन–5	स्टार कालोनी, सेक्टर–9, इन्दिरा नगर	–	कार्य प्रगति पर
25	जोन–5	इन्दिरा नगर सेक्टर–14	–	कार्य प्रगति पर
26	जोन–5	इन्दिरा नगर बी–ब्लाक	1000	कार्य पूर्ण
27	जोन–6	अशोक नगर, राजाजीपुरम	1000	कार्यपूर्ण
28	जोन–6	मातादीन शेरवाली कोठी, सहादतगंज	–	कार्यपूर्ण
29	जोन–6	सरीपुरा, आलमबाग	–	कार्य प्रगति पर
30	जोन–6	वजीरबाग, बदरअली, तकियाशाह	–	कार्य प्रगति पर
31	जोन–6	जलालपुर	–	कार्य प्रगति पर
32	जोन–6	कश्मीरी मोहल्ला नलकूप	–	काय प्रगति पर
33	साउथसिटी	सेक्टर–सी0–1,	1000	कार्यपूर्ण
34	साउथसिटी	रशमीखण्ड	1000	कार्यपूर्ण
35	गोमती नगर	विजय खण्ड	1000	कार्यपूर्ण
36	गोमती नगर	विनीत खण्ड	1000	कार्यपूर्ण
37	गोमती नगर	विवेक खण्ड–4	–	कार्यपूर्ण
38	गोमती नगर	विनय खण्ड–1	–	कार्य प्रगति पर
39	गोमती नगर	विशाल खण्ड	–	कार्य प्रगति पर
40	विकास नगर	सेक्टर–9	1000	कार्यपूर्ण

9/6

सचिव

1408 1317 (6) 359

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

W. P. No. 4436 (M/B) of 2003

Versus

Annexure No. 2

Annexure- 2

दिनांक 13.10.2008 तक की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ शहर के विभिन्न पेयजल योजनाओं के विरूद्ध प्रस्तावित 21 नलकूप का विवरण

लक्ष्य - 21नग नये नलकूप

उपलब्धि - 3 नग नलकूप

	नलकूपों का नाम स्राव लीटर प्रति मिनट	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति मे)		जलापूर्ति प्रारम्भ करने की तिथि	जल वृद्धि एम.एल.डी. में	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			संम्भावित	वास्तविक				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	लियटी कालोनी कुर्मान्चल नगर पेय जल योजना -: 2 नग , जोन-3							
	1.कुर्मान्चल नगर(मानसरोवर)नलकूप-1 1000 ली.प्र.मि.	10.2.08		8.5.08	18.5.08	1.00		
	2.कुर्मान्चल नगर(लियटी कालोनी) नलकूप-2	17.3.08		22.6.08	17.7.08	1.00		
2	शिवनगर पेयजल योजना :- 4 नलकूप जोन-3							
	3. नलकूप सं.-1 1000 ली.प्र.मि.	10.11.07		8.5.08	28.5.08	1.00		
	4. नलकूप संख्या -2(कुम्हार टोला)	30.5.08		10.8.08			पम्प सेट चालू	राईजिंग मेन जोड़ा जाना है।
	5.							
	6.							
3	भारतनगर पेय जल योजना :- 3 नलकूप , जोन-3							
	7. राजलोक कालोनी	15.3.08		20.5.08			पम्प सेट चालू	तदैव
	8. महाराजा अग्रसेन पार्क	30.4.08		21.6.08			तदैव	तदैव
	भगत सिंह पार्क	28.4.08		21.6.08			तदैव	तदैव
4	गढीकनौरा पुनगर्ठन पेयजल योजना :- 6 नलकूप , जोन-2							
	10. पी.सी.सी. , मिल के पास,	30.4.08	30.11.8				ओ.पी.यूनिट में प्रगति पर	
	11. नलकूप संख्या-2, तालकटोरा	21.5.08	30.11.8				लोअरिंग पूर्ण	
	12. कौशल नगर निगम स्टोर	3.8.08	30.11.8				तदैव	
	13. रेलवे लाइन के पास	1.9.08	30.11.8				तदैव	
	14.							
	15.							
5	खरिका वार्ड पेयजल योजना :- 6 नलकूप , जोन-4							
	16. नलकूप संख्या-1(लौगा खेडा)	3.5.08	30.11.8				लो.अरिंग पूर्ण	
	17. नलकूप संख्या-2(झंडे वाला पार्क)	13.5.08	30.11.8				तदैव	
	18. नलकूप संख्या 3(बलदेव विहार पार्क)	17.5.08	30.11.8				तदैव	
	19. नलकूप संख्या-3(गोप स्कूल के पीछे)	30.5.08	30.11.8				तदैव	
	20. चन्द विहार कालोनी पार्क	18.6.08	30.11.8				तदैव	
	21. डिफेन्स कालोनी	18.6.08	30.11.8				तदैव	

सार-:

1. कुल प्रस्तावित नलकूपों की संख्या - 21 नग
2. चालू नलकूपों की संख्या - 3 नग , जलावृद्धि - 3.00एम.एल.डी.
3. निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या - 14 नग
4. नलकूपों की संख्या जिनके पम्प सेट चालू है राइजिंग मेन जोड़ा जाना है। - 4 नग. संम्भावित जलावृद्धि - 4 एम.एल.डी.

परियोजना प्रबन्धक

16/10

1409 ~~1318~~ (7) 360

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

W. P. No. 4436 (M/B) of 2003

Versus

Annexure No. 3

Annexure - 3

दिनांक 13.10.2008 तक की प्रगति

स. जे.एन.एन.यू.आर.एम के अन्तर्गत 43 नग री-बोर नलकूपों का निर्माण कार्य-:
लक्ष्य- 43 री-बोर नलकूपों को चालू करने की सम्भावित तिथि 31.12.08
उपलब्धि - 25 नग

क्र स.	नलकूपों के नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (राइजिंग मेन पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जल वृद्धि एग.एल.डी. में	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			वास्तविक	सम्भावित			
1	2	3	4	5	6	7	
1	[illegible]यमंड डेरी, जोन-1	1.3.08	29.4.08		1.00	जलापूर्ति प्रारम्भ	
2	[illegible]गर सेक्टर-डी, जोन-3	6.4.08	1.5.08		1.00	तदैव	
3	[illegible]तामातादीन, जोन-1	20.3.08	13.5.08		0.60	तदैव	
4	[illegible]वाहर भवन, जोन-1	17.4.08	30.5.08		1.00	तदैव	
5	कमला कपूर पार्क निराला [illegible] जोन-3	10.5.08	3.6.08		1.00	तदैव	
6	जानकी पुरम, ए-ब्लाक, जोन-3	28.5.08	23.6.08		1.00	तदैव	
7	[illegible]र अमल कालोनी नलकूप जोन 3	20.5.08	28.7.08		1.00	तदैव	
8	[illegible]रसमाज मंदिर गणेश गंज जोन-1	25.5.08	12.8.08		1.00	तदैव	
9	[illegible]कार पुरम गोमतीनगर जोन-5	5.5.08	13.8.08		1.00	तदैव	
10	कपूरथला, नलकूप जोन-3	28.6.08	24.8.08		1.00	तदैव	
11	[illegible]नयाग ,जोन-1	30.6.08	26.8.08		1.00	तदैव	
12	[illegible]नपुर रोड योजना सं.-जे जोन-4	10.4.08	23.6.08		1.00	तदैव	
13	[illegible]ली नगर , जोन-3	1.6.08	30.8.08		1.00	तदैव	
14	[illegible]यमंड डेरी, जोन-1	1.6.08	31.8.08		1.00	तदैव	
15	[illegible]यगंज, जोन-3	24.5.08	31.8.08		1.00	तदैव	
16	[illegible]नगर खुर्द, जोन-1	22.7.08	30.8.08		1.00	तदैव	
17	[illegible]लेश्वर मंदिर, जोन-3	6.6.08	4.9.08		1.00	तदैव	
18	[illegible]योगंज सं.-6 जोन-3	6.6.08	10.9.08		1.00	तदैव	
19	[illegible]धीनगर जोन-1	17.6.08	15.9.08		1.00	तदैव	
20	[illegible]नन्द नगर, जोन-4	28.5.08	15.9.08		1.00	तदैव	
21	[illegible]क्टर एच एल डी कालोनी कानपुर रोड	1.8.08	18.9.08		1.00	तदैव	
22	[illegible]नगर विकार, जोन-4	28.5.08	3.10.08		1.00	तदैव	
23	[illegible]रियन्टी पार्क, जोन-3	21.6.08	30.9.08		1.00	तदैव	
24	विजय खण्ड,जोन-5	3.7.08	5.10.8		1.00	तदैव	
25	[illegible]लीगंज सं.-7 जोन-3	10.6.08	10.10.8		1.00	तदैव	
26	[illegible]न्द स्वीकर, जोन-1	15.6.08		30.10.08		तदैव	
27	शिया कालोनी, जोन-3	6.6.08		30.10.08		ओ.पी.यूनिट से विकास पूर्ण	
28	सं.-11 राजाजीपुरम जोन-6	28.6.08		30.10.08		तदैव	
29	[illegible]लीगंज नलकूप, जोन-3	24.7.08		30.10.08		पूर्ण	
30	[illegible]रगा नगर, जोन-4	20.7.08		30.10.08		ओ.पी. से विकास पूर्ण	
31	[illegible]न्दर नगर, जोन-4	20.8.08		30.10.08		तदैव	
32	इंदिरानगर स.-54 जोन-5	3.5.08		30.10.08		कम्प्रेसर से विकास पूर्ण	
33	आजाद नगर, जोन-4	26.7.08		30.10.08		तदैव	
34	इंदिरा नगर संख्या 53	10.8.08		30.10.08		तदैव	

9/10

~~1319~~ (8) 361

1410

3

स.	नलकूपों का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (राइजिंग मेन पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जल वृद्धि एम.एल.डी. में	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			वास्तविक	सम्भावित			
1	2	3	4	5	6	7	
35	खुर्शीद बाग ,जोन-6	28.6.08		30.10.08		कम्प्रेसर से विकास प्रगति पर	
36	[illegible] नालकटोरा रोड, राजाजीपुरम जोन-6	23.6.08		30.10.08		लोअरिंग पूर्ण	
37	[illegible] रोड, जोन-6	11.6.08		30.10.08		तदैव	
38	[illegible]-4 राजाजीपुरम जोन-	25.7.08		30.10.08		तदैव	
39	भरतनगम, जोन-6	26.7.08		30.10.08		तदैव	
40	पश्चिमा हरियटल नलकूप, न-3	20.8.08		30.10.08		तदैव	
41	इंदिरानगर संख्या-14, जोन-5	30.8.08		30.10.08		तदैव	
42	विकास खण्ड-3 गोमती नगर 3, जोन-5	30.8.08		30.10.08		तदैव	
43	[illegible] खेड़ा, [illegible]-4	5.10.08		30.10.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	

सार

1. कुल प्रस्तावित मी-यौर नलकूपों की संख्या - 43 नग
2. चालू नलकूपों की संख्या - 25 नग , जलावृत्ति - 25.00एम.एल.डी.
3. निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या - 18 नग

परियोजना प्रबन्धक

COMMISSIONER FOR OATHS

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.
W. P. No. 4436 (M/B) of 2003
Versus
Annexure No. 4

पेयजल योजना

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 25.08.08 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

सामान्य कार्यक्रम

(रू0 लाख में)

क्रमांक	कार्य का विवरण	प्रस्तावित कार्य की मात्रा	दिनांक 25.08.08 तक कुल प्रगति		दिनांक 15.10.08 तक कुल प्रगति		दिनांक 26.08.08 से 15.10.08 तक कुल प्रगति	
1.	नये हैण्डपम्प	409 नग	409 नग	286.80	409 नग	286.80	-	-
2.	विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प	670 नग	670 नग		670 नग		-	-
3.	नये नलकूप	5 नग	3 नग चालू तथा 1 नग प्रगति पर।	125.00	3 नग चालू तथा 1 नग प्रगति पर।	140.00	-	-
4.	रिबोर नलकूप	39 नग	39 नग चालू	690.00	39 नग चालू	690.00	-	-
	योग			1101.80		1116.80	-	-

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)

महाप्रबन्धक(पेयजल)

पेयजल योजना

(रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दि. 20.08.07 तक प्रगति	20.08.07 से 27.03.08 की प्रगति	दि. 27.03.08 से दि. 21.07.08 तक प्रगति	दि. 21.07.08 से दि. 15.10.08 तक प्रगति	दि. 15.10.08 तक कुल प्रगति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम							
1.	नये नलकूप(समस्याग्रस्त क्षेत्रों मे)	40 नग	-	9 नग प्रगति में	22 नग चालू, 18 नग प्रगति पर।	6 नग चालू।	28 नग चालू, 12 नग प्रगति पर।	सूची संलग्न
	नये नलकूप(विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत)	21 नग	-	4 नग प्रगति में	3 नग चालू, 12 नग प्रगति पर।	2 नग पर कार्य प्रारम्भ तथा प्रगति पर।	3 नग चालू, 14 नग प्रगति पर।	सूची संलग्न
2.	रिबोर नलकूप	43 नग	-	2 नग प्रगति में	7 नग चालू, 22 नग प्रगति पर।	18 नग चालू, नये 12 नगों पर कार्य प्रारम्भ तथा प्रगति पर।	25 नग चालू, 18 नग प्रगति पर।	
3.	वितरण प्रणाली	133.31 कि.मी.	-	-	17.00 कि.मी.	19.00 कि.मी.	36.00 कि.मी.	
4.	राइजिंग मेन	14.40 कि.मी.	-	-	22 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू, 18 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर।	9 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू तथा 8 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रारम्भ।	31 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 16 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर।	
	सामान्य कार्यक्रम							
1.	नये हैण्डपम्प	409 नग	53 नग	69 नग	287 नग	-	409 नग	
2.	विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प	670 नग	153 नग	86 नग	431 नग	-	670 नग	
3.	नये नलकूप	5 नग	2 नग	1 नग प्रगति पर।	1 नग	1 नग पर कार्य प्रारम्भ	3 नग चालू तथा 1 नग प्रगति पर।	शेष 1 नग पर स्थल विवादित होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। सूची संलग्न
4.	रिबोर नलकूप	39 नग	17 नग	8 नग	14 नग	-	39 नग।	

परियोजना प्रबन्धक

महाप्रबन्धक(पेयजल)

1413 ~~1522~~ 364

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
SITTING AT LUCKNOW.

W/P No. 4436 (M/B)/2003

Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others .... Opposite Parties / Deponent

APPLICATION FOR AFFIDAVIT TO BE TAKEN ON RFECORD

For the facts, reasons and circumstances stated in the accompanying counter affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to take the affidavit on record in the interest of justice.

Any other suitable order or direction which this Hon'ble Court may deem fit just and proper in the circumstances of the case may also be passed in favour of the opp. Party.

Place : Lucknow

Date : 16.10.08

(I.P. Singh)
Advocate,
Counsel for Deponent

1414 365

IN THE HONBLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
SITTING AT LUCKNOW.

W/P No. 4436 (M/B)/2003

Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF HON'BLE COURT'S ORDER DATED 25-8-2008 ON BEHALF OF UP JAL NIGAM

I, V.U. Bishnoi, aged about 56 years, son of late Sri P.C. Bishnoi presently posted as General Manager, Gomti Pollution Control Unit, UP. Jal Nigam, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as General Manager, Gomti Pollution Control Unit, in U.P. Jal Nigam, Lucknow, and he has been authorized to swear and file this affidavit on behalf of UP Jal Nigam as such he is fully conversant with the facts and circumstances of the case and on the basis of record. The deponent submits as under.

That on 25-8-2008 an affidavit was filed by U.P. Jal Nigam in compliance of the Order of this Hon'ble court but this Hon'ble court was pleased to direct to submit compliance and

progress report of orders dated 20th August 2007, 27th March 2008 and 21st July 2008 passed by this Hon'ble court.

3. That it is submitted that That UP Jal Nigam is an implementing agency on behalf of local body i.e. Nagar Nigam Lucknow/ Jal Sansthan for execution, planning and design for drinking water supply and the sewage disposal. It is further submitted that Jal Nigam is preparing detail project report under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme under which funding pattern is 50% by Government of India, 20% by State Government and rest 30% by local bodies. It is further submitted that Master planning of water supply and sewerage works for the year 2040 has been done for Lucknow town and has been approved by the Govt. of India under JNNURM Programme.

4. That for Master Planning of Sewerage Works, Lucknow town is divided into 4 Sewerage Districts. Sewerage District-I estimate amounting to Rs. 236.234 Crore has been sanctioned by Govt. of India. Detailed Project Report for Sewerage District-III (Part-I amounting to Rs. 362.84 Crore and Part-II amounting to Rs. 286.40 Crore) has been prepared and sent to Govt. of India for approval through through Local Body wide letter no. tak cell/2147/38(I) 08 dated 25.08.2008 A Photocopy of this letter is annexed as **ANNEXURE –I** to this affidavit.

5. The Detailed Project Report of Sewerage District-II & IV are under preparation which will be soon submitted to Govt. of India. The details of work proposed in different Sewerage District is annexed as **ANNEXURE-II** .

6. That Government of India has issued fund released order for Rs.29.53 crore on 3-10-2007 in favour of Government of UP against detailed project report of sewage district-I (amounting

1416 ~~1525~~ 367

to Rs.236.23 crore). Matching grant 50%, 20% and 30% has been released by Central, State Government and Local body respectively. (A photo copy of the letter dated 3.10.2007 issued by Government of India, Ministry of Finance Department of Expenditure is being annexed as **ANNEXURE-III** to this affidavit).

7. That the scheme covers approximately 337 Km of sewer laying, construction of one sewage pumping station of 56 mld capacity and one No. STP of 14 mld at Daulatganj and other relevant works. It is submitted that 50.0 Km of sewer line has been laid and the work of construction of sewage pumping station and STP has been started after tendering process. It is also submitted that an expenditure of Rs. 37.587 Crore has been made against release of Rs. 43.037 Crore (Rs. 15.00 Crore on 19.03.2008 and Rs. 15.00 Crore on 22.04.2008 and Rs13.037 Crore on 06.10.2008). A chart showing Physical and Financial progress of works under JNNURM Programme is being annexed as **ANNEXURE-IV** to this affidavit.

8. That the construction work for Kukrail Nala Sewage pumping Station has been started after shifting the place of Pumping Station. Upto June 2008 30% work of Pumping station has been completed and due to heavy rainfall and flood in Gomti River, the further progress could not be achieved.

9. That so far cleaning of Gomti River is concerned, it is submitted that the land for construction of 345 mld STP has been acquired by Nagar Nigam, Lucknow on 16.7.2008 and after finalization of tendering process, the work for STP has been started on 19.7.2008. The required Progress of STP could not be achieved due to heavy rainfall and flood in Gomti River.

COMMISSIONER FOR OATHS
HIGH COURT, ALLAHABAD

1417 1326 368

10. That the necessary repairing works in 42 mld STP at Daulatganj has been done resulting improvement in quality of effluent in STP which is in accordance of norms of U.P. Pollution Control Board. Test report of influent and effluent sample dated 22.02.2008, 25.03.2008, 06.05.2008, 26.05.2008, 31.07.2008 & 29.08.2008 is being annexed as **ANNEXURE-V** to this affidavit.

11. It is further submitted that the work done under Gomti Action Plan Phase-I and Phase-II detailed up to date chart has been prepared and is annexed as **ANNEXURE-VI & ANNEXURE VII** to this affidavit.

12. That so far installation of 21 tube wells is concerned , the work has been completed for 3 tube wells. There is no water supply system available, so after completing the work of the installation of tube wells it will take some time and would be commissioned after laying of distribution system. The work of 14 tube wells are under progress. A photo copy of the chart in respect of installation of 21 tube wells is being annexed as **ANNEXURE NO.VIII** to this affidavit.

13. That it is submitted that so far re-boring of 43 tube wells is concerned; the work has been competed for 25 tube wells and the work is in progress for 18 tube wells. A photo copy of progress chart in respect of re-boring of 43 tube wells is being annexed as **ANNEXURE NO.IX** to this affidavit.

14. That it is submitted that target of installation of 409 new handpumps and re-boring / special repair of 670 handpumps was fixed under District Plan (urban). Out of which all the 409 new hand pumps and re-boring / special repair of 670 handpumps has been completed. A photo copy of progress chart in detail, including new installed hand pumps is being annexed as **ANNEXURE NO.X** to this affidavit.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

15. That it is further submitted that in addition to JNNURM UP Jal Nigam has worked under Urban Water Supply (normal) programme for which fund has been provided by State Government for the work of installation of tube wells, re-boring of tube wells and other works. Out of 5 proposed tube wells, the works for 3 tube wells have been completed and the work for 1 tube wells is in progress. Out of proposed 39 rebore tube wells all the 39 tube wells has been rebored. A photo copy of progress chart in this respect is being annexed as **ANNEXURE NO.X** to this affidavit.

16. That it is also submitted that establishment of 3rd Water works project is concerned, the work for finalization of tender process has been completed and the date of start has been given to the Firm. The technical drawing and design of few units has been submitted by the contractor and are under evaluation . The Work of excavation of foundation of Central CWR , Boundry Wall , and Zonal Underground water storage tanks are in progress. As per Approved estimate the work is to be completed by 2010, efforts will be made to complete the work before time.

17. That it is submitted that the progress of water supply schemes under different Programme as per Order of HON'BLE HIGH COURT on 20August 07,27 March 2008 &21July 2008 is annexed as **ANNEXURE No.XI** & XII.

18. Present status of Master Plan of Lucknow Water Supply is annexed as **ANNEXURE No.** XIII.

Place : Lucknow

Date : 16.10.2008

Deponent

(6)

1419 370

Verification

I, the deponent named above do hereby verify that the content of para 1 to 10 of this affidavit filed in support of the writ petition, are true to the best of my knowledge, while those of para ..... are believed to be true being based on legal advice. No part of it is false. Nothing material has concealed. So help me God.

Place : Lucknow

Date : 16.10.2008.

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me on 16-10-08 at 11.40 a.m./p.m. by Shri V.U. Bishnoi who is identified by Shri I.P. Singh, Advocate, High Court, Lucknow Bench,Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the facts of this affidavit which have been read over and explained to him by me.

OATH COMMISSIONER

Dinesh Kumar Misra, Advocate
Oath Commissioner High Court
Allahabad, Lucknow, Bench
Date 16-10-08 3807/18

(7) 1420 371

ANNEXURE-I

निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0,
8वॉ तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ

सेवा में,
श्री नितिन आर0 गोकर्ण
निदेशक,
शहरी विकास मन्त्रालय (निर्माण भवन),
भारत सरकार, नई दिल्ली।

संख्या- तक0 सेल/2143/38(1)/04 लखनऊ दिनांक 27/09/2008
विषय- JNNURM योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में।

महोदय,

JNNURM योजना के UIG कार्यान्श में निम्न योजनायें स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी को प्राप्त हुई हैं इन योजनाओं की स्वीकृति वित्त एवं कार्य समिति उ0प्र0 शासन से भी प्राप्त हो चुकी है।

क्र. सं0	योजना का नाम	योजना लागत(करोड़ में)
1	JNNURM योजना के अन्तर्गत लखनऊ शहर में सीवरेज कार्य (डिस्ट्रिक्ट-3, पार्ट-1)	362.34
2	JNNURM योजना के अन्तर्गत लखनऊ शहर में सीवरेज कार्य (डिस्ट्रिक्ट-III पार्ट-2)	286.40
3	वाराणसी के ट्रान्स गोमती क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था	253.82
4	JNNURM योजना के अन्तर्गत वाराणसी की पेयजल योजना (सिस वरूणा क्षेत्र)	90.70
5	इलाहाबाद पेयजल योजना भाग-2	211.43

उक्त डी0पी0आर0 की प्रति एवं अप्रेजल रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त योजनाओं का अप्रेजल CPHEEO से कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक।

प्रतिलिपिः-
1- विशेष सचिव नगर विकास अनुभाग-5 को सूचनार्थ प्रेषित।
2- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम 6 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त योजनाओं का प्रस्तुतीकरण कराने का कष्ट करें।
3- नगर आयुक्त लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद एवं कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक।

COMMISSIONER OF ORATHS
High Court, Allahabad

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर की सीवरेज योजना के मुख्य बिन्दु

दिनांक 16.10.2008 तक

क्र.सं	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट	आच्छादित क्षेत्र	परिकल्पित जनसंख्या			उत्पन्न होने वाला दूषित जल (मिलियन लीटर प्रतिदिन)			अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)		प्रति व्यक्ति लागत (सी.डी.पी. के अनुसार रु. में)		प्रति व्यक्ति लागत (डी.पी.आर. के अनुसार रु में)		प्रस्तावित मुख्य कार्य	एस.टी.पी. की प्रस्तावित क्षमता एवं स्थान	अद्यतन स्थिति
			2010	2025	2040	2010	2025	2040	सी.डी.पी. के अनुसार	डी.पी.आर के अनुसार	2010	2040	2010	2040			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-I (भारत सरकार दि. 17.8.2007 को स्वीकृत)	चौक, हरदोई रोड, कैम्पवेल रोड, दुबग्गा आदि क्षेत्र	287335	448634	565069	36	55	70	229.55	236.23	7988.93	4062.34	8221.35	4180.52	ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - 150 से 1800 मिमी साइज लगभग 337 कि.मी. सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग राइजिंग मेन - 50 मीटर एस0टी0पी0 (14 एम.एल.डी.) - 1 नग विविध कार्य - जाब	दौलतगंज में निर्मित 42 एम.एल.डी. एस.टी.पी. की क्षमता 14 एम.एल.डी. बढ़ाकर 56 एम.एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए) प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2040 के लिए 70 एम. एल.डी.।	निर्माणाधीन
2	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-II	अमौसी, सरोजनी नगर, कानपुर रोड तथा शारदा कैनाल के पार का क्षेत्र	225975	442125	884500	28	54	108	489.98	--	21682.93	5539.63			ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - लगभग 3180 किमी सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग राइजिंग मेन - 50 मीटर एस0टी0पी0 (108 एम.एल.डी.) - 1 नग विविध कार्य - जाब	ग्राम ख्वाजापुर में वर्ष 2040 के लिए 108 एम. एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए 54 एम.एल.डी.)	विरचन अन्तर्गत
3.1	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III (पार्ट - I)	गोमती नदी के पार सीतापुर रोड, त्रिवेणी नगर एवं कुकरैल नाले के दाई ओर के क्षेत्र	709558	1130121	1765143	87	138	216	276.03	308.80	3890.16	1563.80	4351.96	1749.41	ट्रंक/ ब्रान्च सीवर 150मिमी से 2600 मिमी - लगभग 485 किमी राइजिंगमेन 800 मिमी - 3000 मी. सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 1 नग एस.टी.पी. - नही विविध कार्य - जाब	ग्राम भरवारा के निकट गोमती कार्य योजना में प्रस्तावित 345 एम.एल.डी. के एस.टी.पी. पर्याप्त है	विरचित कर दि. 25.8.08 को भारत सरकार को प्रेषित

ANNEXURE - II

372

क्र.सं.	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट	आच्छादित क्षेत्र	परिकल्पित जनसंख्या			उत्पन्न होने वाला दूषित जल (मिलियन लीटर प्रतिदिन)			अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)		प्रति व्यक्ति लागत (सी. डी.पी. के अनुसार रु. में)		प्रति व्यक्ति लागत (डी. पी.आर. के अनुसार रु में)		प्रस्तावित मुख्य कार्य	एस.टी.पी. की प्रस्तावित क्षमता एवं स्थान	अद्यतन स्थिति
			2010	2025	2040	2010	2025	2040	सी.डी.पी. के अनुसार	डी.पी.आर के अनुसार	2010	2040	2010	2040			
3.2	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III (पार्ट-II)	गोमती नदी के पार, कुकरैल नाले के बाई तरफ इन्दिरा नगर, चिनहट एवं गोमती नगर के क्षेत्र	465860	716805	1059143	57	88	130	165.03	244.03	3542.48	1558.15	5238.27	2304.03	ट्रंक/ ब्रान्च सीवर 150मिमी से 1600 मिमी - लगभग 350 किमी राइजिंगमेन - 3375 मी. सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 3 नग एस.टी.पी. - नही विविध कार्य - जाब	ग्राम भरवारा के निकट गोमती कार्य योजना में प्रस्तावित 345 एम.एल.डी के एस.टी.पी. पर्याप्त है	विरचित कर दि. 25.8.08 को भारत सरकार को प्रेषित
4	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-IV	शहर का मुख्य क्षेत्र, हजरतगंज, अमीनाबाद, राजाजीपुरम् आदि	1114272	1505315	2148145	136	184	263	955.08	--	8571.34	4446.07			ट्रंक/ ब्रान्च सीवर - लगभग 4030 किमी सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 2 नग एस0टी0पी0 (270 एम.एल.डी.) - 1 नग विविध कार्य - जाब	ग्राम मस्तेमऊ में वर्ष 2040 के लिए 270 एम. एल.डी. (वर्ष 2025 के लिए 180 एम.एल.डी.)	विरचन अन्तर्गत
TOTAL			**2803000**	**4243000**	**6422000**	**344**	**519**	**787**	**2115.67**		**7547.88**	**3294.41**				**787 MLD**	

सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-। की डी.पी.आर. अनुमानित लागत रु. 277.57 करोड़ दिनांक 17.08.2007 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में रु. 236.23 करोड़ के लिए पारित हो चुकी है। इसका क्षेत्र गऊघाट पेयजल इनटेक के पास का है तथा इसके क्रियान्वयन से गोमती नदी की जल गुणता पर पर्याप्त सुधार आयेगा, जिससे पेयजल हेतु लिये जा रहे कच्चे जल की गुणता में भी सुधार आयेगा। अक्टूबर 2008 तक लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट की योजना पर नगर निगम से रु. 43.037 करोड़ जल निगम को प्राप्त हो चुके हैं।

(10)

~~1332~~ 374

1423

Annexure no 3

23/10/2007 14:57 FAX 23061081 NURM DIR 001

Most Immediate

F.No.59(2)/PF-I/2007- 157
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Plan Finance-I Division

New Delhi, the 3rd October 2007

To
The Pay & Accounts Officer,
Department of Expenditure,
Ministry of Finance,
New Delhi.

Subject: 'On' account payment of Grant component of Additional Central Assistance (ACA) for the ' Sub-Mission On Urban Infrastructure and Governance under JNNURM for the States Annual Plan 2007-08 - (Central Share).

The undersigned is directed to convey the sanction of the President of India to the payment of Rs 3392.55lakh (Rupees Thirty Three Crore Ninety Two Lakh Fifty Five Thousand Only) to the State Governments being the Grant Component for Urban Infrastructure and Governance under JNNURM for States' Annual Plan 2007-08 as under -

(Rs. In lakh)

S No	State/ City	Project	Total Approved cost	Total Central Assistance admissible	1st installment
1	Andhra Pradesh Hyderabad	Rehabilitation and Strengthening of Sewerage system in Old City area on south of Musi (Zone-II), Hyderabad	25125.00	8793.75	439.68
2.	Uttar Pradesh Lucknow	Sewerage Works for city of Lucknow, Sewerage District-1	23623.00	11811.50	2952.87
		Total			3392.55

2. Payment may kindly be made to the State Govt. immediately. The State Govt. should pass on the Central funds along with their matching share to the implementing agencies immediately.

3 The payments are adjustable in the account of the Central Government in the books under the sub-head indicated as under:-

GRANT
DEMAND NO. 35
3601-GRANTS-IN-AID TO STATE GOVERNMENTS.
02-GRANTS FOR STATE PLAN SCHEMES.
02.101-BLOCK GRANTS
36 Jawaher Lal Nehru Urban Renewal Mission
36.01- Sub-Mission on Urban Infrastructure and Governance
36.01.31-GRANTS-IN-AID.

(11)

~~333~~ 375

1424

11

4. The progressive totals of central assistance released to the State Governments under the Sub heads at para 3 above in the current financial year 2007-2008 so far including amounts released in this sanction letter as follows:-

(Rs. in lakh)

S.No.	STATES	BLOCK GRANT
1	Andhra Pradesh	103291.15
2	Uttar Pradesh	127476.86

5. The action taken on this order may be acknowledged and correctness of the progressive totals indicated.

Yours faithfully,

(Babni Lal)
Director
Ph. 2309 4908

Copy to:

1. Fin. Secy./Plng. Secy., Govt. concerned.
2. Accountant General (A&E), State concerned.
3. DEA, Budget Div. (States), New Delhi.
4. Plan. Comm.: SP Divn./FR Divn. New Delhi.
5. Secy., RBI, Central Office, Mumbai.
6. Manager, RBI, CAS, Nagpur,
7. Resident Commissioners, State concerned, New Delhi.
8. Chief Controller of Accounts, Min. of Finance, North Block (3 Copies).
9. Sh. S.Kanakambaran, US, M/O Urban Development, Nirman Bhavan, New Delhi.
10. Sh. N.Venugopalan, Deputy Secretary M/O Urban Development, Nirman Bhavan. New Delhi.

(Babni Lal)
Director
Ph. 2309 4908

संलग्नक - 3

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दि. 20.8.2007 तक प्रगति	20.8.2007 से 27.3.2008 की प्रगति	दि. 27.3.2008 से 21 7.20008 तक प्रगति	दि. 21.7.2008 से दि. 15.10.08 तक प्रगति	दि. 15.10.2008 तक कुल प्रगति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(अ)	भौतिक प्रगति							
1	ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज	289 कि.मी.	--	4 कि.मी. निविदा प्रक्रिया	16 कि.मी.	18.50 कि.मी.	38.50 कि.मी.	माह जुलाई-08 से वर्षा के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित।
2	ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.)	48 कि.मी.	--	निविदा प्रक्रिया	3.00 कि.मी.	8.50 कि.मी.	11.50 कि.मी.	"
3	सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.)	1 नग	--	"	10%	--	10%	"
4	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.)	1 नग	--	"	10%	--	10%	"
5	राइजिंग मेन - 1000 एम.एम.	45 मीटर	--	"	--	--	--	"
(ब)	वित्तीय प्रगति							
	वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड)	263.04						
1.	वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़)		--	6.444	11.396	23.556	37.587	
2.	प्राप्त धन (रु. करोड़)		--	15.000	15.000	13.037	43.037	

नोट :
1. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 की योजना दिनांक 17.8.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रु. 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को एवं रु. 15.00 करोड़ की द्वितीय किश्त दिनांक 20.4.2008 को निर्गत की गयी। माह सितम्बर 2008 में रु. 13.037 करोड़ की तृतीय किश्त निर्गत की गयी।
3. लगभग 180 कि.मी. सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम.एल.डी. के कार्य दिनांक 19.5.2008 से प्रारम्भ/ 18 माह की कार्य अवधि।
5. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दिनांक 1.6.2008 से प्रारम्भ किया गया।
6. अति वर्षा के कारण सीवर लाइन, एस.टी.पी. तथा सीवेज पम्पिंग स्टेशन की प्रगति प्रभावित हुई है।
7. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।।। पार्ट-। (अनु.लागत रु. 362.86 करोड़) एवं पार्ट-।। (अनु.लागत रु. 286.40 करोड़) की योजना दिनांक 22.8.2008 को वित्त समिति उ. प्र. शासन द्वारा पारित की गयी तथा दिनांक 25.8.2008 को स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया।
8. सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-।। एवं IV का सर्वेक्षण एवं योजना विरचन का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई (प्रथम/अस्थाई)
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

ANNEXURE - IV

1425

376

(13) 1426 377

ANNEXURE V

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० Ref. No. Uo3875/66/गोमती प्रदूषित/07-08 दिनांक Date 22-2-08

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई (प्रथम)
उ0प्र0 जल निगम, सूरज कुण्ड के पास,
रिवर बैंक कालोनी,
लखनऊ 226020

विषयः- **विश्लेषण आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 173/कार्य-57/3 दिनांक 31.01.2008 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करे। उक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रेषित जल नमूनों की विश्लेषण आख्या संलग्न कर उपलब्ध करायी जा रही है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 डी.सी. गुप्ता)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

Sri G.S. Srivastava P.C

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ -226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

(14) 1427 ~~1556~~ 378

Ph: 0522-2720828
Fax: 0522-2720764

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
PICUP BHAWAN, 4th FLOOR, VIBHUTI KHAND,
GOMTI NAGAR, LCUKNOW

ANALYSIS REPORT

Sample collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lko
Date of Sample collection	31.01.2008
Date of camplition of Analysis	07.02.2008
Name & Address	Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow
Sampling Point	Inlet of STP

Physical parameters

1. Total Suspended Solids	184.0 mg/L

Chemical Parameter

1. BOD (3 days at 27°C)	145.0 mg/L

Vinay Dubey, Reader — S.A.
Usha Kiran — A.S.O
S.O.
D.G.M. — C.E.O

(15) 1428 379

Ph: 0522-2720828
Fax: 0522-2720764

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
PICUP BHAWAN, 4th FLOOR, VIBHUTI KHAND,
GOMTI NAGAR, LCUKNOW

ANALYSIS REPORT

Sample collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lko
Date of Sample collection	31.01.2008
Date of camplition of Analysis	07.02.2008
Name & Address	Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow
Sampling Point	Outlet of STP

Physical parameters

1. Total Suspended Solids	42.0 mg/L

Chemical Parameter

1. BOD (3 days at 27°C)	26.0 mg/L

S.A. A.S.O S.O. C.E.O

16 1429 ~~1550~~ 380

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Paid

पत्र सं० Ref. No. [illegible] दिनांक Date 25.3.08

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई(प्रथम)
उ०प्र०जल निगम, सूरजकुण्ड के पास,
रिवर बैंक कालोनी
लखनऊ।

वि० विश्लेषण आख्या प्रेषित किया जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक ४७०/कार्य-५७/२६ दिनांक १८-३-०८ का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में आपके द्वारा प्रेषित जल नमूनों की विश्लेषण आख्या संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा०डी०सी०गुप्ता)
मुख्य पर्या० अधिकारी

प भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
ती नगर, लखनऊ -226 010
ाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
स : 0522-2720764
ेल : info@uppcb.com
साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

(17)

~~1339~~ 381

1430

Ph. 0522-2720828
Fax 0522-2720764

Central Laboratory
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Picup Bhawan 4th Floor, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample Collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-U.P. Jal Nigam, Lucknow
Date of Sample Collection	18 03 2008
Date of Completion of Analysis	25 03 2008
Name & Address	Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow
Sampling Point	Inlet of STP

Parameter	Value
Total Suspended Solids	160.0 mg/L
Bod (3days at 27°C)	218.0 mg/L

SA ASO SO CEO

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, Allahabad

10 1431 382

Ph: 0522-2720828
Fax 0522-2720764

Central Laboratory
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Picup Bhawan 4th Floor, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample Collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I U P. Jal Nigam, Lucknow
Date of Sample Collection	19 03 2008
Date of Completion of Analysis	25 03 2008
Name & Address	Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow
Sampling Point	Outlet of STP

Parameter	Value
1. Total Suspended Solids	48.0 mg/L
2. BOD (3days at 27 °C)	26.0 mg/L

CEO

COMMISSIONER FOR OATHS

(19) 1432 383

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं/Ref. No. UPPCB/66/गोमती प्रदूषण नि.प्र.इकाई/04-08 दिनांक/Date 06-5-08

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई–प्रथम,
उ.प्र. जल निगम, सूरज कुंड के पास
रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ–226020

विषयः– **विश्लेषण आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनॉक 21.4.2008 को एकत्रित एस टी पी के जल नमूनों की विश्लेषण आख्या संलग्न कर प्रेषित की रही है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा. डी.सी. गुप्ता)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

(20) 1433 ~~1342~~ 384

Ph: 0522-2720828
Fax: 0522-2720764

Central Laboratory
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Picup Bhawan 4th Floor, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample Collected by	Sri R.N. Yadav, A.P.E. Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I U.P. Jal Nigam, Lucknow Sri Vinay Dubey, S.A, U.P. Pollution Control Board, Picup Bhawan Gomti Nagar, Lucknow
Date of Sample Collection	21-04-2008
Date of Completion of Analysis	29-04-2008
Name & Address	Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow
Sampling Point	Inlet of STP

Parameter	**Value**
1. Total Suspended Solids	182.0 mg/L
2. BOD (3days at 27 °C)	120.0 mg/L

SA ASO SO CEO

COMMISSIONER

(21) 1434 ~~1343~~ 385

Ph: 0522-2720828
Fax: 0522-2720764

Central Laboratory
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Picup Bhawan 4th Floor, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample Collected by	Sri R.N. Yadav, A.P.E. Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I U.P. Jal Nigam, Lucknow Sri Vinay Dubey, S.A, U.P. Pollution Control Board, Picup Bhawan Gomti Nagar, Lucknow
Date of Sample Collection	21-04-2008
Date of Completion of Analysis	29-04-2008
Name & Address	Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow
Sampling Point	Outlet of STP

Parameter	**Value**
1. Total Suspended Solids	52.0 mg/L
2. BOD (3days at 27 °C)	26.0 mg/L

SA ASO SO CEO

(22) 1435 ~~B219~~ 386

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० 404384
Ref. No. /66/ गो.नि.प्र. परि.प्र. मण्डल/04-08 दिनांक 26-5-08
Date

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई-प्रथम
उ०प्र० जल निगम, सूरज कुंड के पास
रिवर बैंक कालोनी,
लखनऊ-२२६०२०

विषय- विश्लेषण आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक ८-५-२००८ को एकत्रित एस टी पी के जल नमूनों की विश्लेषण आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा०डी०सी०गुप्ता)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ -226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

(23) 1436 B45 387

Ph: 0522-2720828
Fax: 0522-2720764

Central Laboratory
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Picup Bhawan 4th Floor, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample Collected by	:	Sri T.P. Shukla, SA & Sri Rajendera Chaubey, LA U.P. Pollution Control Board, Picup Bhawan Gomti Nagar, Lko Sri R.N. Yadav, APE Project Manager, Gomti Pollution Unit-I UP Jal Nigam, Lucknow
Date of Sample Collection		09-05-2008
Date of Completion of Analysis		19-05-2008
Name & Address		Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow
Sampling Point		Inlet of STP

Parameter	Value
1. Total Suspended Solids	194.0 mg/L
2. BOD (3days at 27 °C)	135.0 mg/L

SA ASO SO CEO

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

(24) 1437 ~~1340~~ 388

Ph: 0522-2720828
Fax: 0522-2720764

Central Laboratory
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Picup Bhawan 4th Floor, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample Collected by	:	Sri T.P. Shukla, SA & Sri Rajendera Chaubey, LA U.P. Pollution Control Board, Picup Bhawan Gomti Nagar, Lko Sri R.N. Yadav, APE Project Manager, Gomti Pollution Unit-I UP Jal Nigam, Lucknow
Date of Sample Collection		08-05-2008
Date of Completion of Analysis		19-05-2008
Name & Address		Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow
Sampling Point		Outlet of STP

Parameter	Value
1. Total Suspended Solids	48.0 mg/L
2. BOD (3days at 27 °C)	25.0 mg/L

Uroj Dubey
SA

ASO

SO

CEO

COMMISSIONER FOR OATHS

(25) 1438 389

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक सं० Ref. No. C.O.4855/66/25 गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई/07-08 दिनांक Date 31-7-08

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई–प्रथम,
उ.प्र. जल निगम, सूरज कुंड के पास
रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ–226020

विषयः– **विश्लेषण आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनॉक 24.7.2008 को एकत्रित एस टी पी के जल नमूने की विश्लेषण आख्या संलग्न कर प्रेषित की रही है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा. डी.सी. गुप्ता)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
नगर, लखनऊ - 226 010
: 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
: 0522-2720764
: info@uppcb.com
साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

(26) 1439 390

Ph: 0522-2720828
Fax: 0522-2720764

Central Laboratory
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Picup Bhawan 4th Floor, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample Collected by	:	Sri T.P. Shukla, SA U.P. Pollution Control Board, Picup Bhawan Gomti Nagar, Lko Sri Asok Dubey, Site Supervisor STP, Daulatganj, Lucknow
Date of Sample Collection		24-07-2008
Date of Completion of Analysis		31-07-2008
Name & Address		Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow
Sampling Point		inlet of STP

Parameter	Value
1. Total Suspended Solids	122.0 mg/L
2. BOD (3days at 27 °C)	74.0 mg/L

SA

Usha Kiran
ASO

CEO

COMMISSIONER FOR OATHS
1010

(27) 1440 ~~1349~~ 391

Ph: 0522-2720828
Fax: 0522-2720764

Central Laboratory
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Picup Bhawan 4th Floor, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample Collected by	:	Sri T.P. Shukla, SA U.P. Pollution Control Board, Picup Bhawan Gomti Nagar, Lko Sri Ahsok Dubey, Site Supervisor STP, Daulatganj, Lucknow
Date of Sample Collection		24-07-2008
Date of Completion of Analysis		31-07-2008
Name & Address		Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow.
Sampling Point		Outlet of STP

Parameter	**Value**
1. Total Suspended Solids	34.0 mg/L
BOD (3days at 27 °C)	20.0 mg/L

SA

Usha Kiran
ASO

CEO

(28) 1441 ~~350~~ 392

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

G0050 46

संदर्भ सं० Ref. No. 166 / गोमती पदूनि परि/2008

दिनांक Date 29-8-08

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई (प्रथम)
उ0प्र0 जल निगम, सूरज कुण्ड के पास,
रिवर बैंक कालोनी,
लखनऊ 226020

विषयः- **विश्लेषण आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 1733/कार्य 57/3 दिनांक 31.01.2008 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 21.08.2008 को एकत्रित एस टी पी के जल नमूनों की विश्लेषण आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 डी.सी. गुप्ता)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

29

393

Ph: 0522-2720828
Fax: 0522-2720764

~~1351~~
1442

Central Laboratory
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Picup Bhawan 4th Floor, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample Collected by	:	Sri T.P. Shukla, SA U.P. Pollution Control Board, Picup Bhawan Gomti Nagar, Lko Sri Ahsok Dubey, Site Supervisor STP, Daulatganj, Lucknow
Date of Sample Collection		21-08-2008
Date of Completion of Analysis		29-08-2008
Name & Address		Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow
Sampling Point		Inlet of STP

Parameter	**Value**
1. Total Suspended Solids	124.0 mg/L
2. BOD (3 days at 27 °C)	94.0 mg/L

SA

ASO

CEO

(30) 394

1443

Ph: 0522-2720828
Fax: 0522-2720764

Central Laboratory
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Picup Bhawan 4th Floor, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample Collected by	:	Sri T.P. Shukla, SA U.P. Pollution Control Board, Picup Bhawan Gomti Nagar, Lko Sri Ahsok Dubey, Site Supervisor STP, Daulatganj, Lucknow
Date of Sample Collection		21-08-2008
Date of Completion of Analysis		29-08-2008
Name & Address		Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow
Sampling Point		Outlet of STP

Parameter	**Value**
1. Total Suspended Solids	37.0 mg/L
2. BOD (3days at 27 °C)	22.0 mg/L

SA ASO CEO

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

सलग्नक - 1

कार्यालय महाप्रबन्धक गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, ल[illegible]ऊ

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दि. 20.8.2007 तक प्रगति	20.8.2007 से 27.3.2008 की प्रगति	दि. 27.3.2008 से 21 7.20008 तक प्रगति	दि. 21.7.2008 से दि. 15.10.08 तक प्रगति	दि. 15.10.2008 तक कुल प्रगति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(अ)	भौतिक प्रगति							
1.	आई. एण्ड डी. कार्य - 6 नग	6 नग	5 नग	--	--	--	--	
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 5 नग	6 नग	5 नग	1 नग (10%)	1 नग (15%)	1 नग (5%)	5 नग पूर्ण, 1 नग (30%)	माह जुलाई-08 से वर्षा के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित।
3	राइजिंग मेन - 7525 मीटर	7525 मीटर	4780 मीटर	330 मीटर	10 मीटर	10 मीटर	5120 मीटर	〃
4	सीवर लाइन - 20 मीटर	20 मीटर	20 मीटर	--	--	--	पूर्ण	
5	स्टाफ क्वार्टर - 4 नग	4 नग	4 नग	--	--	--	पूर्ण	
6	जेनसेट - 8 नग	8 नग	8 नग	--	--	--	पूर्ण	
7	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग	1 नग	1 नग	--	--	--	पूर्ण	
8	भूमि अधिग्रहण - जाब	1 नग	1 नग	--	--	--	पूर्ण	
9	पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग	25 नग	25 नग	--	--	--	पूर्ण	
10	विद्युत संयोजन - 6 नग	6 नग	5 नग	--	--	--	पूर्ण	
11	विविध कार्य - जाब	100%	50%	20%	20%	2%	42%	〃
(ब)	वित्तीय प्रगति							
1.	वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड)	44.75						
1.	वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़)		33.177	0.715	0.861	1.803	36.556	
2.	प्राप्त धन (रु. करोड़)		33.850	–	–	–	33.850	

नोट : कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण स्थल सेना के साथ विवादग्रस्त था। दिनांक 31.10.2008 को नगर निगम द्वारा दूसरा निर्माण स्थल उपलब्ध कराया गया जिस पर कार्य प्रारम्भ किया गया। पुनः दिनांक 4.2.2008 को सिचाई विभाग द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया। उ.प्र. सिचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.4.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी। जुलाई के अन्तिम सप्ताह से कार्य गोमती नदी में बाढ़ के कारण बाधित हुआ जिसके कारण पम्पिंग स्टेशन की प्रगति धीमी थी।

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

ANNEXURE-VI

संलग्नक - 2

कार्यालय महाप्रबन्धक गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दि. 20.8.2007 तक प्रगति	20.8.2007 से 27.3.2008 की प्रगति	दि. 27.3.2008 से 21.7.20008 तक प्रगति	दि. 21.7.2008 से दि. 15.10.08 तक प्रगति	दि. 15.10.2008 तक कुल प्रगति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(अ)	भौतिक प्रगति							
1	आई. एण्ड डी. कार्य - 18 नग	18 नग	17 नग 80%	17 नग 5%	17 नग 10%	--	17 नग 95%	
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग	11 नग	10 नग 95%	1 नग 5%	1 नग 10%	1 नग 5%	1 नग 20%	
3	राइजिंग मेन - 18955 मीटर	18955 मीटर	8000 मीटर	41 मीटर	1 नग 25%	--	10 नग 95% 1 नग 30%	
4	सीवर लाइन - 6092 मीटर	6092 मीटर	3200 मीटर	110 मीटर	78 मीटर	15 मीटर	8134 मीटर	
5	स्टाफ क्वार्टर - 11 नग	11 नग	80%	--	90 मीटर	60 मीटर	3460 मीटर	
6	जेनसेट - 25 नग	25 नग	80%	--	--	--	80%	
7	मेन पम्पिंग स्टेशन - 1 नग	1 नग	10%	21%	20%	--	100%	
8	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग	3 नग	--	1 नग 3%	19%	20%	70%	
9	सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग	7 नग	6 नग	1 नग 50%	1 नग 3%	1 नग 4%	1 नग 10%	
10	नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग	5 नग	--	5 नग 55%	1 नग 40%	--	6 नग 100% 1 नग 90%	
11	शौचालय का निर्माण - 21 नग	21 नग	--	6 नग	5 नग 40%	--	1 नग 90%	
12	वनीकरण - जाब	20%	--	--	--	--	6 नग	
13	जनजागरण - जाब	20%	--	--	5%	--	5%	
14	भूमि अधिग्रहण - जाब	100%	10%	--	5%	--	5%	
15	पम्पिंग प्लान्ट - जाब	58 नग	90%	--	90%	--	100%	
16	विद्युत संयोजन - जाब	100%	60%	5%	5%	--	95%	
17	विविध कार्य - जाब	100%	20%	5%	10%	5%	40%	
(ब)	वित्तीय प्रगति							
1.	वित्तीय प्रगति (स्वीकृत परिव्यय) (रु.करोड़)	263.04	42.847	8.596	43.041	13.948	108.432	
2.	वित्तीय प्रगति (व्यय) (रु. करोड़)		49.239	0.99	42.539	15.665	108.433	
	प्राप्त धन (रु. करोड़)							

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई-1 / इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

महाप्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

ANNEXURE VII

32

1445 396

(33)

1446 397

Annexure-VI

दिनांक 13.10.2008 तक की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ शहर के विभिन्न पेयजल योजनाओं के विरूद्ध प्रस्तावित 21 नलकूप का विवरण

लक्ष्य - 21नग नये नलकूप

उपलब्धि - 3 नग नलकूप

क्र सं.	नलकूपों का नाम स्राव लीटर प्रति मिनट	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जलापूर्ति प्रारम्भ करने की तिथि	जल वृद्धि एम.एल. डी. में	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			संम्भावित	वास्तविक				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	लियटी कालोनी कुमान्चल नगर पेय जल योजना -: 2 नग , जोन-3							
	कुमांचल नगर(मानसरोवर)नलकूप-1 1000 ली.प्र.मि.	10.2.08		8.5.08	18.5.08	1.00		
	2.कुमान्चल नगर(लियटी कालोनी) नलकूप-2	17.3.08		22.6.08	17.7.08	1.00		
2	.विनगर पेयजल योजना :- 4 नलकूप जोन-3							
	3. नलकूप सं.- 1000 ली.प्र.मि.	10.11.07		8.5.08	28.5.08	1.00		
	4. नलकूप संख्या -2(कुम्हार टोला)	30.5.08		10.8.08			पम्प सेट चालू	राइजिंग मेन जोड़ा जाना है।
	5.							
	6.							
3	भारतनगर पेय जल योजना :- 3 नलकूप , जोन-3							
	7. सत्यलोक का ानी	15.3.08		20.5.08		-	पम्प सेट चालू	तदैव
	8. महाराजा अग्रसेन पार्क	30.4.08		21.6.08		-	तदैव	तदैव
	9. भगत सिंह पार्क	28.4.08		21.6.08			तदैव	तदैव
4	गढीकनौरा पुनगर्ठन पेयजल योजना :- 6 नलकूप , जोन-2							
	10. पी.टी.सी. , मिल के पास,	30.4.08	30.11.8				ओ.पी.यूनिट में प्रगति पर	
	11. नलकूप संख्या-2, तालकटोरा	21.5.08	30.11.8				लोअरिंग पूर्ण	
	12. करेरुटा नगर निगम स्टोर	3.8.08	30.11.8				तदैव	
	13. रेलवे लाइन के पास	1.9.08	30.11.8				तदैव	
	14.							
5	्यरिका वार्ड पेयजल योजना :- 6 नलकूप , जोन-4							
	16. नलकूप संख्या-1(लौगा खेड़ा)	3.5.08	30.11.8				लोअरिंग पूर्ण	
	17. नलकूप संख्या-2(झंडे वाला पार्क)	13.5.08	30.11.8				तदैव	
	18. नलकूप संख्या 3(बलदेव विहार पार्क)	17.5.08	30.11.8				तदैव	
	19. नलकूप संख्या-3(गोप स्कूल के पीछे)	30.5.08	30.11.8				तदैव	
	20. चन्द विहार कालोनी पार्क	18.6.08	30.11.8		-		तदैव	
	21. डिफेन्स कालोनी	18.6.08	30.11.8				तदैव	

सार-:

1.	कूल प्रस्तावित नलकूपों की संख्या	- 21 नग
2.	चालू नलकूपों की संख्या	- 3 नग , जलावृद्धि - 3.00एम.एल.डी.
3.	निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या	- 14 नग
4.	नलकूपों की संख्या जिनके पम्प सेट चालू है राइजिंग मेन जोड़ा जाना है।	- 4 नग. संम्भावित जलावृद्धि - 4 एम.एल.डी.

परियोजना प्रबन्धक

(34) 1447 ~~1356~~ 398

Annexure - IX

दिनांक 13.10.2008 तक की प्रगति

स जे.एन.एन.यू.आर.एम के अन्तर्गत 43 नग री-बोर नलकूपों का निर्माण कार्य-:
लक्ष्य- 43 री-बोर नलकूपों को चालू करने की सम्भावित तिथि 31.12.08
उपलब्धि - 25 नग

क्र स.	नलकूपों के नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (राइजिंग मेन पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जल वृद्धि एम.एल.डी. में	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			वास्तविक	सम्भावित			
1	2	3	4	5	6	7	
1	डायमंड डेरी, जोन-1	1.3.08	29.4.08		1.00	जलापूर्ति प्रारम्भ	
2	म्हानगर सेक्टर-डी, जोन-3	6.4.08	1.5.08		1.00	तदैव	
3	[illegible]दीन, जोन-1	20.3.08	13.5.08		0.60	तदैव	
4	[illegible]भवन, जोन-1	17.4.08	30.5.08		1.00	तदैव	
5	[illegible] पार्क निराला [illegible] जोन-3	10.5.08	3.6.08		1.00	तदैव	
6	[illegible] पुरम, ए-ब्लाक, [illegible]	28.5.08	23.6.08		1.00	तदैव	
7	[illegible] कालोनी नलकूप [illegible]-3	20.5.08	28.7.08		1.00	तदैव	
8	[illegible]समाज मंदिर गणेश गंज जोन-1	25.5.08	12.8.08		1.00	तदैव	
9	[illegible] पुरम गोमतीनगर जोन-5	5.5.08	13.8.08		1.00	तदैव	
10	कपूरथला, नलकूप जोन-3	28.6.08	24.8.08		1.00	तदैव	
11	लालबाग ,जोन-1	30.6.08	26.8.08		1.00	तदैव	
12	कानपुर रोड योजना से.-जे जोन-4	10.4.08	23.6.08		1.00	तदैव	
13	[illegible]नगर , जोन-3	1.6.08	30.8.08		1.00	तदैव	
14	[illegible]डेरी, जोन-1	1.6.08	31.8.08		1.00	तदैव	
15	[illegible]गंज, जोन-3	24.5.08	31.8.08		1.00	तदैव	
16	[illegible] खाँ, जान-1	22.7.08	30.8.08		1.00	तदैव	
17	[illegible]नेश्वर मंदिर, जोन-3	6.6.08	4.9.08		1.00	तदैव	
18	[illegible]गंज से.-6 जोन-3	6.6.08	10.9.08		1.00	तदैव	
19	[illegible]धीनगर जोन-1	17.6.08	15.9.08		1.00	तदैव	
20	आनन्द नगर, [illegible]न-4	28.5.08	15.9.08		1.00	तदैव	
21	[illegible]टर एच एल डी [illegible]लोनी कानपुर रोड	1.8.08	18.9.08		1.00	तदैव	
22	[illegible]मर विहार, जोन-4	28.5.08	3.10.08		1.00	तदैव	
23	[illegible]न्दी पार्क, जोन-3	21.6.08	30.9.08		1.00	तदैव	
24	[illegible], खण्ड,जोन-5	3.7.08	5.10.8		1.00	तदैव	
25	[illegible]गंज से.-7 जोन-3	10.6.08	10.10.8		1.00	तदैव	
26	[illegible] स्कीकर, जोन-1	15.6.08		30.10.08		तदैव	
27	शिव कालोनी, जोन-3	6.6.08		30.10.08		ओ.पी.यूनिट से विकास पूर्ण	
28	से.-11 राजाजीपुरम जोन-6	28.6.08		30.10.08		तदैव	
29	डालीगंज नलकूप, जोन-3	24.7.08		30.10.08		पूर्ण	
30	कृष्णा नगर, जोन-4	20.7.08		30.10.08		ओ.पी. से विकास पूर्ण	
31	चन्दर नगर, जोन-4	20.8.08		30.10.08		तदैव	
32	इंदिरानगर स.-54 जोन-5	3.5.08		30.10.08		कम्प्रेसर से विकास पूर्ण	
33	आजाद नगर, जोन-4	26.7.08		30.10.08		तदैव	
34	इंदिरा नगर संख्या 53	10.8.08		30.10.08		तदैव	

(38) 1448 1357 399

क्र. सं.	नलकूपों का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (राइजिंग मेन पाम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जल वृद्धि एम.एल.डी. में	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			वास्तविक	सम्भावित			
1	2	3	4	5	6	7	
35	खुर्शीद बाग ,जोन-6	28.6.08		30.10.08		कम्प्रेसर से विकास प्रगति पर	
36	कर्बला तालकटोरा रोड, राजाजीपुरम जोन-6	23.6.08		30.10.08		लोअरिंग पूर्ण	
37	नेशनल रोड, जोन-6	11.6.08		30.10.08		तदैव	
38	[illegible] राजाजीपुरम जोन-6	25.7.08		30.10.08		तदैव	
39	भवानीगंज, जोन-6	26.7.08		30.10.08		तदैव	
40	फातिमा हस्पिटल नलकूप, जोन-3	20.8.08		30.10.08		तदैव	
41	डिफेन्स कार संख्या-14, जोन-5	30.8.08		30.10.08		तदैव	
42	विकास खण्ड-3 गोमती नगर 3, जोन-5	30.8.08		30.10.08		तदैव	
43	मलन्दी खेड़ा, जोन-4	5.10.08		30.10.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	

सार-:

1. कुल प्रस्तावित री-बोर नलकूपों की संख्या - 43 नग
2. चालू नलकूपों की संख्या - 25 नग , जलावृद्धि - 25.00एम.एल.डी.
3. निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या - 18 नग

परियोजना प्रबन्धक

पेयजल योजना

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 25.08.08 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

सामान्य कार्यक्रम

(रू0 लाख में)

क्रमांक	कार्य का विवरण	प्रस्तावित कार्य की मात्रा	दिनांक 25.08.08 तक कुल प्रगति		दिनांक 15.10.08 तक कुल प्रगति		दिनांक 26.08.08 से 15.10.08 तक कुल प्रगति	
1.	नये हैण्डपम्प	409 नग	409 नग	286.80	409 नग	286.80	-	-
2.	विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प	670 नग	670 नग		670 नग		-	
3.	नये नलकूप	5 नग	3 नग चालू तथा 1 नग प्रगति पर।	125.00	3 नग चालू तथा 1 नग प्रगति पर।	140.00	-	-
4.	रिबोर नलकूप	39 नग	39 नग चालू	690.00	39 नग चालू	690.00	-	-
	योग			1101.80		1116.80	-	-

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल(द्वितीय)

महाप्रबन्धक(पेयजल)

Annexure-X

(36) 1449 400

पेयजल योजना

(रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दि. 20.08.07 तक [illegible]	2 .07 से 27. 03.08 की प्रगति	दि. 27.03.08 से दि. 21.07.08 तक प्रगति	दि. 21.07.0 से दि. 15.10. 08 तक प्रगति	दि. 15.10.08 तक कुल प्रगति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम							
1.	नये नलकूप(समस्याग्रस्त क्षेत्रों मे)	40 नग	-	9 नग प्रगति में	22 नग चालू, 18 नग प्रगति पर।	6 नग चालू।	28 नग चालू, 12 नग प्रगति पर।	सूचे संलग्न
	नये नलकूप(विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत)	21 नग	-	4 नग प्रगति में	3 नग चालू, 12 नग प्रगति पर।	2 नग पर कार्य प्रारम्भ तथा प्रगति पर।	3 नग चालू, 14 नग प्रगति पर।	सूची संलग्न
2.	रिबोर नलकूप	43 नग	-	2 नग प्रगति में	7 नग चालू, 22 नग प्रगति पर।	18 नग चालू, नये 12 नगों पर कार्य प्रारम्भ तथा प्रगति पर।	25 नग चालू, 18 नग प्रगति पर।	
3.	वितरण प्रणाली	133.31 कि.मी.	-	-	17.00 कि.मी.	19.00 कि.मी.	36.00 कि.मी.	
4.	राइजिंग मेन	14.40 कि.मी.	-	-	22 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू, 18 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर।	9 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू तथा 8 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रारम्भ।	31 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू। 16 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर।	
	सामान्य कार्यक्रम							
1.	नये हैण्डपम्प	409 नग	53 नग	69 नग	287 नग	-	409 नग	
2.	विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्डपम्प	670 नग	153 नग	86 नग	431 नग	-	670 नग	
3.	नये नलकूप	5 नग	2 नग	1 नग प्रगति पर।	1 नग	1 नग पर कार्य प्रारम्भ	3 नग चालू तथा 1 नग प्रगति पर।	शेष 1 नग पर स्थल विवादित होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। सूची संलग्न
4.	रिबोर नलकूप	39 नग	17 नग	8 नग	14 नग	-	39 नग।	

परियोजना प्रबन्धक

महाप्रबन्धक(पेयजल)

(38) 145 ~~1360~~ 402

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, पेयजल(द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में चालू किये गये नलकूपों की सूची

40 नग नये नलकूपों के अन्तर्गत

क्र0 सं0	नलकूपों का नाम एवं स्थल
1	2
1	अलीगंज सेक्टर-एच
2	इन्दिरानगर डी-ब्लॉक
3	विजयखण्ड, गोमतीनगर
4	अलीगंज सेक्टर-डी
5	गुलिस्ता कॉलोनी
6	अहिबरनपुर सीतापुर रोड
7	त्रिवेणी नगर
8	विकासनगर सेक्टर-9
9	सहयोग पार्क, महानगर
	जानकीपुरम् सेक्टर-एच
11	हिन्द नगर नलकूप, जोन-4
12	तातारपुर सेक्टर-ई, अलीगंज
13	मेंहदीटोला, विष्णुपुरी कॉलोनी
14	शिवपुरी पार्क, गणेशगंज
15	कानपुर रोड योजना, सेक्टर-जे, रेलनगर
16	विनीत खण्ड, गोमती नगर
17	साउथ सिटी, सेक्टर-सी-1
18	दामोदरनगर, आलमबाग
19	इन्दिरानगर बी-ब्लॉक
20	मेवा नर्सरी; निशातगंज
21	पंचवटी कॉलोनी, रहीमनगर
22	साउथ सिटी, रश्मि खण्ड
23	विवेक खण्-4, गोमतीनगर
24	सेक्टर-आई, एल.डी.ए. कॉलोनी
25	अशोकनगर राजाजीपुरम्
26	सोसाइटी पार्क, नरही, जोन-1
27	ब्रहमनगर, जोन-4
2[illegible]	मातादीन शेरवाली कोठी, सआदतगंज, जोन-6

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत प्राक्कलन में सम्मिलित पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत

29	शिवनगर खदरा जलकल परिसर
30	मानस विहार कॉलोनी, सर्वोदयनगर
31	लिबर्टी पार्क, सर्वोदयनगर

नगरीय पेयजल योजना सामान्य के अन्तर्गत स्वीकृत नलकूप

32	विनयखण्ड, गोमतीनगर
33	फैजुल्लागंज
34	राजाजीपुरम बी-ब्लॉक, रानी लक्ष्मीबाई पार्क

परियोजना प्रबन्धक

Progress Report No. TWs (JNNURM) 15-10-08)

पेयजल योजना

वित्तीय प्रगति

(रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दि. 20.08.07 तक प्रगति	20.08.07 से 27.03.08 की प्रगति	दि. 27.03.08 से दि. 21.07.08 तक प्रगति	दि. 21.07.08 से दि. 15.10.08 तक प्रगति	दि. 15.10.08 तक कुल प्रगति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम							
	केन्द्रीय प्रगति	-	-		22.00	38.00	60.00	प्रथम किश्त रू0 20.00 करोड़ 27.03.08 को, द्वितीय किश्त रू0 20.00 करोड़ अप्रैल 2008 तथा तृतीय किश्त रू0 20.00 करोड़ अगस्त 2008 में प्राप्त हुई थी
	राज्य प्रगति	-	-	20.00	20.00	20.00	60.00	

परियोजना प्रबन्धक

Progress As On (15-10-08)

Annexure - XII

39

1452

403

STATUS AND REQUIREMENT OF WATER SUPPLY FOR LUCKNOW CITY

S.No.	Water Supply District	Location	Main Area included	Population			Requirement		Available at Present				Proposed to be enhanced in JNNURM by 2010		Availability of Ground Water beyond mid stage 2025	Total Proposed Availability		Deficit (Year 2040)	
									Water			Storage							
				2010	2025	2040	Water Demand in 2040	Storage	Surface	Ground Water	Total		Water	Storage		Water	Storage	Water	Storage
							(MLD)	(KL)	(MLD)	(MLD)	(MLD)	(KL)	(MLD)	(KL)	(MLD)	(MLD)	(KL)	(MLD)	(KL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13	14	15	16	17	18
1	A	Cis Gomti area between Gomti River and Line from Dilkusha to Hardoi.	Aminabad, Charbagh, Hazratganj, Vidhan Sabha, Butler Palace, Rajajipuram, Aisbhagh, Balaganj, Chowk, Medical College, Hardoi Road.	1159707	1495795	1879750	341.26	113752	183.86	71.13	254.99	77350	111.52	2550	15.00	310.38	79900	30.88	33852
2	B	Trans Gomti area on the left bank upto Kukrail Nala.	Aliganj, Khadra, Daliganj, Nishatganj, Jankipuram, Nirala Nagar. Sitapur Road, Universit, Road, Paper Mill.	696698	1111911	1745287	301.06	100354	20.00	73.72	93.72	31300	19.20	3100	70.00	109.20	34400	191.86	65964
3	C	Trans Gomti area on the left bank of Gomti River beyond Kukrail Nala.	Indira Nagar, Gomti Nagar, Sarvodaya Nagar, Sanjay Gandhi Puram & adjoining private colonies.	478910	737155	1085451	187.24	62413	0.00	66.98	66.98	34500	84.80	5350	55.00	139.80	39850	47.44	22563
4	D	Cis Gomti area beyond Dilkusha Hardoi N.R. Line.	Alambagh, Sringar Nagar, Kanpur Road, Raibareli Road, Airport, Sarojini Nagar, South City, Aashiana.	467685	898139	1711512	295.24	98412	0.00	42.04	42.04	14000	23.04	2200	42.04	65.08	16200	230.16	82212
			Total	2803000	4243000	6422000	1124.80	374931	203.86	253.87	457.73	157150	238.56	13200	182.04	624.46	170350	469.46	204581

Note : In Phase-II Scheme for ground water recharging and water conservation for District-A, B, C & D is also proposed to be submitted.

Annexure XIII

1453 1362 404

Proposed Work in Future under JNNURM Programme				
Phase-I, Part-I **Estimated Cost Rs. 456.62 Crore** **(Rs. 388.61 Crore without centage)**	**Phase-I, Part-II** **Estimated Cost Rs. 123.65 Crore** **(Rs. 105.23 Crore without Centage)**	**Phase-I, Part-III**	**Phase-I, Part-IV**	**Phase-II**
19	20	21	22	23
Renovation of 100 Year old Aishbagh Water Works, Strengthening of Feeder Mains, Replacement of Raw Water Rising Main Upgradation of II W/W Balaganj from 100 MLD to 200 MLD, Strengthening of Feeder Mains from Balaganj. Reorganisation of Garhi Kanaura W/S at the farthest end of Aishbagh W/W command area. T.Ws-12NOS (12mld)	Reorganisation of W/S Scheme in three areas namely Saadatganj, Kanhaiya Madhopur & Mallahi Tola. Tube wells - 2 Nos.	W/S Schemes having no piped arrangement. New Intake work for Balaganj Water Works. Renovation of existing C.W.R. & over head tanks. Automation of existing water supply system	Reorganisation of water supply system. Segregation of existing feeder mains in different water supply zones	
Reorganisation of Shiv Nagar Khadra W/S Scheme,New Water Supply Scheme for Bharat Nagar Area, Sitapu Road. Tube wells - 20 Nos.(20 mld)	W/S Scheme in Aadil Nagar area. Tube wells - 4 Nos.	Construction of Water Works at Ghaila New W/S Scheme having no piped water supply Automation of existing water supply system Renovation of existing over head tanks	Reorganisation of water supply system.	
Construction of III[rd] W/W at Gomti Nagar (80 mld Capacity) Liberty Colony Sarvodaya Nagar W/S Scheme Tube wells - 5 Nos.(5 mlc)	Six W/S Schemes of private colonies adjacent to Indira Nagar & Gomti Nagar to utilize the water produced by Third Water Works.	W/S Schemes for areas having no piped water Renovation of existing over head tanks. Automation of existing water supply system	Reorganisation of water supply system	
New Water Supply Scheme for Kharika Ward. Tube wells – 24 Nos.(24 mld)	W/S Scheme of Raja Bijli Pasi Ward & Reorganisation of Chitragupta Nagar Ward. Tube wells - 15 Nos.	W/S Schemes for areas having no piped water. Reboring of permanent defunct tube wells. Renovation of existing over head tanks. Automation of existing water supply system	Reorganisation of water supply system.	Construction of Fifth Water works at Mohaan road. Reorganisation of distribution system of remaining areas.
Present Status:				
DPR sanctioned by G.O.I. Works under progress. Rs. 40.00 Crores has been received by U.P. Jal Nigam till now out of total amount of Rs. 89.2464 Crore released as I[st] Installment. Balance amount of Rs. 49.2464 Crore is to be received by U.P.J.N. from Lucknow Nagar Nigam. Work affected due to lack of funds.	DPR prepared and sent to Nagar Nigam Lucknow in Feb-08 and yet to be sent to Govt. by Nagar Nigam, Lucknow.	Survery in progess. Permission for outsourcing is required.		
